

Datum

Denní záznamy stavby

14.6.22

ZÁPIS Z KONTROLY STAVBY

ÚČAST: ZC. M. KREJZER, ING. J. KOUBA, P. KOUBA, S.
STAV. KUŠELKA, K. ČRNA

1) V ROOČARNE DOBĚ PRODÍVANÍ PRÁCE NA ZJENÍ ČEL.
PRODUKTKU - KJEBD NA ČOV. DÁLE SE PROVÁDÍ SEPANÍ
PRÁCE A MONTÁŽ POTRUBÍ KŘEŽNÉ ČÁSTI PŘÍPRAV K JEJEDNOLÝM
ZUSOUČIM NĚJHATELUM (Čp. 23) A NA STOCE "A3".

2) OBJEDNATEL A TDS UPOTVRDÍJE ZADAVATELE NA PROVEDENÍ
PÁJNE (SEPARACE VÝKOPKU, VE. ULOŽENÍ NA NEZNAEPONII.
JEJNA SE HLAVNĚ O ABT. KRY.

3) TDS ZANÍSTÍ OZBATEH SLE POBAJAVUKU ZADAVATELE OPAVU
PRODUKTKU NA STOCE A3" FORMOU DOUBTÍ JEJEDNOVÝCH
PAMU U PROJEKTYANTH - NÁVRH ŘEŠENÍ.

4) OBJEDNATEL UPOTVRDÍJE ZADAVATELE NA DOŘEZENÍ TERHUNU
KONCENTRACI TRACI SLE DOJATKU O. 1. A PÁBA POSÍLENÍ
KAPACIT TAK, ABY ŽYL TERHIN DO 30.6.22 DOŘEZEN.

5) SLE INFORMACE OBJEDNATELE KUR ŽYT DOŘEZENY
TERHINY ZAVĚŘEČNE KONTROLNÍ PROVLISKY AKCE
A TO ČOV DO 31.7.22 (ROČNÍ ZKUSĚBNÍ PROUD),
KANALIZAČNÍ ŘADY DO 31.8.22. TO JSOU TERHINY
STANOVENÉ U ROZHODNUTÍ O PŘEKYTNUTÍ DOTACE.

6) DNE 10.6.22 ŽYLY ÚSPĚŠNĚ DOKONČENY KOMPLEXNÍ
ZKOUSKY ČOV - VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS.

7) OBJEDNATEL A TDS POBAJAVUKU PROVEDENÍ TERHINICH
VTRAV KOLEH ČÁSTICKY.

8) OBJEDNATEL A TDS OPĚTUNĚ POBAJAVUKU PŘEDLOŽENÍ
NÁVRHU KALKULACE SEPARACE A ROZTRÍDĚNÍ VÝKOPKU
NA REZIDENII A ZANÍSTENÍ DĚJERY ZKUSĚBNÍHO VÝKOPKU
K ROZHODRU PRO STANOVENÍ HODNOTY PAMU.

Podpis:  TDS

[ZDE ODTRHNĚTE](#) →


Datum	Denní záznamy stavby
18.6.2002	POČASI: JASNO
SOBOTA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: VHS 7, JARISTAV 4, ŠKRVÁN 3
	MECHANIZACE: 2x BAGR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- VÝKOP RÝHY, PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 16
	- ZÁSYV RÝHY STOKA "13" PROTAK, HUTNĚNÍ PO VYSTAVĚNÍ
	- VYHAZÁVÁNÍ ŠACHET ERGELITEN, ČISTĚNÍ
	- ČERPÁNÍ VODY
	Q
19.6.2002	POČASI: JASNO
NEDELE	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: VHS 2, JARISTAV 1
	MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO
	MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- ZÁSYV PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 16, HUTNĚNÍ PO VYSTAVĚNÍ
	- VÝKOP PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 73
	- VYHAZÁVÁNÍ ŠACHET ERGELITEN, ČISTĚNÍ
	- ČERPÁNÍ VODY
	Q
20.6.2002	POČASI:
PONĚLÍ	PRACOVNÍCI: VHS-TLŠ, VHS 8, JARISTAV 4, ŠKRVÁN 3
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: 2x BAGR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,
	MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STOCĚ "13" DN 800
	- VÝKOP, POKLÁDKA, PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 73
	SPĚTNÝ ZÁSYV ČÁST
	- BETONÁŘ VODOVODNÍCH POKLOPŮ DO NIVELETY
	STOKA "2"
	- VYHAZÁVÁNÍ ŠACHET ERGELITEN, ČISTĚNÍ
	- ČERPÁNÍ VODY
	Q
	97.1

www.oprys.cz

Datum	Denní záznamy stavby																								
21.6.2022	POČASI: JEDNO 14°C - 30°C PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODIN PRACOVNÍCI: VHS-THP, VHS-8, JARISTAV 4, ŽKRVAŇ 3 MECHANIZACE: 2x BAGER, 2x NÁKLADNÍ KUTO, TRAKTORBAGER, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - VÝKOP POKLÁDKA PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 13B, STOKA „A“ - ČERPÁNÍ VODY - VÝKOP POKLÁDKA PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 73, STOKA „A“ - VYHRAŽOVÁNÍ ZACHET EROZÍ, ČISTĚNÍ - ÚPRAVA PODKLADU PRO ŽIVICNÉ VRSTVY STOKA „B“ - VYŠEDENÍ NA VÝŠKU (Q)																								
23.6.2022	Zápis geotechnické služby Dne 21.6.2022 byly prováděny statické zatěžovací zkoušky sloupů v počtu 4ks. Výsledky jsou v emailu. Dnes byly prováděny zkoušky s těmito předchozími výsledky: <table><tr><td>stoka A 4</td><td>15m od SA 10 → SA 4</td><td>$E_{dga} = 140 MPa$</td><td>počet = 1,0</td></tr><tr><td>stoka A</td><td>5m od SA 11 → SA 12</td><td>$= 148 MPa$</td><td>= 1,8</td></tr><tr><td>stoka A 2</td><td>15m od SA 2-1 → SA 2-2</td><td>$= 156 MPa$</td><td>= 3,5</td></tr><tr><td>stoka A</td><td>14m od SA 16 → SA 15</td><td>$= 133 MPa$</td><td>= 2,4</td></tr><tr><td>stoka A 1</td><td>4m od SA 1-2 → SA 1-3</td><td>$= 144 MPa$</td><td>= 2,1</td></tr><tr><td>stoka A 1</td><td>6m od SA 1-5 → SA 1-4</td><td>$= 126 MPa$</td><td>= 2,5</td></tr></table> za Geotec GS a.s. ing. Němčanský Jan (Signature)	stoka A 4	15m od SA 10 → SA 4	$E_{dga} = 140 MPa$	počet = 1,0	stoka A	5m od SA 11 → SA 12	$= 148 MPa$	= 1,8	stoka A 2	15m od SA 2-1 → SA 2-2	$= 156 MPa$	= 3,5	stoka A	14m od SA 16 → SA 15	$= 133 MPa$	= 2,4	stoka A 1	4m od SA 1-2 → SA 1-3	$= 144 MPa$	= 2,1	stoka A 1	6m od SA 1-5 → SA 1-4	$= 126 MPa$	= 2,5
stoka A 4	15m od SA 10 → SA 4	$E_{dga} = 140 MPa$	počet = 1,0																						
stoka A	5m od SA 11 → SA 12	$= 148 MPa$	= 1,8																						
stoka A 2	15m od SA 2-1 → SA 2-2	$= 156 MPa$	= 3,5																						
stoka A	14m od SA 16 → SA 15	$= 133 MPa$	= 2,4																						
stoka A 1	4m od SA 1-2 → SA 1-3	$= 144 MPa$	= 2,1																						
stoka A 1	6m od SA 1-5 → SA 1-4	$= 126 MPa$	= 2,5																						

Datum	Denní záznamy stavby
23.6.2022	* ZÁPIS ZHOTOVITELŮ: - UPŘESŇUJEME OBJEDNATELŮ A TIS NA SEJBENEC, ŽE STAVEBNÍ DĚLÍK č. 9, SE ZHOTOVITELI VĚTLÍ AZ. 21.6.2022, PROTO MŮŽE ZHOTOVITEL DEAGOVAT NA ZÁPIS TDS V OBDOBÍ 21.6.-19.6.2022, AZ DŮS. K ZÁPISU TDS SD č. 9 ČÍSLO STRANY 0669159, ZÁPIS Z KD BOD 5 ODSTAVEC d). TĚTO ZÁPIS SE NEZAKLADÁ NA PRAVDE. 7.6. ZHOTOVITEL S OBJEDNATELEM PŘEVZAL ODPOVĚDNOST - PŘESVĚDČÍ ZPŮSOBU ZAPRAVENÍ NA STOKÁCH A1; A4; A a A3. BYLO DOPROUŠENO, ŽE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NOVOU CEN. NABÍDKU (ROZPOČET) NA ZAPRAVENÍ TK a ZPĚVNÝ ZAPRAVENÍ NA KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍCH (ZPĚVNÁ TL. PODKLADŮ A OBROVNĚ VSTUP) DĚLE UŽIJÍ PRAVDA, ŽE OBJEDNATEL DAL POKY K ODRAVĚ TK, VZ SMYSLU PŘEPRAVĚ STOKAČ 7 04/2022. OBJEDNATEL DAL POKY K ZAPRAVENÍ STOK B - NĚJŠÍ ČÁST DĚLE PŘEDLOŽENÉHO ROZSAHU. DĚLE DAL OBJEDNATEL POKY NA KD ŽE DŮS. 7.6.2022 K PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI STÁVAJÍCÍCH ROZSAHŮ - 4 CÍTKY NĚJŠÍ DĚLE NĚJŠÍCH KOMUNIKACÍCH. ZHOTOVITEL SĚHL, ŽE ZÁČAS PŘEVZATÍ PŘEVZETÍ, PO DOUHLESENÍ ROZPOČTU A ZL. TYKACÍ SE ZAPRAVENÍ KOMUNIKACÍ PO VSTAVBĚ SPLASKOVÉ KANALIZACE V OB. - ODPOVĚD ZHOTOVITELŮ K ZÁPISU TDS NE SD č. 9 STRANA 8. 0669159 ŽE DŮS. 8.6.2022. AD 1) TDS PŘEDLOŽIL DŮS. 15.6.2022 DOKUMENTACI ZPĚVNÝ PŘEVZETÍ SPLASKOVÉ KANALIZACE PŘES STÁVAJÍCÍ PŘEVZETÍ NA STOK A3 V ÚSEKU SA15-SAS3-1. ZHOTOVITEL OZVLÁŠŤ DOSTUPNOST (TERMIN) DODATĚ RÁTOVÉHO PŘEVZETÍ DĚLE ZPĚVNÝ. DŮS. 23.6.2022 ODVĚTL ZHOTOVITEL TDS, ŽE TERMIN DODATĚ NAUČENÉHO RÁTOVÉHO PŘEVZETÍ, MŮŽE BYT PŘEDBĚŽNĚ V 34 TĚLU. TDS BYL PŮŽADŮ O SOUČASNOST PŘI PŘEVZETÍ DĚLEHO PŘEVZETÍ. AD 2) ZHOTOVITEL TĚV NA SKUTEČNOSTI, ŽE MU VZDÍKA PŘEVZETÍ V PŘEVZETÍ DĚLA, NĚJŠÍ NĚJŠÍ PŘEVZETÍ ROZSAH ZAPRAVENÍ PŮŽADŮ OBJEDNATELŮ, DOKUD NĚJŠÍ VZDÍKŮ DOUHLESENÍ ROZPOČET, ŽE OBJEDNATEL NĚJŠÍ PŘEVZETÍ POKY K PŘEVZETÍ ZAPRAVENÍ NĚJŠÍCH KOMUNIKACÍ.

Datum	Denní záznamy stavby
23.6.82	- PORADOVÁNÍ V ZÁPISU ZHOTOVITELŮ. ODPOVĚD ZHOTOVITELŮ NA ZÁPIS IDS V SDČ.9 STRANAC. 0669591. AD3) ZHOTOVITEL TRVÁ NA ŽADOSTI K OBJEDNATELI O VYDÁNÍ POZNAMU JAK LIKVIDOVAT KONSTATOVANOU PŘEBÍTEČNOU ZEMINU VZNIKLOU Z VYSTAVBY SPÁSKOVÉ KANALIZACE V OBCI PŘEDSLAVI. ZAPISAL: BĚR KOŽELKA
24.6.82	UVNÁŠŘENÍ OBJEDNATELE A IDS K ZÁPISU ZHOTOVITELŮ ZE DNE 23.6.82 MUSÍME POKUŠET KONSTATOVAT, ŽE SKUTEČNOSTI - JAK JE POPISOVÁNA ZHOTOVITELŮM NENÍ NA MÍSTĚ A STOVÍME SI ZA SKUTEČNOSTI BRVE POPISOVANOU. POUČÍME TUDY S TÍH, ŽE NEBYLA VYKONČANÁ CENA VIOEPRACI NA ÚPRAVĚ KONTAMINACI. - CO SE TÝČE PROJEKTU, OBJEDNATEL PŘEDPOKLÁDÁ ŽE ZHOTOVITEL JE ODBORNÁ FIRMA A PRAUD BUDĚ VÁHEM VYKOPÁVACÍ PRACÍ K VEHOLICI SOUVISLEJÍCH ZAPŘÍMENÍ, JEJÍNA NÁPRÁVU NA OPRÁVU SO PŘÍPODNÍHO STAVU. TAK TOMU BYLO SOPOČAD A VĚŠY JPLA POSKYTNUTÁ POUČINNOST OBJEDNATELE I IDS. A PROJEKTU O.2, TOMU TAK BYLO, AŽ SOBY, KSY TÁS ZAČINÁ PRÁCE NA JEHO OPRÁVĚ, NEBOY NEBYLA PROVAŽENÁ VIBORNE A NEBYLY PŘEDLOŽENY JOKLADY - PO POSLE KTERÉ SE OPRÁVA PROVAŽELA. TEN MOMENT NAVEŠKOU MEL ZHOTOVITEL PŘEHAŽKU NA STRANĚ OBJEDNATELE A TO BYLO PO SVU HEČICIA TO ROZBOUŽENÍ ČASTI PROJEKTU. - KOLEM VYKOPKU BYLO TOHO ŘECENO HNOD A OBJEDNATEL NA ŽÁKADĚ JOPORUČENÍ NEBO LÍPE ŽOBAŽUKU SP KŮTK, TO BNAMENÁ PROVĚST SEPARACI, PŘEJCENT. A BRUTEK KONTAMINOVANÉ ZEMINY BŮVĚST NA BIODEGRADAČNÍ PLOCHU. ZA ČELOU SOBY OCA 5 MEŠTOU ZHOTOVITEL NEPŘEDLOŽEN ŽABNÝ CENOVÝ NÁVRH PRO ŘEŠENÍ TĚTO SITUACE. JEŠNALO SE ŽOBE O CENY, CELKOVOU ZA OSUOB A MČOŽENÍ, KTERA ŽYLA PRO NÁS NEPŘÍMATELNÁ. ŽHOVITEL TOM DECEBOUAC NA SVUHO CURRODAVATEL A TEN SE S TÍH ŽADYVAL PRO NÁS

Datum	Denní záznamy stavby
	POUZE OKRAJOVÉ A POVINNOST LUKVIDACE PŘEDVÍČENÉHO VÝKOPU SE SNAŽÍ PŘECHNOUT NA DNEŠNÍTELE JAKO PŘERAŽKY V TROUŠENÍ JILA. DNEŠNATEL TO TAKTO NEVNÍMÁ A TRVÁ NA PŘESCOŽENÍ SOCIÁLNÍ NABÍDKY, ABY MOHLA SOUÍT K VEJŠKOVÝM OČOVHACENÍ.
	Práce : 
22.6.2022	POČASI: DOLO JASNO, 15°C - 23°C
ČASOVEK	PRACOVNÍCI: VHS-TUP, VHS-10, JARISTAV 4, ŠKOVÁN 3
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: 3x BAGR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 23B, VÝKOP, VLOŽENÍ POTRUBÍ
	OBŠEP ZÁŠYP
	- VÝKOP PŘÍPOJKA Č.P. 80
	- PROPUSTEK 3 - ZARÉZÁNÍ ASPALTU, ODSTRÁNÍ SKLADBY
	NAD STROPEN PROPUSTKU
	- ČISTĚNÍ ŠACHET A VYHAZÁNÍ ERGELITEN
	- ÚPRAVY PODKLADNÍCH VRSTEV STOKA 8" VRAZENÍ HRNÍČKŮ
	PRO POKLÁDKU ŽIVICE
	
23.6.2022	POČASI: JASNO 17°C - 30°C
	PRACOVNÍCI: VHS-TUP, VHS-10, JARISTAV 4, ŠKOVÁN 3
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: 3x BAGR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- PROPUSTEK 3 - REZÁNÍ STROPU, ROVRÁNÍ
	- ZÁŠYP PŘÍPOJKY U DOMU Č.P. 23B
	- ČISTĚNÍ ŠACHET, VYHAZÁNÍ ERGELITEN
	- ODSTRÁNÍ VODY
	- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 80, VLOŽENÍ POTRUBÍ, ZÁŠYP
	MUTNĚNÍ DO VRSTVŮCH
	- ÚPRAVY PODKLADNÍCH VRSTEV STOKA 8"
	PRO POKLÁDKU ŽIVICE
	

Datum	Denní záznamy stavby
24.6.2022	Počasí: JASNO
PÁTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: V42-T4P, V42-10, JARISTAV 4, ŠKRVÁN 3
	MECHANIZACE: 3x BAGER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- ZÁSTUP A HUTNĚNÍ PŘÍPOJEK Č.P. 29B A 80
	- VÝKOP PŘÍPOJEK K DOMU Č.P. 15 A DOMU Č.P. 3, POKLÁDKA TRUB
	- ÚPRAVY KOMUNIKACE STOKA "B" PRO POKLÁDKU ŽIVICE
	- ČISTĚNÍ ŠACHET, VYHAZÁNÍ KRGELITERA
25.6.2022	Počasí: JASNO
SOBOTA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: V42-3, JARISTAV 4
	MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- PROPUSTEK 3 - BOURÁNÍ STROPU, VYKOPÁVÁNÍ, VÝSTUŽE
	- ZÁSTUP A HUTNĚNÍ PŘÍPOJEK K DOMU Č.P. 15
	- VÝKOP, ULOŽENÍ, ZÁSTUP - PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 13
26.6.2022	Počasí: JASNO
NEDELE	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: V42-3, JARISTAV 4
	MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 43, VÝKOP, POKLÁDKA, ZÁSTUP
	- ZÁSTUP A HUTNĚNÍ PO UVEDENÍ PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 13
27.6.2022	Počasí:
PONDĚLÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: V42-T4P, V42-10, JARISTAV 4, ŠKRVÁN 3
	MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- VÝKOP RÝHY STOKA "A3" ŠA 15-ŠA 3-1, ROZBOURÁNÍ STĚNY
	A DVA PROPUSTKY 3, ČERPÁNÍ VODY, POKLÁDKA POTRUBÍ
	- VÝKOP RÝHY PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 55, POKLÁDKA, ZÁSTUP
	- ČISTĚNÍ ŠACHET A ULIČNÍCH VPUSTÍ
	- ÚPRAVY KOMUNIKACE STOKA "B" PRO POKLÁDKU ŽIVICE
	- VÝKOP RÝHY PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 10 A

Datum


Denní záznamy stavby

26.6.22

ZÁPIS O KONTROLY STAVBY

Kač: Zc. Kruzer, Ing. J. Kana, P. Kruza, S. S,
 Stan. Kudělka, Stan. K. Črha, T. Stránský

- 1) Byla provedena kontrola provádění prací.
- 2) V současné době je prováděn montáž kanalizačního přípojek a přípojený kanál střeš. #3".
- 3) Kontrolitel předložil výkresy detailů pro podání díla - TBS provádí se způsobem celkové pracovní podrobnosti detailů zvlášť pro čou a zvlášť pro kanalizaci. Součástí budou podrobnosti pro výšku sadu se suchými, CS (SV), DTS a such. garí.
- 4) S ohledem na skutečnost a sdělení předem naměřené části propustku o.3. součástí TBS a propustku se následujícím určením:
 - díly k opěrnému nádobu krytka propustku z kamene na cement. maltu s zaplétáním.
 - všechny ostatní díly se musí provést jako montáž na místo, kde stánek propustku. Výška dílů bude stejná jako u propustku č. 2 - Ing. P. Kač.

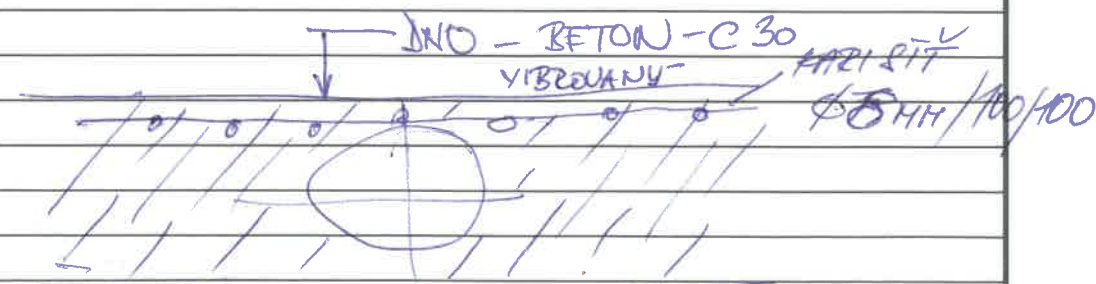

Datum	Denní záznamy stavby
	5) TDS upozorní je zhotovitele, že při opravě přepustky č. 2 dle návrhu náleželo 100g. Kancel je nutné odhlásit se státnímu úřadu přísluš, aby dle ke, spíše než ohradu (spíše) kure pak přeruš na jistotu proč žil dle přísluš. přísluš.
	6) Bylo domluveno, že státní úřad a TDS provádí 30.6.22 sjezd na místě, zda bude moci být zhotovena přímka díla se souhlasu směrem dle č. 9.
	Zapsal: <i>Chy</i>
28.6.2022	ZÁPIS ZHOTOVITELÉ
ÚTERÝ	DNES RÁNO V 730 HODIN BYLO ZJIŠTĚNO ZÁŽERNÉ POŠKOZENÍ DÍLA NA PŘÍPOJCE K DOMU Č.P. 55 STÁŽENO A POSUNUTO PŘEKLENOVACÍ POTRUBÍ, NACHÁZENÉ ASFALTOVÉ KRY V POTOCE A TÍM ZNEHODNOTENO PŘÍPRAVENÉ PODLOŽÍ. NA MÍSTO BYLA PŘIVOLÁNA PŮR A ZJIŠTĚNÉ ZDOKUMENTOVÁLA, NÁSLEDNÁ OPRAVA SI VYŽÁDALA 5 HODIN PRÁCE BAGRU A 3 PRACOVNÍKŮ, BOHUŽEL NEBYLO TO POPRVE - PROPUSTEK 2, ČOV.
28.6.2022	PŮRČÍ
ÚTERÝ	PRACOVNÍ DOBA: 700-1900 HODIN PRACOVNÍCI: TYP-VLS, VLS-10, JARISTAV 4, ŽERUÁN 3 MECHANIZACE: 3x BAGR, 5x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, FINIŠER, VÁLEC, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 55, POKLÁDKA POTRUBÍ PŘES PŮR OBST. ZÁST. HUTNĚNÍ - VÝKOP PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 110A - VÝKOP RÝHY STOKA „A3“ ŠA 15-ŠA 3-1, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBST. ŽITĚKODRTI, ČERPAČNÍ VODY - ÚPRAVY KOMUNIKACE STOKA „B“ PRO POKLÁDKU ŽIVICE - POKLÁDKA ŽIVICE RÝHA - APLIKACE SPOJOVACÍHO POTRUBÍ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ

Datum	Denní záznamy stavby
30.6.2021 ČTVRTEK	DĚŠLITKA DNĚ ZHOTOVITEL DOKONČIL VÝSTAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI PŘEDSLAV. V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO, ČLÁNKU IX. PŘEVZETI DÍLA, ODSTAVEC 9.2, JSME SE S OBJEDNATELEM DOHODLI NA PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA K DĚŠLITCE DNĚ. BYL SEPSÁN SOUPIS ZJIŠŤENÝCH VAD NEBRANÍCÍCH V UŽITÍ DÍLA S DOHODNUTÝMI TERMINY JEJICH ODSTRANĚNÍ. ZA ZHOTOVITELE: PETR KUDĚLKA
30.6.2021 ČTVRTEK	ZÁPIS ZHOTOVITELE: - UPOZORUJEME TOS A OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST, ŽE ZHOTOVITELI STÁLE PŘETRVÁVA PŘEKÁŽKA V PROVEDENÍ DÍLA V ROZSAHU ZAPRAVENÍ KOMUNIKACÍ PO VÝSTAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ŽE ZHOTOVITEL UPOZORUJE OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST, ŽE DOKUD NEBUDĚ VZÁJEMNĚ POTVRZENÝ ZL A ROZPOČET ROZSAHU ZAPRAVENÍ, ZHOTOVITEL NA TĚTO ČINNOSTI NEZAHÁJÍ PRÁCE. DÁLŽE ZHOTOVITELI PŘETRVÁVA PŘEKÁŽKA V PROVEDENÍ DOKONČENÍ DÍLA - LIKVIDACE KONSTATOVANÉ ZEMINŮ Z NEZDĚKONILIZ TECHNOLÓGY A HUSÁRNA PŘEDSLAV. V TĚMTO PŘÍPADĚ, ZHOTOVITEL UPOZORUJE OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST, DOKUD NEBUDĚ VZÁJEMNĚ POTVRZENÝ ZL A ROZPOČET, ZHOTOVITEL NEZAHÁJÍ PRÁCE. ZAPSAL: PETR KUDĚLKA
30.6.2021	ZÁPIS TOS A OBJEDNATELE OBJEDNATEL A TOS NEPOUHLACÍ SVRŽE UVEDENÝM ZÁPISEM ZHOTOVITELE. CO SE TYČE BEHINY OBJEDNATEL NENÍ PŘÍPOČTE ÚSPĚCH A ŘEŠENÍ JE POUZE NA ZHOTOVITELI. ZHOTOVITEL DOSUD NEPŘESLOŽIL NÁROK NA ÚPRAVY KOMUNIKACÍ, KTERÁ JÍ ODPOVÍDALA SKUTEČNOSTI. ZAPSAL: [Podpis] TOS
