



# Stavební a montážní deník č. 9

samopropisovací  
3 x 20 číslovaných listů



# Základní list – adresář

List 1

pro objekt (označený podle investičního plánu)

kraj

úsek

obec

místo

## Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telefony odpovědných zástupců:

Objednatel

Stavebník (investor)

Technický (stavební) dozor investora

Stálý

Občasný

Generální dodavatel

Dodavatel stavební části

Dodavatel technologické části

Poddodavatelé

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

## Změny a doplňky

POČASÍ:

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 2 JARISTAV

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- OPRAVA PŘEHYBU KANALIZAČNÍ STOKY „A“ V ÚSEKU

ČA 8 - ČA - 7, ODKOPÁNÍ PODŠYP STĚRKODĚTI, VYROVNÁNÍ,

- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VYSTAVĚNÍ V DÉLCE 11 M

8.5.2022  
NEDELE

POČASÍ:

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: V43-T4P, 6V42, 4 ŠKVAŇ, 2KK TECHNOLOGI

MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, TRAKTORBAGER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- OPRAVA ZÁHKOVÉ DLAŽBY STOKA „B1“

- ÚKLID A ÚPRAVA TERÉNU KOMUNIKACE STOKA „A3“

- ČOV - ZÁŠYPY A HUTNĚNÍ KOLEH BUDOVY

- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

- ÚPRAVA LOŽE POD ŠLADOVKY

- ZPROVOZŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZAŘÍZENÍ

- ČERPÁNÍ VODY

9.5.2022  
PONDĚLÍ

POČASÍ:

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: V43-T4P, 8 V42, 4 ŠKVAŇ, 2 PLOT, 2KK-T.

MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, TRAKTORBAGER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

- POKLÁDKA ŠLADOVK NA VÝÚSTNÍM OBJEKTU

- MONTÁŽ BRÁNY A OPLODĚNÍ

- VÝKOP JAM PRO MONTÁŽ OPLODĚNÍ

- ZÁŠYPY A HUTNĚNÍ KOLEH BUDOVY ČOV

- ZPROVOZŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZAŘÍZENÍ

- ČERPÁNÍ VODY

10.5.2022  
ÚTERÝ



PŮČASÍ:

PRÁČOVNÍ DOBA: 700-1200 HODIN

PRÁČOVNÍCI: VUS - TUP, 3 VUS, 4 ŠKRVÁNĚ, 2 PLOT, VRTAČ  
2 KK - TECHNOLOGY, 2 KLIMATIZACE

MECHANIZACE: 2x BAGER, 1x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, TRAKTORBAGER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PROPJELENÍ PROTLAKU STOKA „A3“ V ŠACHTY ŠA 3-4
- OPRAVA STĚPÁNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 100 V ŠAHTY ŠA 3-4
- ČOV - VÝKOP JAH PRO MONTÁŽ PLOTU
- ČERPÁNÍ VODY DO BIO 2
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- VATAŇÍ OTVORŮ DN 50 DO ŠAHTY PRO ELEKTRO & VODU
- MONTÁŽ VĚTRKOVÉHO VODOVODU A OCHRÁŇOVÁNÍ PRO ELEKTRICKÝ KABEL
- USAZOVÁNÍ SLOUPKŮ OPLOČENÍ DO BETONU
- MONTÁŽ VRDUCHOTECHNIKY
- ZÁŠYP & HUTNĚNÍ TERÉNU KOLEM ČOV
- ZPRAVOVNĚNÍ ELEKTROINSTALACE ZÁŘIVENÍ

11.5.2020  
OTVĚRA

PŮČASÍ:

PRÁČOVNÍCI: VUS - TUP, 4 VUS, 3 ŠKRVÁNĚ, 2 PLOT, 2 KLIMATIZACE  
PRÁČOVNÍ DOBA: 700-1200 HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- USAZENÍ ŠAHTY ŠA 3-4
- OBSYP A ZÁŠYP POTRUBÍ VČETNĚ ŠAHTY ŠA 3-4
- ÚPRAVA RESTY, DOSYPÁNÍ ŠTĚPKEN V ÚSEKU ŠA 3-3 ŠA 3-4
- ČOV - VÝKOP JAH PRO MONTÁŽ PLOTU
- ČERPÁNÍ VODY DO BIO 2
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- MONTÁŽ OPLOČENÍ
- MONTÁŽ VRDUCHOTECHNIKY
- ZÁŠYP & HUTNĚNÍ TERÉNU KOLEM ČOV
- ÚKLID V ČOV

12.5.2020

Denní záznamy stavby:

List č. 0669944

Datum:

Počasí:

PRACOVNÍCI: VHS-TYP, 4VHS, 2PLOT, 4ŠKVAŇ  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> HODIN  
MECHANIZACE: 2x BAGE, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGE  
MALÁ MECHANIZACE

12. 5. 2022  
PÁTEK

PROVÁDÍ SE:

- RŮZNÍ VÝKOP - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE U Č.P. 30
- OBNAŽENÍ KABELŮ, ZASYPÁNÍ PROSINKOU
- ČOV - MONTÁŽ OPLOČENÍ, UZAVŘOVÁNÍ SLoupKŮ DO BĚTŮ
- LIKVIDACE ZEMINY Z OBJEKTU VÝSTAVBY ČOV
- ÚKLID KOLEM ČOV

Počasí:

PRACOVNÍCI: VHS-TYP, 4VHS, 2PLOT, 4ŠKVAŇ  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> HODIN  
MECHANIZACE: 2x BAGE, NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC,  
TRAKTORBAGE, MALÁ MECHANIZACE

16. 5. 2022  
PONDĚLÍ

PROVÁDÍ SE:

- ČOV - MONTÁŽ PODKLADŮ DESEK
- UTĚSNĚNÍ SPAD UVNITŘ OBJEKTU, ÚKLID
- LIKVIDACE ZEMINY Z OBJEKTU VÝSTAVBY ČOV
- STOKA "B1" OSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OBRUBNÍKŮ  
A ODBOURÁNÍ BĚTONOVÉHO LOŽE

ZÁPIS ZHOTOVITELE

16. 5. 2022  
PONDĚLÍ

UPROZORŮJEME OBJEDNATELE A TDS NA SKUTEČNOST,  
ŽE PŘI POKUSU PROVÉST PROTLAK POD STÁVAJÍCÍM  
PROPUSTKEM NA STOCE A  
DOŠLO KE KOLIZI SE STÁVAJÍCÍM ZALOŽENÍM  
PROPUSTKU - PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSKYT VELKÝCH KAMENŮ,  
PROTO SE PROTLAK NERDABIL.  
ZHOTOVITELI VZNIKÁ PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ DÍLA  
A ŠADÍ OBJEDNATELE O SOUČINNOST PŘI ŘEŠENÍ  
DANÉHO PROBLÉMU.

POČASÍ: ZATAŽENO  
 PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> HODIN  
 PRÁCOVNÍCI: VLK - TUP, LVLK, D. PLOT, L. KREVAČ  
 MECHANIZACE: 2. BACR, 2. NAKLADNÍ AUTO, VÁLEK, TRAKTOR B&OR, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 ČOV - MONTÁŽ OPLOČENÍ - PLETIVO  
 - LIKVIDACE ZEMINY Z OBJEKTU UÝSTAVBY ČOV  
 STOKA "B1" ODSTRANĚNÍ OBDOBŇKŮ A OBDOBŇÁNÍ  
 BETONOVÉHO LOŽE

17.5.2022  
 ÚTERY



ZÁPIS Z KONTROLY STAVBY

17.5.22

Míst: Do M. Krause, Ing. D. Kouřa, Ing. P. Kouřa, S.S., P. Kudělka, K. Erda, T. Stráček.

- 1) Objekt byl důrazně upozorněn na řádné odvození kraků, písků a druzevitých plastových termínů. Slijní k tomu platí i řízení práce a bezpečnost práce nejen směr pracovníků ale i okol. Hst. klau se přizpůsobí na stěrku, klauů mídních chrstel.
- 2) V prostoru u kano. zberinice, kde je shledla čerstvá vrst. materiál je nutno udržovat pravidel a spovis a vybití, pak u dílků kůstko, kde je vstupní komecist - pumie  
 17.5.22
- 3) TBS provádí předložený dokladu - PD, sledící / zprávu k oporě sled. zpráva na stře, H'a současně psychické dohledu opory. Před. význam a příkazy chytit do hlub. patloda vidám zprávu, u příkole zprávu.

4) Zřídlením zkušebníků a zajištění předložení - hlavně  
 Ing. Čulík se dne 11.5.22 - a kumul. a zajištění  
 práce o práci, které je nutné zřídit  
 vzhledem k zajištění práce a práce pro  
 a je písemně s majitel zkušebníků - star. P. Kudrka,  
 Jan. Slaveta, Ing. Vraň, Ing. Krupa, P. Krupa,  
 Ing. Havel.

5) Objednatel kromě toho, že poskytl i předem  
 přívod a práce pro zkušebníky na straně A3  
 před vybudováním.  
 Objednatel TJS

POČASÍ : ZATAŽENO  
 PRACOVNÍCI : TJS - VHS

18.5.2000  
 STŘEDA

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE : 3x BAGR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ,  
 FINIŠER, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

PŘEROVÁNÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE STOKA B1 "DLE POŽADAVKŮ  
 OBJEDNATELE

VÝPRAVA ČESTY STOKA "A3"

- OPRAVA BETONOVÉHO POTRUBÍ PŘED DŮHEM Č.P. 12
- PŘEV - POKLÁDKA KSC NA PŘÍLEŽKOVÉ KOMUNIKACI
- USAZENÍ POKLOPŮ NA VÝŠKU
- ŘEZÁNÍ ASFALTU V NÁPOJENÍ

Zápis TJS - 18.5.22

Vyřídil objednatel a TJS k zřízení

zkušebníků se dne 16.5.22

- dle zřízení neodporuje stavebnímu, neboť  
 práce se na zkušebníky poskytl celý dle zřízení  
 se 10 zkušebníky 3.3.22. zkušebníky nebyly  
 stavebními, neboť objednatel poskytl před tím  
 datum objednatel. Zkušebníky se tak zřídily

Objednatel

Datum:

POČASÍ: JASNO 14°C - 22°C

PRACOVNÍCI: VUS-TLP, VUS-M, JARISTAV 4, Ž

ŠKRVAN 3

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 4x BAGR, 6x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, FINIŠER,

TRAKTORBARR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- BOURÁNÍ ASFALTŮ KOLEM ŠACHET PO FŘEZOVÁNÍ
- ÚPRAVA CESTY STOKA A 3
- ÚPRAVA PODKLADŮ PRO POKLÁDKU OBROBNÍKŮ STOKA „B1“

KRAJSKÁ KOMUNIKACE

- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ CESTY
- POKLÁDKA PRVNÍ ŽIVIČNÉ Vrstvy
- BOURÁNÍ ASFALTU V NÁPOJENÍ
- TERENNÍ ÚPRAVY KOLEM OPLOČENÍ
- ÚPRAVA PODLOŽÍ PRO POKLÁDKU OKAPOVÉHO
- PŘEDÁNÁ REVIZE ELEKTRO

- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ CESTY
- POKLÁDKA PRVNÍ ŽIVIČNÉ Vrstvy
- BOURÁNÍ ASFALTU V NÁPOJENÍ
- TERENNÍ ÚPRAVY KOLEM OPLOČENÍ
- ÚPRAVA PODLOŽÍ PRO POKLÁDKU OKAPOVÉHO
- PŘEDÁNÁ REVIZE ELEKTRO

POČASÍ: POKLONASNO 14°C - 25°C

PRACOVNÍCI: VUS-TLP, VUS-M, JARISTAV 4, ŠKRVAN 3,

4 VUS - ČOV

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 4x BAGR, 6x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC,

TRAKTORBARR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE

- BOURÁNÍ ASFALTŮ KOLEM ŠACHET PO FŘEZOVÁNÍ
- PŘÍPRAVA NA POKLÁDKU OBROBNÍKŮ STOKA B1
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE, VÝSLOVÁ ÚPRAVA LOŽE
- VÁRÁNÍ VÝTUŽE - PROPUSTEK
- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA DŮVČE ŽIVIČNÉ Vrstvy
- VÝSLOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
- TERENNÍ ÚPRAVY PODEL OPLOČENÍ
- POKLÁDKA OBROBNÍKŮ OKAPOVÝ ODOBNIK
- USAZENÍ KOMBIZITNÍCH POKLOPŮ

- BOURÁNÍ ASFALTŮ KOLEM ŠACHET PO FŘEZOVÁNÍ
- PŘÍPRAVA NA POKLÁDKU OBROBNÍKŮ STOKA B1
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE, VÝSLOVÁ ÚPRAVA LOŽE
- VÁRÁNÍ VÝTUŽE - PROPUSTEK
- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA DŮVČE ŽIVIČNÉ Vrstvy
- VÝSLOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
- TERENNÍ ÚPRAVY PODEL OPLOČENÍ
- POKLÁDKA OBROBNÍKŮ OKAPOVÝ ODOBNIK
- USAZENÍ KOMBIZITNÍCH POKLOPŮ

- BOURÁNÍ ASFALTŮ KOLEM ŠACHET PO FŘEZOVÁNÍ
- PŘÍPRAVA NA POKLÁDKU OBROBNÍKŮ STOKA B1
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE, VÝSLOVÁ ÚPRAVA LOŽE
- VÁRÁNÍ VÝTUŽE - PROPUSTEK
- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA DŮVČE ŽIVIČNÉ Vrstvy
- VÝSLOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
- TERENNÍ ÚPRAVY PODEL OPLOČENÍ
- POKLÁDKA OBROBNÍKŮ OKAPOVÝ ODOBNIK
- USAZENÍ KOMBIZITNÍCH POKLOPŮ

- BOURÁNÍ ASFALTŮ KOLEM ŠACHET PO FŘEZOVÁNÍ
- PŘÍPRAVA NA POKLÁDKU OBROBNÍKŮ STOKA B1
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE, VÝSLOVÁ ÚPRAVA LOŽE
- VÁRÁNÍ VÝTUŽE - PROPUSTEK
- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA DŮVČE ŽIVIČNÉ Vrstvy
- VÝSLOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
- TERENNÍ ÚPRAVY PODEL OPLOČENÍ
- POKLÁDKA OBROBNÍKŮ OKAPOVÝ ODOBNIK
- USAZENÍ KOMBIZITNÍCH POKLOPŮ

- BOURÁNÍ ASFALTŮ KOLEM ŠACHET PO FŘEZOVÁNÍ
- PŘÍPRAVA NA POKLÁDKU OBROBNÍKŮ STOKA B1
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE, VÝSLOVÁ ÚPRAVA LOŽE
- VÁRÁNÍ VÝTUŽE - PROPUSTEK
- ČOV - ASFALTOVÝ POSTŘÍK PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA DŮVČE ŽIVIČNÉ Vrstvy
- VÝSLOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
- TERENNÍ ÚPRAVY PODEL OPLOČENÍ
- POKLÁDKA OBROBNÍKŮ OKAPOVÝ ODOBNIK
- USAZENÍ KOMBIZITNÍCH POKLOPŮ

20.5.2020

PÁTEK

Denní záznamy stavby:

List č.

0669948

Datum:

POČASÍ: OBLAČNO 8°C - 20°C

PRÁCOVNÍCI: VHS - 2, ŽADUVAŇ 3, JARISTAV 4

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BQR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- BOURÁNÍ ASFALTU KOLEM ŽALOZET PO FREZOVÁNÍ.

- ÚKLID ASFALTU

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU VRSTVY ŽIVICE, KRAJSKA

KOMUNIKACE STOKA "B1"

- ČOV - OKAPOVÝ ŘÍDNIK

- USAZENÍ KOMPOZITNÍCH POKLOPŮ

- OBEZDÍVKA VZT

21.5.2022  
SOBOTA

POČASÍ: POLOJASNO 8°C - 21°C

PRÁCOVNÍCI: JARISTAV 4, VHS - 4

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BQR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU VRSTVY ŽIVICE,

KRAJSKA KOMUNIKACE STOKA "B1"


- ČOV - DOKONČENÍ OBKLADŮ KOLEM VZT

- SBRONIVELAČNÍ STĚRKY PODLAH

- MONTÁŽ SCHODOVEK VSTUP

- DOKONČENÍ KLEPÍŘSKÝCH PRŮKŮ

22.5.2022  
NEDELE

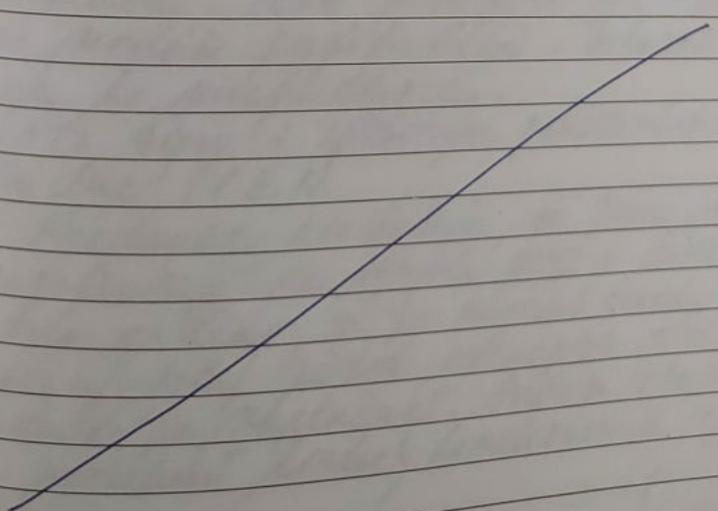

POČASÍ: SKORO JASNO 9°C - 25°C

PRACOVNÍCI: VHS - TUP, M VHS, 4 JARISTAV, 3 ŠKRVÁN

PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1800 HODIN

MECHANIZACE: 2x BARR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, UNC,

HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝLU NA POKLÁDKU PODKLÁDNÍ VĚSTVY ŽIVICE, KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "B1"

- VÁZÁNÍ VÝSTUŽE PROPUSTEK STOKA "A"

- BOUBÁNÍ ASFALTU PO FŘEBOVÁNÍ STOKA "A"

- ÚKLID S ODVOZ VYBOUBANÉHO MATERIÁLU

23.5.2020

PONDĚLÍ

### JAPIS Z KONTROLY STAVBY

24.5.22

Byla provedena kontrola provádění prací za účelem kvality, dodržení PD, řízení KČ a ŽOBR.

TSS provedla kontrolu výstavby betonářky propustky na stoka "A" a následujícím provedením:

- na základě TSS a předložených PD se stěhují vzhledem a výkonem výstavby nutím kontrolovat, že vzhledem karta nepředložil, aby byl průměr provedl kontrolu a TSS práce okamžitě zastavil do doby předložení předložených dokladů. Testy prováděly byl proveden již v minulosti poskytl. Zkontroloval na se nepřehledně.

112 výpis s výstředním provedením ze 13. dne 17.5.22.

- Objednatel kontroluje, že práce na akci pokračují - ne poskytl HMC k dodávce 0,1

- bylo zjištěno, že pro obrovský řádek A1 je výkon silný, výkon výkonů 100, lokalit je neplněn. Zároveň zkontroluje a provedení kontrola kvality a zjištění příčin.

Černý TSS

Zápis geotechnické služby

24.5.2022

Dne 10.5.2022 byly provedeny statické zatěžování  
zkoušky deskou s tímto předběžnými výsledky:

ZD1 6m od SA 0 → COV  $E_{dsk2} = 486 \text{ MPa}$ , poměr = 1,93  
ZD2 4m od SA 0 → SA1  $E_{dsk2} = 556 \text{ MPa}$ ,  $-u = 1,28$

Dne 24.5.2022 byly tyto výsledky:

ZD1 14m od SB 1-1-1 → SB 1-6,  $E_{dsk2} = 140 \text{ MPa}$ , poměr = 2,9  
ZD2 26m od SB 1-6 → SB 1-5,  $E_{dsk2} = 158 \text{ MPa}$ ,  $-u = 3,5$   
ZD3 9m od SB 1-1 → SB 1-2,  $E_{dsk2} = 137 \text{ MPa}$ ,  $-u = 2,8$   
ZD4 15m od SB 1-1 → SB 4,  $E_{dsk2} = 149 \text{ MPa}$ ,  $-u = 5,8$

Za Geotae GS a.s.

Ing. Němčanský *[signature]*

POČASÍ: ZATAŽENO, PŘELIŠKY 9°C - 21°C

24.5.2022

PRACOVNÍCI: VHS - TČP 11 VHS 4 JARISTAV, 3 SKOVÁN

ÚTERÝ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, 2x NÁKLADNÍ AUTO, UNO,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ Vrstvy ŽIVICE
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "B1"
- BOURÁNÍ ASFALTU PO FREDOVÁNÍ STOKA "B1"
- ÚKLID A ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU

ZÁPIS TSS:

Sle Infringce z vlničku static zkoušek - P13  
zápis Ing. Němčanského nejsem + předku  
zkoušky 882 a 884. Zádome funk publikován  
a z karta opakovat.

*[signature]*

POČASÍ: ZATÁŽENO, SRÁŽKY 80-120  
 PRÁCOVNÍCI: VHS-TIP, 11 VHS, 4 JARISTAV, 3 SEDLÁČEK  
 PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: 2x BACR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, LNC,  
 MALÁ MECHANIZACE

25.5.2020  
 STŘEDA

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ VSTAVY ŽIVICE.
- KRÁSKÁ KOMUNIKACE STOKA "B1"
- BOURÁNÍ ASFALTU PO PŘEDOVÁNÍ STOKA "B1"
- ÚKLID A ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU
- ČOV - VÝUSTNÍ OBJEKT

POČASÍ: OBLAČNO 13°C - 8°C

PRÁCOVNÍCI: VHS-TIP, 11 VHS, 4 JARISTAV, 3 SEDLÁČEK  
 PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: 2x BACR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, LNC,  
 MALÁ MECHANIZACE

26.5.2020  
 ČTVRTEK

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ VSTAVY ŽIVICE.
- KRÁSKÁ KOMUNIKACE STOKA "B1" A STOKA "B"
- BOURÁNÍ ASFALTU PO PŘEDOVÁNÍ STOKA "B1", "B" A "A"
- ÚKLID A ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU
- VÝKOP PŘÍPOJKY K DOHU Č.P. 41
- ČERPÁNÍ VODY

26.5.2020

ZÁPIS (MOS BRNO)

DNEŠNÍHO DNE ZAUGLAL PAN FLEISIG NA STAVBU  
 POLICII OD KVŮLI ÚDAJNĚ NEMOŽNOSTI ODJEZDU  
 OSOBNÍHO AUTA OD JEHO DOMU A NEMOŽNOSTI  
 VYJEZDU POŘÁBNÍHO AUTA. PŘIVOLANÉ HLÍDE  
 POLICIE JSEM UVEDL MOŽNOSTI ODJEZDU  
 ZMÍNĚVANÝCH AUT BUĎ PŘES OTIN A NEBO  
 ČESTOU STOKA A. NAVÍC JSEM NA BUDOVANÉ  
 PŘÍPOJCE K DOHU Č.P. 41 DĚLI PŘÍPRAVENÝ  
 PŘEJEZDOVÝ PLECH, KTERÝ JSEM NA KONCI ŠTENY  
 U VÝKOPU ULOŽIL,

ZÁPIS MOS BENO

REAKCI NA VÝSLEDEK JEDNÁNÍ POLICIE ČD OD PANA FLEISGA BYLO, ŽE ZAČAL NAKOUŠTĚT RYBNÍČEK PŘED JEHO DOJEH PŘEHÁZENÍ KORYTA POTÚČKU. TĚM DOCHÁZÍ K ZAPLAVOVÁNÍ PŘOPUSTKU STOKY A V ÚSEKU SA 11 - SA 12 A NADĚNÍ DÍLA. NA TUTO SKUTEČNOST BYL UPOZORNĚN PAN STABOŠTA OBEČ PŘEDSÍLA PÁN KREUZER.

26.5.2022  
ČTVRTEK

ZÁPIS SÚSPH

PO PROVEDENÉM MÍSTNÍM ŠETŘENÍ BYLO S INVESTOREM DOHODNUTO FINÁLNÍ ŠKŮBNÍ KONSTRUKČNÍCH Vrstev KOPUNINACE, A SICCS ACP 16 ... 60mm A ACO 11 ... 10mm, OBRUBNÁ Vrstva ACO 11 BUDE POLOŽENA PO CEZÉ SÍTI KOPUNINACE

ZA SÚSPH FLAK

POČASÍ: ZATAŽENO 5°C - 13°C

PRACOVNÍCI: 11 VHS, 4 JARISTAV, 3 ŠKŮVNÍ

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00 HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGE, 2x NÁKLADNÍ AUTO, UNC,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RYBY NA POKLADKU PODKLADNÍ Vrstvy ŽIVICE, KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "B"
- BOURÁNÍ ASFALTU PO PŘEŘOVÁNÍ STOKA "B1" A "B"
- ÚKLID A ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 41,
- ZÁSYĚ A MUTNĚNÍ PO Vrstvách
- ČERPÁNÍ VODY
- OPRAVNÉ STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

27.5.2022  
PÁTEK

POČASI: OBLAČNO, 6°C - 16°C

PRÁČOVNÍCI: 4 VHS, 4 JARISTAV

PRÁČOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ Vrstvy ŽIVICE
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "A"
- VÝMĚNA PRÁČKÉ ODBOČKY STOKA "B"
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VrstVÁŘU
- ČOV - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VZD
- ČISTĚNÍ A ÚKLID V BUDOVĚ
- SAMONIVELAČNÍ STĚDKA PODLAHY

28.5.2020

SOBOTA

POČASI: OBLAČNO, DEŠŤ 6°C - 21°C

PRÁČOVNÍCI: 3 VHS, 3 JARISTAV

PRÁČOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ Vrstvy ŽIVICE
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "A" A "B"
- ČOV - ČISTĚNÍ A ÚKLID V BUDOVĚ

29.5.2020

NEDELE

POČASI: OBLAČNO, DEŠŤ 7°C - 19°C

PRÁČOVNÍCI: 4 VHS, 4 JARISTAV, 2 ŠKOLVÁN, 2 EL

PRÁČOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 3x BAGER, 2x NÁKLADNÍ AUTO, UNC,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA RÝHY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ Vrstvy ŽIVICE, KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "A" A "B"
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ STOKA "B1"
- ÚKLID A ODVOZ VYROUŠANÉHO MATERIÁLU
- POKLÁDKA OBRAVNÍKŮ
- STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI

30.5.2020

PONDĚLÍ

ZÁPIS Z KD 31.5.22

TRŽEŠT: Bc. M. KRÉMBER, ING. J. KOUPA, P. KOUPA, JiS,  
STAV. KČRHA

1) BYLA PROVEDĚNA KONTROLA PRAVÁNÍ PRACÍ  
ZO STRÁNE KVALITY, SODŽENÍ TECHNOLOG. KAPNÉ,  
TD, ZÁVĚRŮ KD A ZOSP.

2) V SOUČASNĚ DOBĚ SE PROVÁDÍ ZASFALTOVÁNÍ  
VRSTVY ANADUB V TL. 60MM A CP 16 - RÝHA  
ZO KANALIZACI NA TRASE "B" - VIB ZÁPIS SÚS  
ZE DNE 26.5.22

3) BYLO DOMLUVENO NÁLEŽNĚ:

a) OBJEDVATEL A TOS POŽADUJE URÝCHLENÉ DOKONČENÍ  
OPRAVY PROPUSTKY NA TRASE "A". ZAJIŠTIT PROTOJENÍ  
SE STAVAJÍCÍ ČÁSTÍ PROPUSTKY. NUTNO PROVEŠT  
NÁVRH PROJEKTANTA - STATIKA. TENTO POŽADAVEK  
BYL VNESEN JIŽ PŘED MĚSÍCEM A DOSUD NEMĚ  
VYŘEŠENO.

TATO SITUACE MÁ VELKÝ VOPAD DO ZAJIŠTĚNÍ  
OZLUŠNOSTI V OBCI.

VÝKOP NEMĚ ZAJIŠTĚN PŘOTI PÁDU OSOB. NUTNO  
OKAMŽITĚ ODSTRANIT.

b) TOS POŽADUJE PŘED ASFALTOVÁNÍM PROVEŠT  
UTRÁVU RÝHY U PRACTY PŘED CP. 17.

c) ZHOTOVITEL DOSUD NESTANOVIL TERMÍN NA  
ZAHÁJENÍ KOMPLEX. BRKUSEK NA ČOU.

d) TOS POŽADUJE ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU PRFKER U KOMUNIKACE  
NA ČOU V CELE TRASE (LEVA STRANA).

e) ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL NÁVRH CENY NA OPRÁVU  
ZOURCHŮ MK V OBCI.

f) PŘĚSTI KD SE NASKUTEČNÍ DNE 14.5.22 OD 10<sup>00</sup> HOD.

*[Handwritten signature]*

POČASÍ: OBLAČNO 5°C - 13°C

PRACOVNÍCI: VHS-TMP, 11 VHS, 4 MŘISTAV

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 3x BAGE, 1x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, FINISER,  
VÁLEC, ŽALUZIE, VŮZ, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA ŽIVICE V DYŘE VÝKOPU STOKA "B1", "B"

KRAJSKÁ KOMUNIKACE

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VLIČNÍCH VĚSTÍ A POKLOPŮ STOKA B1

- POKLÁDKA OBRUBNÍKŮ STOKA B1

- ČISTĚNÍ KOMUNIKACE

- OPRAVA PRÁSKLÉHO POTRUBÍ STOKA A, VÝKOP, VÝMĚNA  
OBŠYP A MŮTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

POČASÍ: POLOJASNO 7°C - 10°C

PRACOVNÍCI: VHS-TMP, 16 VHS, 3 MŘISTAV

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGE, 1x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, FINISER,  
VÁLEC, MALÁ MECHANIZACE


PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA ŽIVICE, DYŘA STOKA "B1", "A" KRAJSKÁ  
KOMUNIKACE

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ STOKA "B1", "B"

- POKLÁDKA OBRUBNÍKŮ

- ČISTĚNÍ KOMUNIKACE

- OPRAVA PRÁSKLÉHO POTRUBÍ STOKA A, MŮTNĚNÍ PO  
VRSTVÁCH, ÚPRAVA KOMUNIKACE31.5.2022  
ÚTERÝ1.6.2022  
STŘEDA

Denní záznamy stavby:

List č. 0669956

Datum:

POČASÍ:

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, M.VIŠ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 2x BACP, 1x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, FINISER,  
VÁLEC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA ŽIVICE V CELE PLOŠE KOMUNIKACE STOKA „B1“  
KRAJSKÁ

- SPOJOVACÍ POSTŮPK

- PROPUSTEK STOKA „A“ 9A M - 9A Q ASFALTOVÝ MATERIÁL,  
OŠETŘENÍ SVĚTLÝ BARVOU

- ČOV - ČISTĚNÍ A ZÁSYV KRAJNIC

Q

2.6.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: 2xK TECHNOLOGY, VHS-TLP

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 2x BACP, 1x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, FINISER,  
VÁLEC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA ŽIVICE V CELE PLOŠE KOMUNIKACE  
STOKA „B1“ „B“ „A“

- PROPUSTEK STOKA „A“ 9A M - 9A Q, ZÁSYV BOČNICOU  
STĚN A LUTNĚNÍ PO VĚSTVÁČU

- ČOV - MONTÁŽ ZÁBRADLÍ, SLOUPKU

Q

3.6.2022

PÁTEK

ZÁPIS ZHOTOVITĚLE

NA ŽÁDOST OBJEDNATELE ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL NÁVRH  
ŘEŠENÍ PŘECHODU PŘES STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK NA  
STOCE A3 V ÚSEKU

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL POKLADY PRO POUŽITÍ MREFA  
VÝROBKU - BENEŠ. ŽÁDÁME TAC ABY OSLOVIL BA A SPOLEČNĚ  
POSODIL VHODNOST POUŽITÍ NAVRHOVANÉHO.

OPĚTKOVĚ OBJEDNATELE UPROBŮDĚNÉ NA SKUTEČNOST,  
ŽE ZHOTOVITELI NA TĚTO ČÁSTI STOKY A3 VZNIKÁ  
PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZHOTOVITEL V TĚTO ČÁSTI  
STAVBY VÝSTAVBU POROSTAVIL

Q

3.6.2022

PÁTEK

Denní záznamy stavby:

List č. 0669957

Datum:

POČASÍ : ZATAŽENO, DEŠT

PRACOVNÍCI : ULS-TUP, 4 JARISTAV, 3 ŠKRVAN, 4 ULS

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE : 2x BAGR, UNO, TRAKTORBAGR, 1x NÁKLADNÍ AUTO  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- VYKOP RÝLU - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE PAM FLEISIG  
STOKA A

- ČISTĚNÍ KOMUNIKACE PO ASFALTOVÁNÍ

- ZÁŠYP CHODNÍKU PŘEZOVANÝM ASFALTEM

- ČERPÁNÍ VODY ČOV

2

POČASÍ : ZATAŽENO, DEŠT

PRACOVNÍCI : ULS-TUP, 4 JARISTAV, 3 ŠKRVAN, 4 ULS

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE : 2x BAGR, UNO, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
A OPRAVA ČAČUET - PAM FLEISIG, OBECNÍ ŠKOLA

- ČISTĚNÍ KOMUNIKACE PO ASFALTOVÁNÍ

- ZÁŠYP CHODNÍKU PŘEZOVANÝM ASFALTEM

- ČERPÁNÍ VODY ČOV

2

7. 6. 2022

ÚTERÝ

ZÁPIS Z K2 DNE 26.5.22

ÚČAST: Ing. M. KREJČER, Ing. J. KOUBA, Ing. ČULÍK,  
STAV. P. KUŠELKA, Z. VABOUČEK, T. ŠTEICHER

- 1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVÁŠENÍ PRACÍ PO STRANCE KVALITY, DODRŽENÍ TECHNOLOG. POSTUPŮ, PD, ZÁVĚRŮ K2 A 2027.
- 2) BYLY DOKONČENY ÚPRAVY POUZOHY NA KRAJKĚ KOMUNIKACI VE SMYSLU ZÁPISU T. FLAXY ZE DNE 26.5.22.
- 3) BYLY ZAHÁJENY KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY ČOV. Z TĚCHTO BUDE POKRYT SAMOSTATNÝ ZÁPIS. PŘEDPOKLAD DOKONČENÍ K2 10.6.22

A) KONTROLA ZÁPISU Z MINUL. KD DNE 31.5.22

- a) NIKOL TRVA.
- b-c) SPLNĚNO.

5) BYLO DOHLUŠENO NÁVRHŮVÁNÍ:

- a) OBJEDNATEL A TBS POŽADUJE ODCITRANĚNÍ VAS NA ČOV SLE ZÁPISU ING. ČULÍKA, SÁLE USADIT PARAPETY VNĚJŠT U OKEN, OPRAVIT VYMUČENÍ DEŠT. SPODŮ A CELKOVĚ TERENNÍ ÚPRAVY.
- b) BYLA PROVEDENA ÚPRAVA TRÍPŮJKY DEŠT. KANAL. U ZÁHAJA FLESIGA.
- c) OBJEDNATEL POŽADUJE URÝCHLENĚ DOKONČENÍ KANAL. TRÍPŮJEK A PŘOPOJENÍ KANAL. SÍTKY MEZI NĚKDY A" A A3". PROTOŽE NELZE PŘEVĚST PODVĚT, BUDE "TOTO" PROVEDENO OTEVŘENÝM VÝKOPEM. PROTULSTEK PD RYBNÍKEM BUDE NÁSLEDNĚ OPRAVEN RETONOVÝMI RÁMY - 3 KS, O SV. VELKOSTI 2200/1400 MM. TBS ZAJISTI KLASEČ. VTKRES, PŮBĚL PĚZ A SITUACI U GP.

d) BYLA PROVEDENA PÍCHŮPKA Z JUVŮDŮ V PŘEČNĚNÍ ÚPRAVY POUZOHY MK. OBJEDNATEL DAL POKYN K ÚPRAVĚ MK VE SMYSLU TOLEPSANĚ SITUACE Z 04/22 S SROVNÝMI ÚPRAVAMI, KTERĚ ZADAVATEL DOHLUŠNĚNÍ DO NÁVRHU CENY.

ZÁPISAL:

*[Signature]*

## ZÁPIS ZHOTOVITELE

1) NA VČERŠŠÍM KD TDS ZHOTOVITELI SDĚLIL, ŽE NAVRHOVANÝ PŘEŘAZ VÝROBEK - BENEŠ GP POSOUDIL JAKO ULOHNNÝ PRO POUŽITÍ ZPĚTNÉHO ZAPRAVENÍ, PŘEPUSTKU PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE, ZHOTOVITEL POŽÁDAL TDS O ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PODELNÝ PROFIL - KLADECKÉ SCHÉMA

8.6.2022  
STŘEDA

PO JEHO PŘEDLOŽENÍ ZHOTOVITEL OZNÁMÍ TĚCHNÍM DORÁNÍ PŘEŘAZ VÝROBKU A TĚCHNÍM DOKONČENÍ A ZAPRAVENÍ PŘECHODU PŘES STÁVAJÍCÍ PŘEPUSTEK.

OPĚTOVNĚ ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE NA PŘEKÁŽKU PROVÁDĚNÍ DÍLA A SKUTEČNOST, ŽE V DANÉM ÚSEKU JE STAVBA POROSTAVĚNÁ

2) NA VČERŠŠÍM KD OBJEDNATEL ZMĚNIL - UPŘESNIL ROZSAH ZAPRAVENÍ HISTORICKOU KOMUNIKACÍ A DAL POKYN ZHOTOVITELI K JEHO NAOBENĚNÍ.

ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST, ŽE MU VZNIKÁ PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ DÍLA A DOKUD NEBUDE ODSOUHLASEN ZMĚNOVÝ LIST ZAPRAVENÍ KOMUNIKACÍ A UZAVŘENÝ DODATEL NA TENTO ROZSAH NEMŮŽE ZHOTOVITEL V TĚCHTO PRÁČÍCH POKRÁČOVAT.

3) OBJEDNATEL STĚLE NEDAL POKYN K LIKVIDACI KONTAMINOVANÉ ZEMINY ZBYLÉ Z VÝSTAVBY KANALIZACE. OPĚTOVNĚ ŘÁDÍME OBJEDNATELE O SOUVČINNOST - VYDÁNÍ POKYNU JAK MÁ ZHOTOVITEL V TĚTO VĚCI POKRÁČOVAT.

## ODPOVĚD NA ZÁPIS ZHOTOVITELE ZE DNE 8.6.22

1) TDS ZAJISTI V GP TOŘADOVANOU DOKUMENTACI A OPRAVU PŘEPUSTKU NA PROPOJENÍ ØTAKY A" A "X3" TÍ K 15.6.22

2) OBJEDNATEL UPOZORŇUJE ZHOTOVITELE, ŽE MU NEVZNIKÁ PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ DÍLA, NEBOŽ MÁ BĚ POKRÝTÍM TĚCH OPRÁVACH HK VE SMYSLU SÚD DO BĚHY ODSOUHLASENÍ CENY TOŘADOVANÝCH ZMĚN.

3) OBJEDNATEL NEVÍŠI SÚVOD DÁTÍ POKYN K LIKVIDACI ZEMINY, NEBOŽ SÚVOD NEBYL SÚVODNĚNÝ NÁVRH SÚE TOŘADOVANOU K MĚŘENÍ NA DETARACI VNIKLOU OPRÁVČI

POČASÍ I DATAZEMO

PRACOVNÍCI I VHS-TLP, 4 VHS, 4 JARISTAV, 2 ŽÁKOVÁ  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: TRAKTOR BAO, NÁKLADNÍ AUTO,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZÁSYP DEŠŤOVÉ KANALIZACE, HUTNĚNÍ PO USTAVACI  
PAN FLEISIG

- FRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE STOKA „B“

- ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE STOKA „B“

- ZÁSYP CHODNÍKŮ FRÉZOVANÝM ASFALTEM

- ČERPÁNÍ VODY ČOU

8. 6. 2022

STŘEDA

POČASÍ,

PRACOVNÍCI, VHS-TLP, 4 VHS, INSTALATEŘ, 2 KK-TECHNOLOGY

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- BEDNĚNÍ A BETONÁŽ ČELA VYUŠŤNÍHO OBJEKTU V ČOU

- MONTÁŽ BOSLERU

- REVIZE ELEKTRO STAVEBNÍ ČOU

- KOPÁNÍ PÁTEK

9. 6. 2022

ČTURTEK
