Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO®

Ekologické služby

TLAK

POTE zk. 2

Obsah:

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

Test č. 22: 09.03.2022 - 14:40:57 - Obstál ve zkoušce 2

STOKA B, ŠB-7_ŠB-6

Test č. 35: 10.03.2022 - 10:16:58 - Obstál ve zkoušce 3

STOKA A, ŠA-6_ŠA-5

Test č. 62: 22.06.2022 - 12:11:21 - Obstál ve zkoušce 4

STOKA A, ŠA-5_ŠA-4

Test č. 63: 22.06.2022 - 12:37:00 - Obstál ve zkoušce 5

STOKA A, ŠA-4_ŠA-3

Test č. 64: 22.06.2022 - 12:52:01 - Obstál ve zkoušce 6

STOKA A, ŠA-3_ŠA-2

Test č. 65: 22.06.2022 - 13:14:58 - Obstál ve zkoušce 7

STOKA A, ŠA-2_ŠA-1

Test č. 66: 22.06.2022 - 13:41:10 - Obstál ve zkoušce 8

STOKA A, ŠA-1_ŠA-0

Test č. 67: 22.06.2022 - 14:01:49 - Obstál ve zkoušce 9

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA13

Test č. 68: 27.06.2022 - 11:04:53 - Obstál ve zkoušce 10

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA2-2

Test č. 69: 27.06.2022 - 11:32:58 - Obstál ve zkoušce 11

STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-3

Test č. 70: 27.06.2022 - 11:49:48 - Obstál ve zkoušce 12

STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1

Test č. 77: 27.06.2022 - 10:44:58 - Obstál ve zkoušce 13

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3

Test č. 78: 27.06.2022 - 10:09:28 - Obstál ve zkoušce 14

STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2

Test č. 79: 27.06.2022 - 10:29:53 - Obstál ve zkoušce 15

STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14

Test č. 80: 27.06.2022 - 9:41:14 - Obstál ve zkoušce 16

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-6**
K šachtě:	**ŠB2-5**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

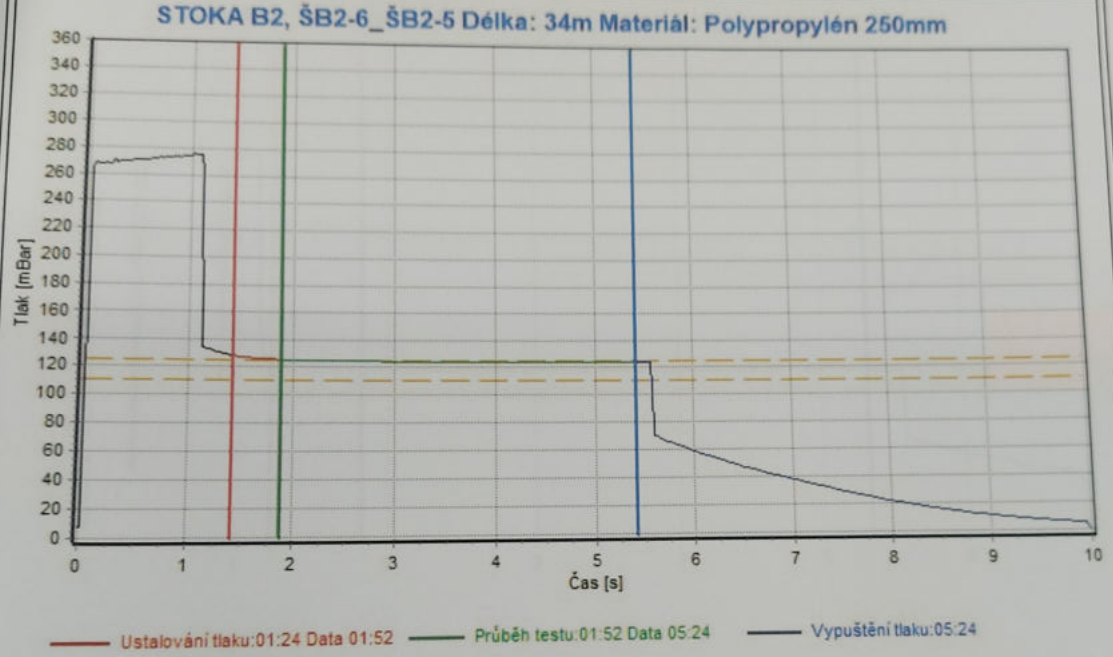

Plán:		Test č.:	**22**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**125,402 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,59 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:29 min**
Délka zkušební trati:	**34 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Zkouška byla provedena **09.03.2022** ve **14:40:58** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

CHYBÍ KAM.
CHYBÍ KAM.
ŠA 2 - ŠA1
ŠA 3 - ŠA2
ŠA4 - ŠA3
ŠA5 - ŠA4

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-7_ŠB-6**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-7**
K šachtě:	**ŠB-6**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

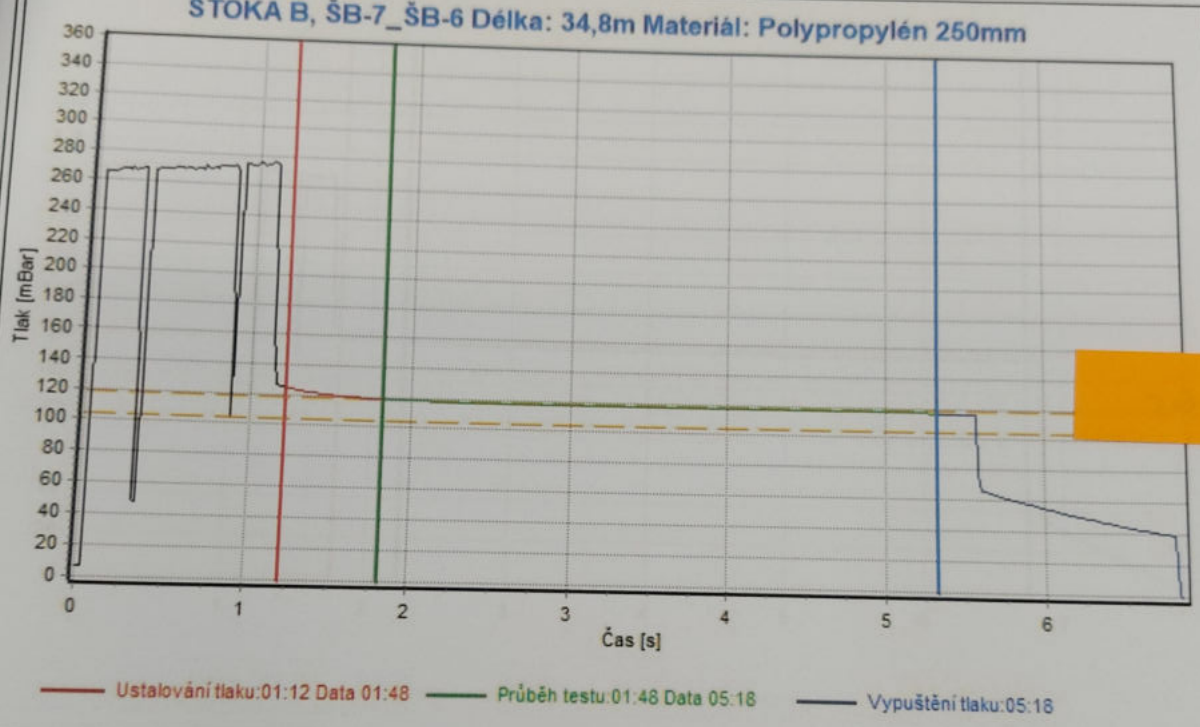

Plán:		Test č.:	**35**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**118,636 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,79 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:37 min**
Délka zkušební trati:	**34,8 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **10:16:59** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-6**
K šachtě:	**ŠA-5**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 Délka: 32,8m Materiál: Polypropylén 250mm

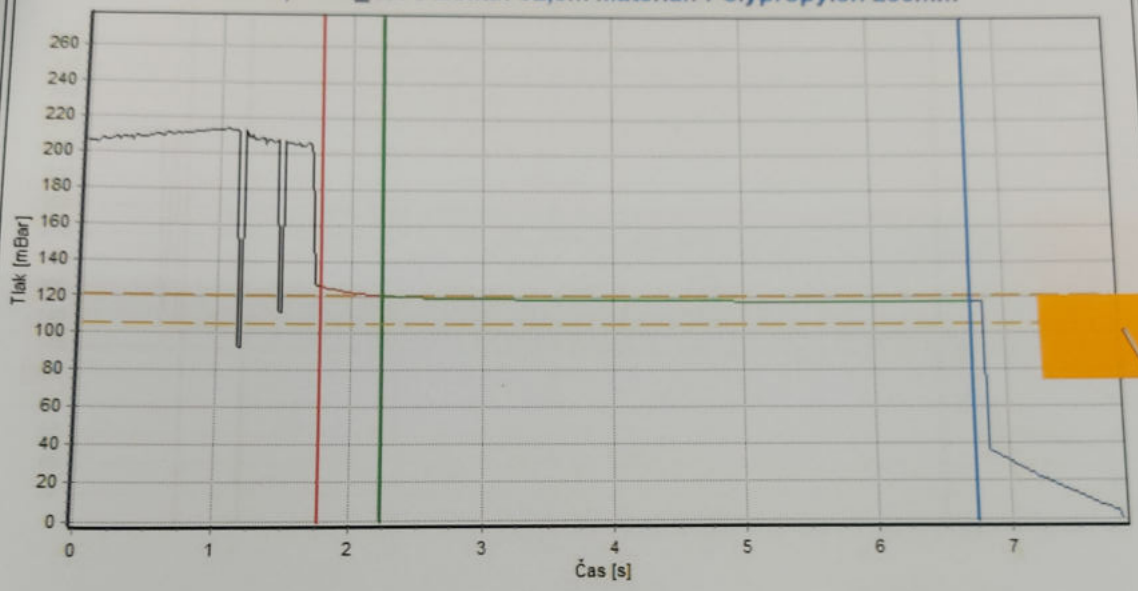

Ustalování tlaku:01:45 Data 02:12 — Průběh testu:02:12 Data 06:44 — Vypuštění tlaku:06:44

Plán:		Test č.:	**62**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**120,617 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**3,39 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:29 min**
Délka zkušební trati:	**32,8 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**4:31 min**
Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **12:11:22** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

CHYBÍ KAM.
CHYBÍ KAM.
ŠA 2 - ŠA1
ŠA 3 - ŠA2
ŠA4 - ŠA3
ŠA5 - ŠA4
ŠA6 - ŠA5

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-5_ŠA-4**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-5**
K šachtě:	**ŠA-4**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

Zkoušející:
Zkušební metoda: **CSN EN1610**
Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Třída zkoušky: **LC**
Zkouška senzoru: **30.07.2020**

STOKA A, ŠA-5_ŠA-4 Délka: 30m Materiál: Polypropylén 300mm

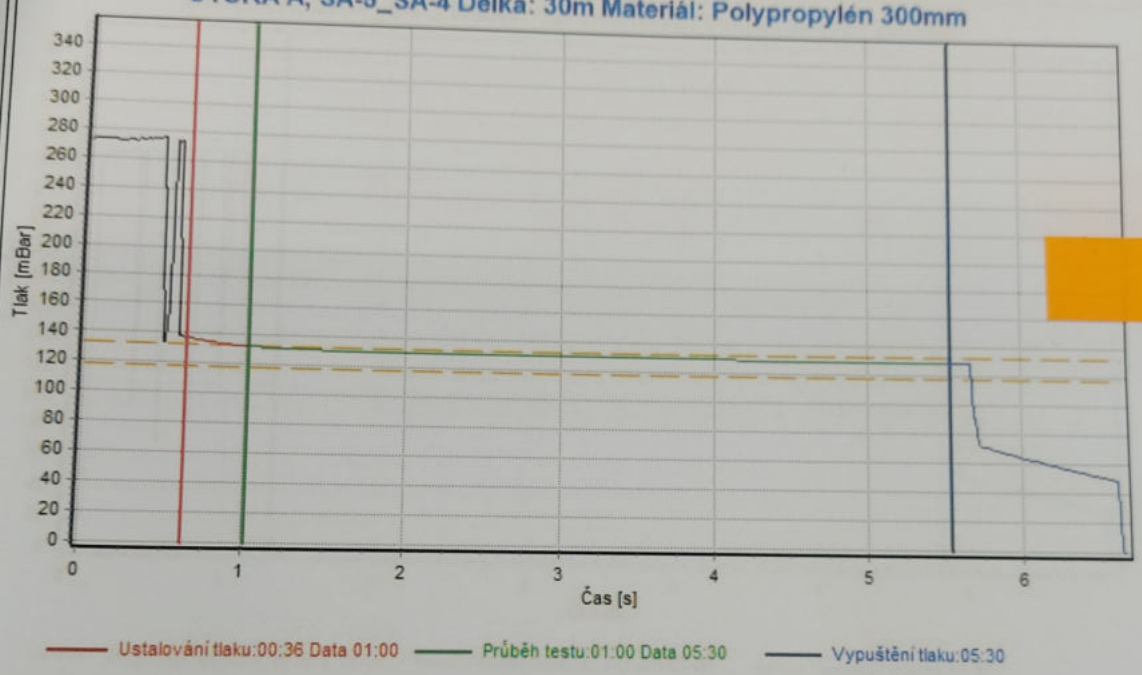

Plán:		Test č.:	**63**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**132,355 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**3 mBar**
Průměr:	**300 mm**	Doba ustálení:	**0:24 min**
Délka zkušební trati:	**30 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**4:31 min**
Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **12:37:01** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

CHYBÍ KAM.
CHYBÍ KAM.
ŠA 2 - ŠA1
ŠA 3 - ŠA2
ŠA4 - ŠA3
ŠA 5 - ŠA4

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-4_ŠA-3**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-4**
K šachtě:	**ŠA-3**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A, ŠA-4_ŠA-3 Délka: 12m Materiál: Polypropylén 300mm

Plán:		Test č.:	**64**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**110,99 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**4,91 mBar**
Průměr:	**300 mm**	Doba ustálení:	**0:13 min**
Délka zkušební trati:	**12 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**4:31 min**
Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **12:52:02** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

CHYBÍ KAM.

ŠA 2 - ŠA1

ŠA 3 - ŠA2

ŠA 4 - ŠA3

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-3_ŠA-2**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-3**
K šachtě:	**ŠA-2**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

CHYBÍ KAM.

ŠA 2 - ŠA1

ŠA 3 - ŠA2

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A, ŠA-3_ŠA-2 Délka: 29m Materiál: Polypropylén 300mm

Plán:		Test č.:	**65**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**115,948 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,55 mBar**
Průměr:	**300 mm**	Doba ustálení:	**0:45 min**
Délka zkušební trati:	**29 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**4:31 min**
Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **13:14:59** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-2_ŠA-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-2**
K šachtě:	**ŠA-1**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

CHYBÍ

ŠA 2

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A, ŠA-2_ŠA-1 Délka: 15m Materiál: Polypropylén 300mm

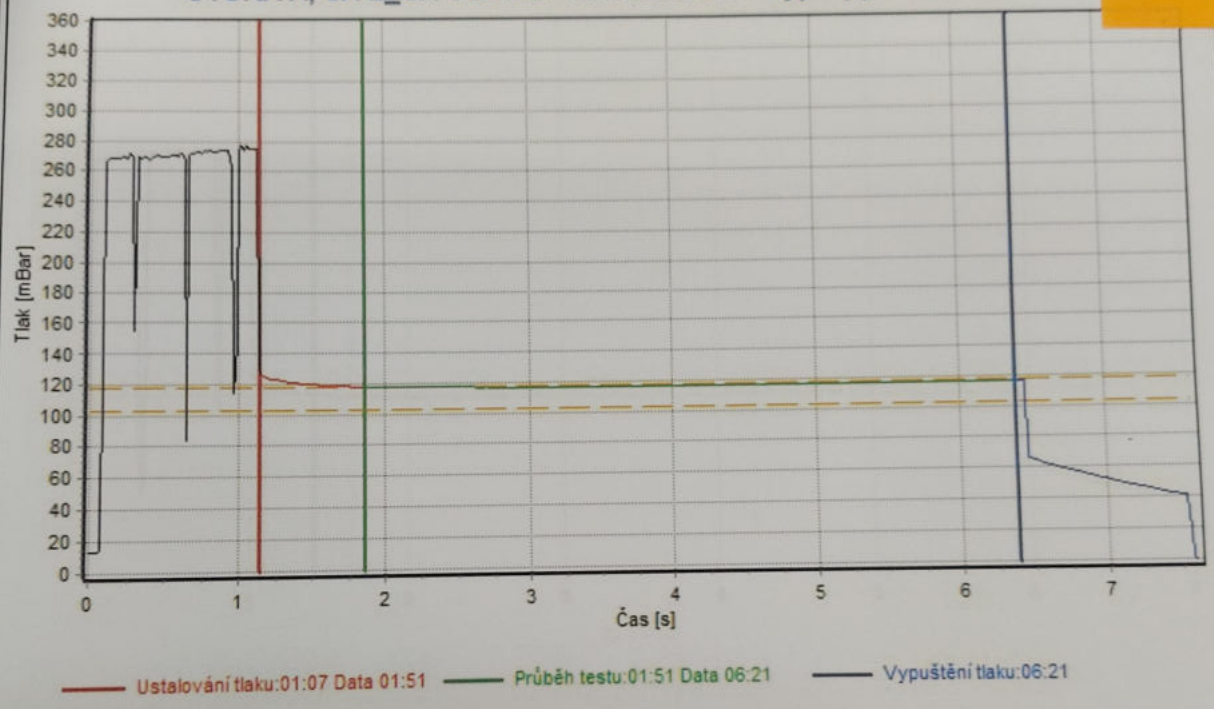

Plán:		Test č.:	**66**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**117,831 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,67 mBar**
Průměr:	**300 mm**	Doba ustálení:	**0:44 min**
Délka zkušební trati:	**15 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**4:31 min**
Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **13:41:11** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-1_ŠA-0**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-1**
K šachtě:	**ŠA-0**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VS**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A, ŠA-1_ŠA-0 Délka: 38m Materiál: Polypropylén 300mm

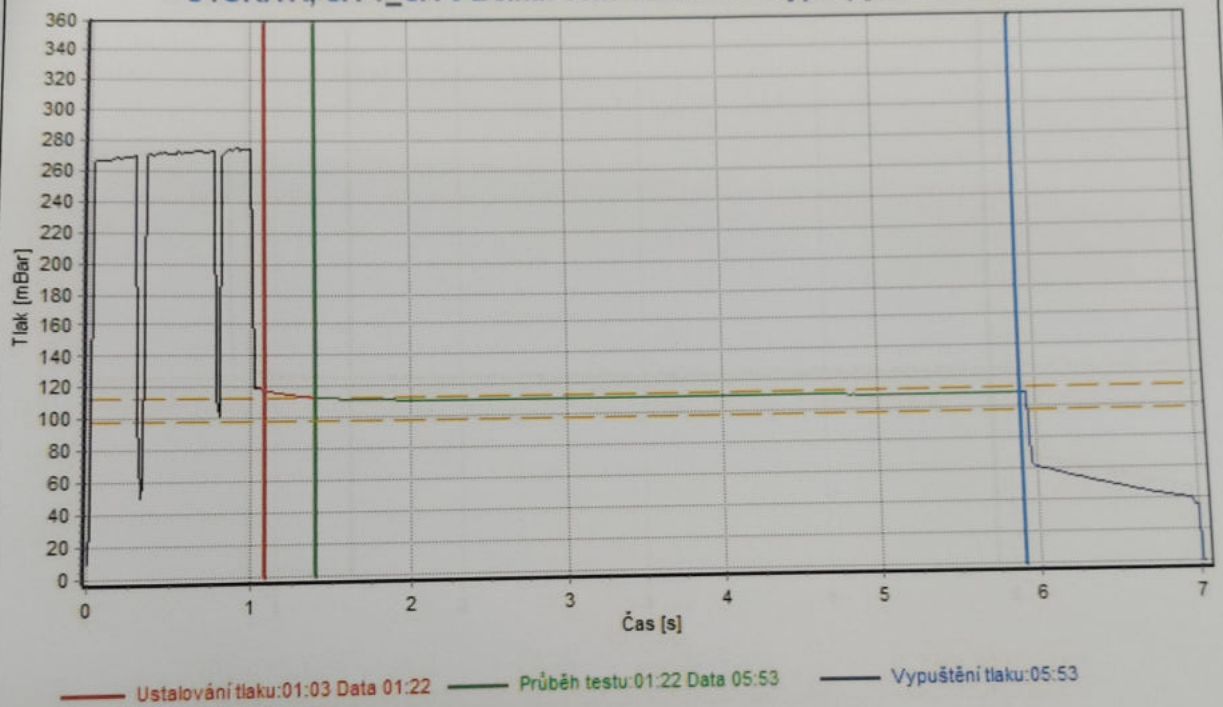

Plán:		Test č.:	**67**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**112,845 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**3,43 mBar**
Průměr:	**300 mm**	Doba ustálení:	**0:20 min**
Délka zkušební trati:	**38 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**4:31 min**
Zkouška byla provedena **22.06.2022** ve **14:01:50** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**4:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A2, ŠA2-1_ŠA13**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA2-1**
K šachtě:	**ŠA-13**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1-1**

Zkoušející:		Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA13 Délka: 9,5m Materiál: Polypropylén 250mm

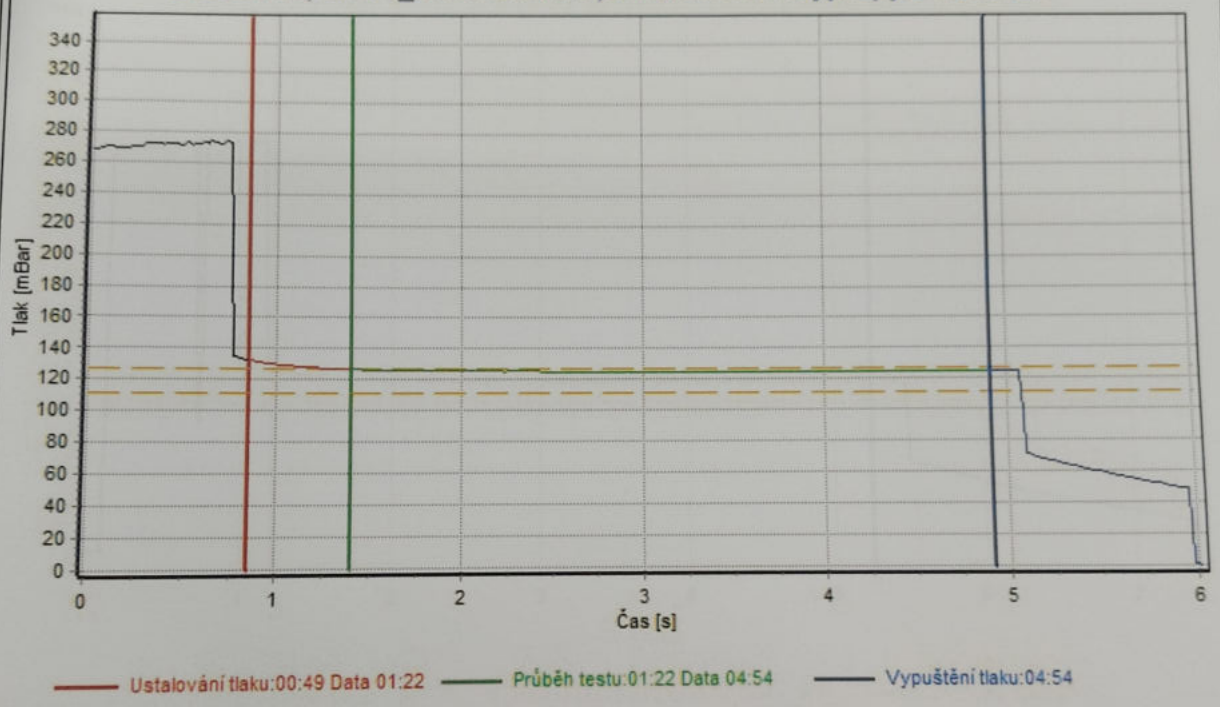

Plán:		Test č.:	**68**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**126,234 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**2,03 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:34 min**
Délka zkušební trati:	**9,5 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **11:04:54** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A2, ŠA2-1_ŠA2-2**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA2-1**
K šachtě:	**ŠA2-2**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA 2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A2, ŠA2-1_ŠA2-2 Délka: 43,4m Materiál: Polypropylén 250mm

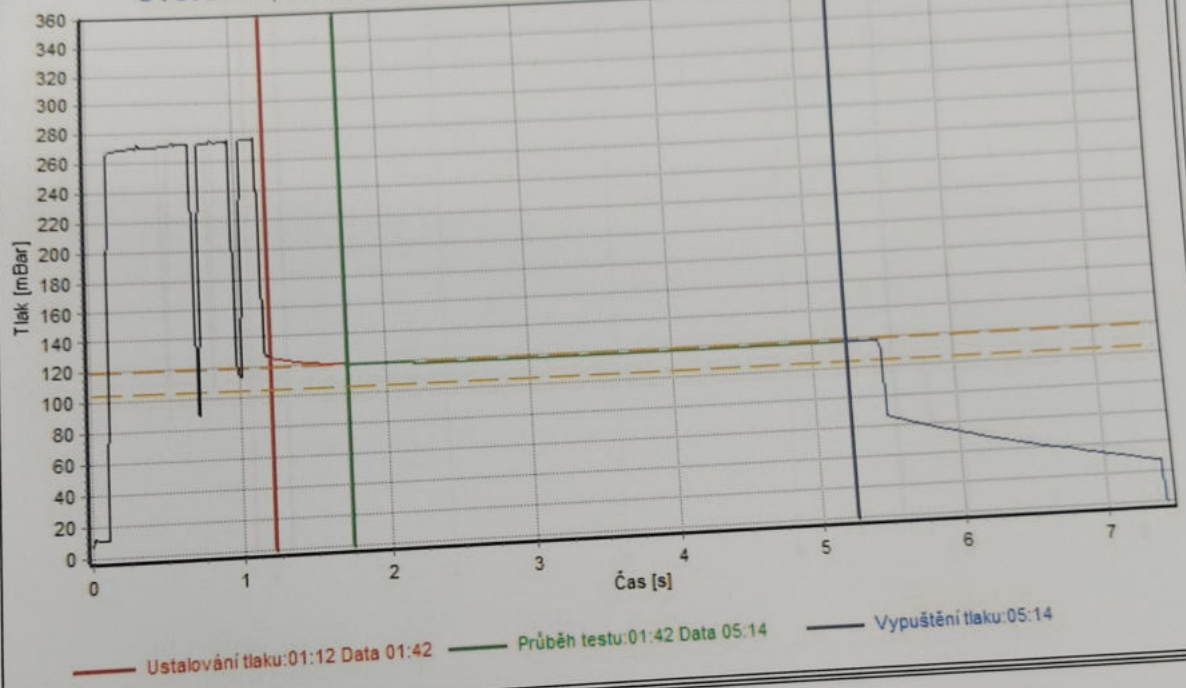

Plán:		Test č.:	**69**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**119,75 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
		Skutečná ztráta:	**2,13 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Doba ustálení:	**0:32 min**
Průměr:	**250 mm**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Délka zkušební trati:	**43,4 m**	Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **11:32:59** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-3**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA2-2**
K šachtě:	**ŠA2-3**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA 2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA A2, ŠA2-2_ŠA2-3 Délka: 17,7m Materiál: Polypropylén 250mm

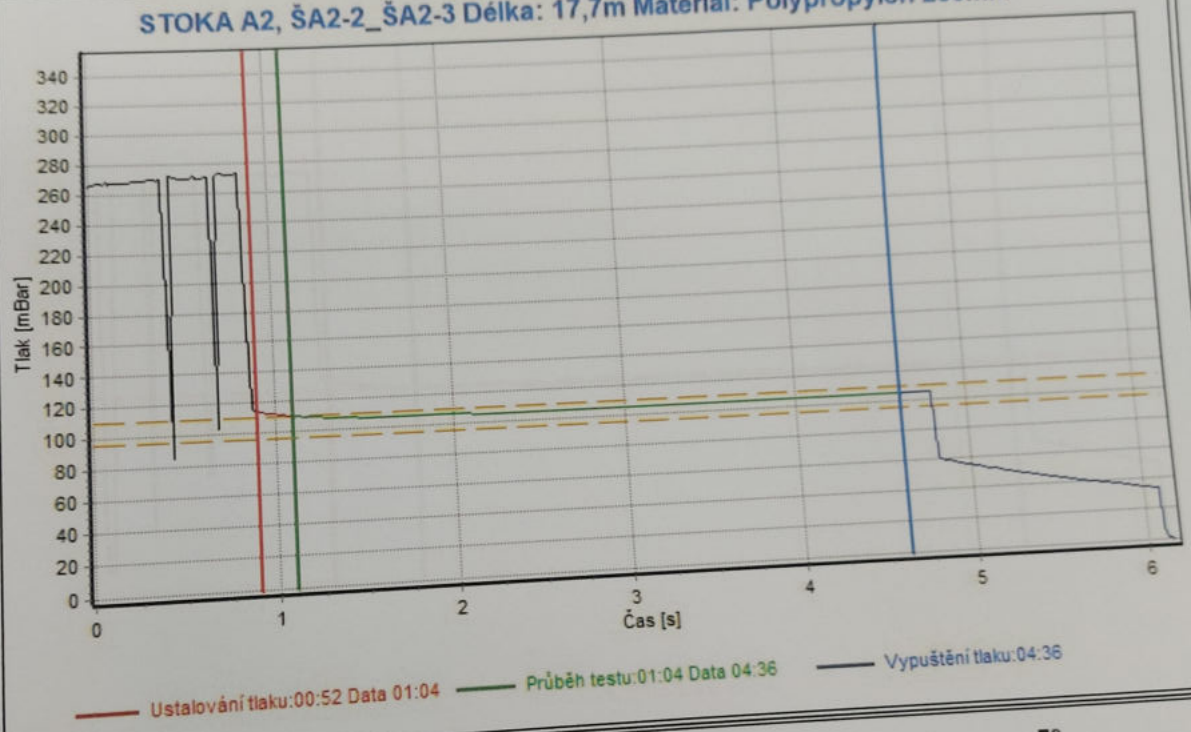

Plán:		Test č.:	70
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**110,729 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**4,92 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:13 min**
Délka zkušební trati:	**17,7 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **11:49:49** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-2**
K šachtě:	**ŠB2-1**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1 Délka: 41,3m Materiál: Polypropylén 250mm

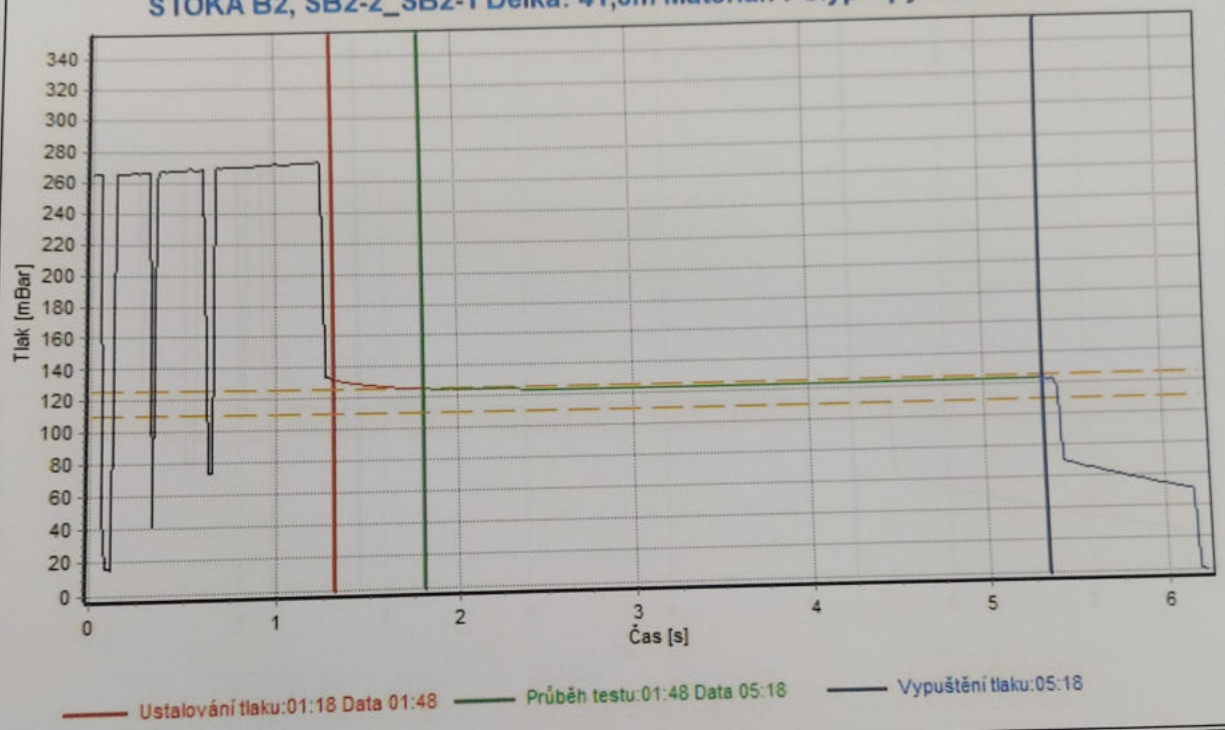

Plán:		Test č.:	**77**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**125,3 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
		Skutečná ztráta:	**2,43 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Doba ustálení:	**0:31 min**
Průměr:	**250 mm**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Délka zkušební trati:	**41,3 m**	Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **10:44:59** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-4**
K šachtě:	**ŠB2-3**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 Délka: 27,5m Materiál: Polypropylén 250mm

Plán:		Test č.:	78
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**113,066 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
		Skutečná ztráta:	**1,88 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Doba ustálení:	**0:36 min**
Průměr:	**250 mm**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Délka zkušební trati:	**27,5 m**	Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **10:09:29** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crna

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-3**
K šachtě:	**ŠB2-2**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2 Délka: 19,4m Materiál: Polypropylén 250mm

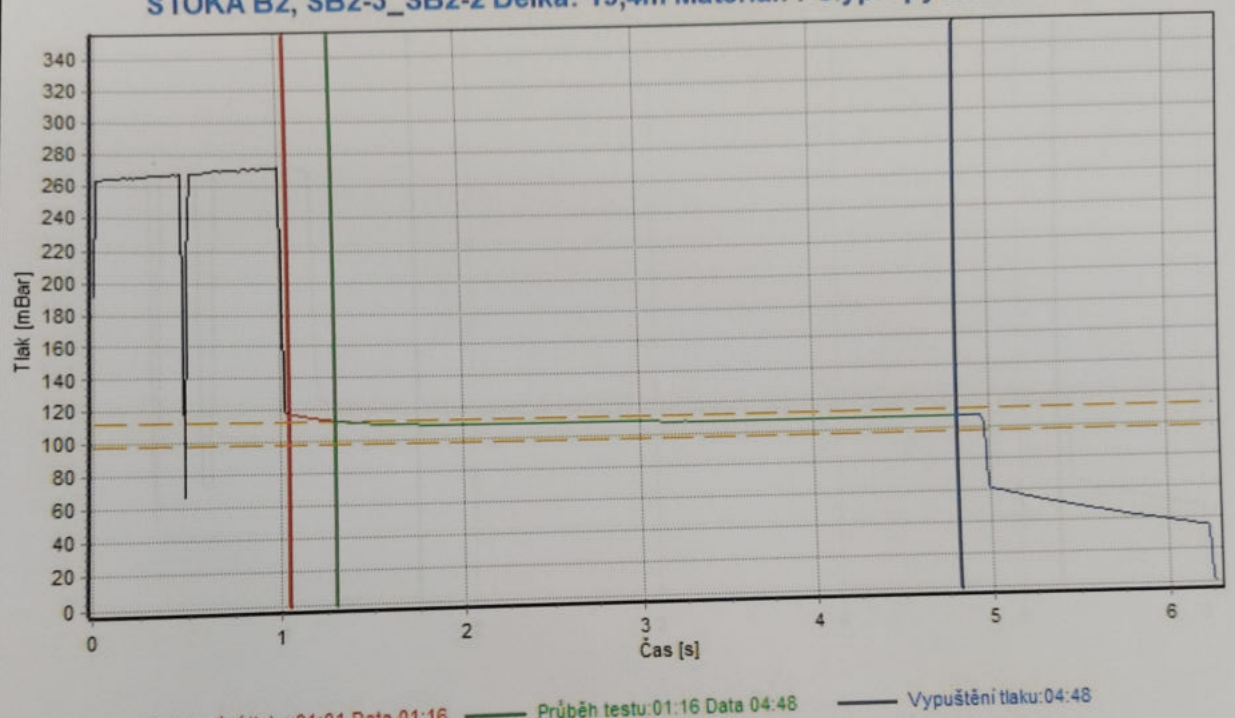

Plán:		Test č.:	79
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**112,339 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
		Skutečná ztráta:	**4,68 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Doba ustálení:	**0:16 min**
Průměr:	**250 mm**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Délka zkušební trati:	**19,4 m**	Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **10:29:54** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crna

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-15**
K šachtě:	**ŠB-14**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14 Délka: 37,7m Materiál: Polypropylén 250mm

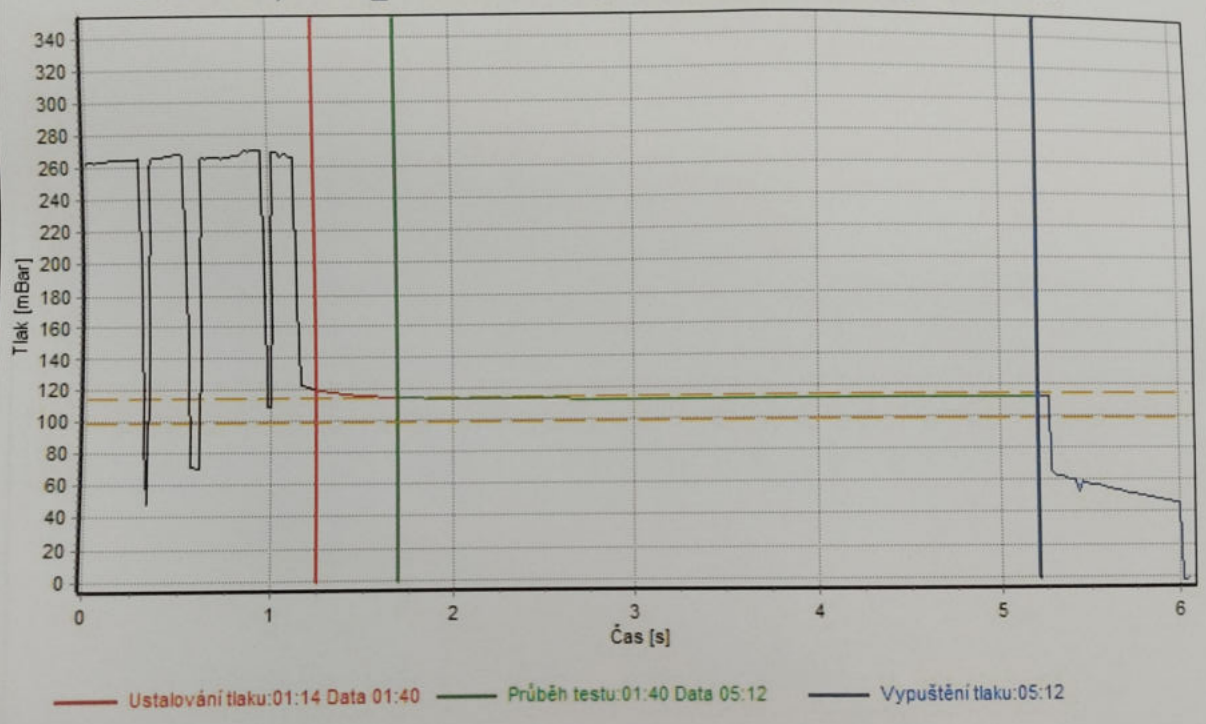

Plán:		Test č.:	8[illegible]
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**114,453 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**2,38 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:28 min**
Délka zkušební trati:	**37,7 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **27.06.2022** ve **9:41:15** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crna

Souhrn

Testované úseky celkem: **15** o celkové délce: **422,1 m.**

Otestováno **15** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **422,1 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Pro:

!mos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Vypracoval:

Zákazník:

Dodavatel:

.....

.....

Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO®

Ekologické služby

Obsah:

STOKA B1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1 2
Test č. 1: 10.02.2022 - 9:15:07 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2 3
Test č. 2: 10.02.2022 - 9:32:37 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3 4
Test č. 3: 10.02.2022 - 9:42:28 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4 5
Test č. 4: 10.02.2022 - 10:03:57 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5 6
Test č. 5: 10.02.2022 - 10:27:18 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7 7
Test č. 6: 10.02.2022 - 10:46:51 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8 8
Test č. 7: 11.02.2022 - 11:01:27 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-1_ŠA11 9
Test č. 8: 11.02.2022 - 11:31:45 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-2_ŠA1-1 10
Test č. 9: 11.02.2022 - 11:52:32 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-3_ŠA1-2 11
Test č. 10: 11.02.2022 - 12:12:34 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3 12
Test č. 11: 11.02.2022 - 12:32:53 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4 13
Test č. 12: 11.02.2022 - 12:52:03 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-6_ŠA1-5 14
Test č. 13: 11.02.2022 - 13:18:08 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6 15
Test č. 14: 11.02.2022 - 13:42:34 - Obstál ve zkoušce
STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7 16
Test č. 15: 11.02.2022 - 14:11:31 - Obstál ve zkoušce
STOKA A, ŠA-10_ŠA-11 17
Test č. 17: 10.02.2022 - 12:21:54 - Obstál ve zkoušce
STOKA A, ŠA-10_ŠA-9 18
Test č. 18: 10.02.2022 - 12:46:49 - Obstál ve zkoušce
STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1 19
Test č. 19: 10.02.2022 - 13:16:42 - Obstál ve zkoušce
STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1 20
Test č. 20: 10.02.2022 - 13:41:37 - Obstál ve zkoušce
STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3 21
Test č. 21: 10.02.2022 - 14:01:12 - Obstál ve zkoušce

Projekt:

EZAKO
Ekologické služby

koušející: Marek Matys
kušební metoda: CSN EN1610
enzor: 2TLK0061

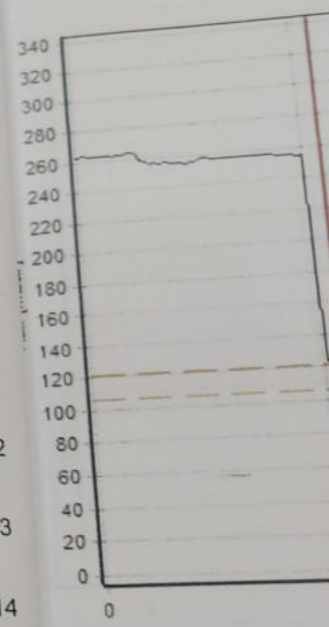

Ustalování tlaku

án:
ateriál: Polypro
itřní ochrana: Žádná
ofil potrubí: Kruho
ůměr: 250 m
lka zkušební trati: 4
ouška byla proveden
známka:
ýsledek: Obs
kazník:

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB1-6**
K šachtě:	**ŠB1-1-1**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1-1**

koušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
kušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
enzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

lán:		Test č.:	**1**
laterial:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
nitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**121,056 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
rofil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,68 mBar**
růměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:27 min**
élka zkušební trati:	**42,8 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
kouška byla provedena **10.02.2022** ve **9:15:08** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

oznámka:

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB1-3**
K šachtě:	**ŠB1-2**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1-1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

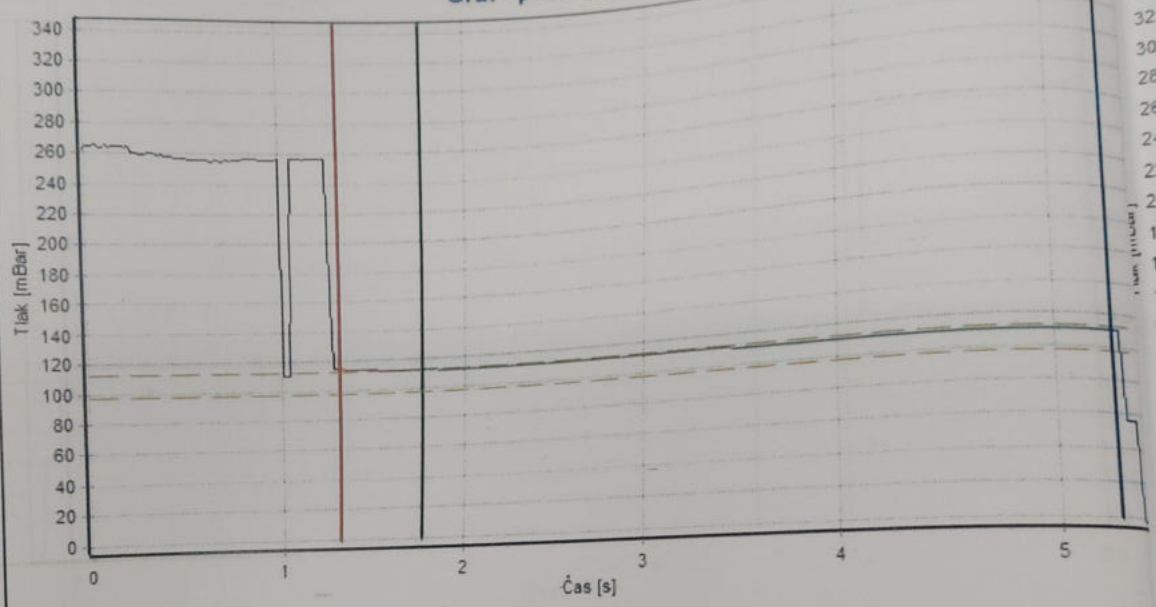

Plán:		Test č.:	**2**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**112,182 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,68 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:28 min**
Délka zkušební trati:	**49,5 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.02.2022** ve **9:32:38** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**
Poznámka:			

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB1-4**
K šachtě:	**ŠB1-3**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

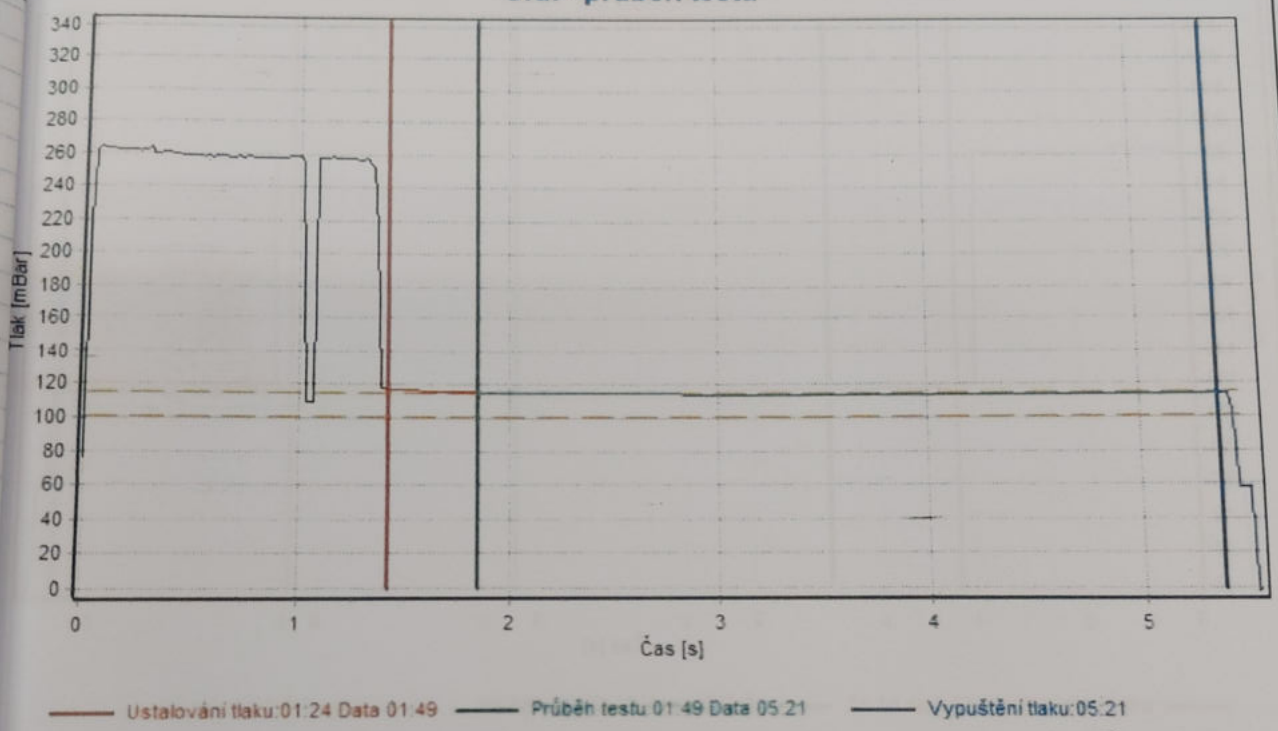

Plán:		Test č.:	**3**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**115,671 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,77 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:27 min**
Délka zkušební trati:	**27,2 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.02.2022** ve **9:42:29** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB1-5
K šachtě:	ŠB1-4
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B1

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

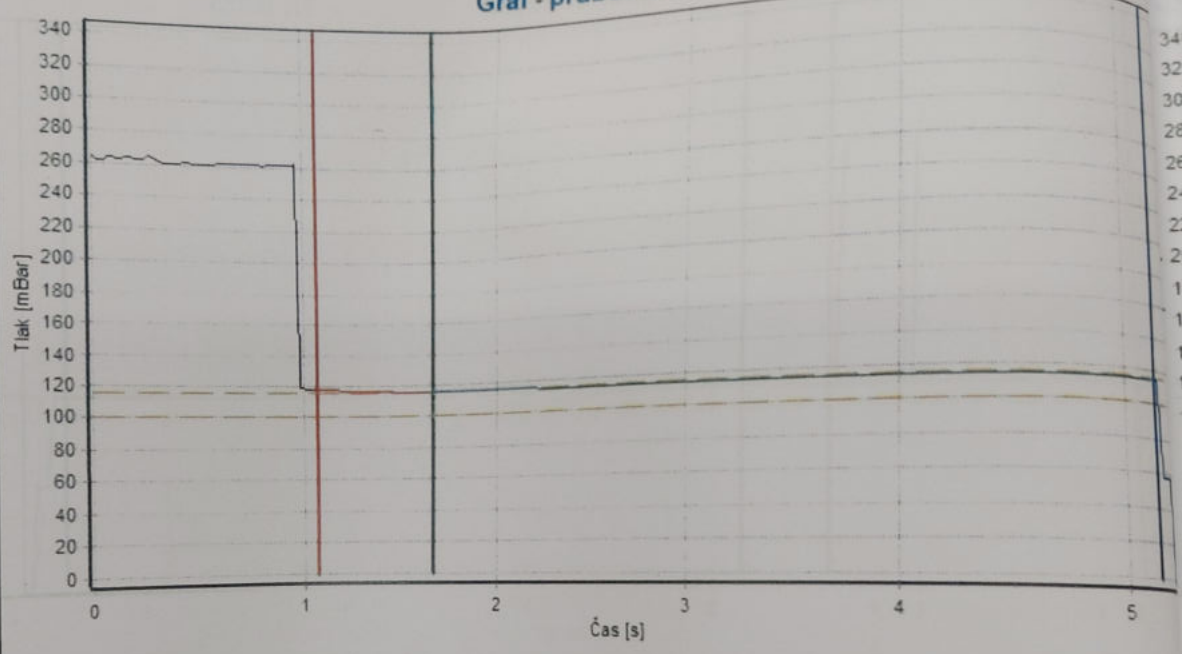

Plán:		Test č.:	4
Materiál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Vnitřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	115,694 mBar
		Přípustná ztráta:	15 mBar
Profil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	1,53 mBar
Průměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:36 min
Délka zkušební trati:	25,5 m	Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Zkouška byla provedena **10.02.2022** ve **10:03:58** hodin.

Poznámka:

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5**
Oblast:	
Od šachty:	**ŠB1-6**
K šachtě:	**ŠB1-5**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

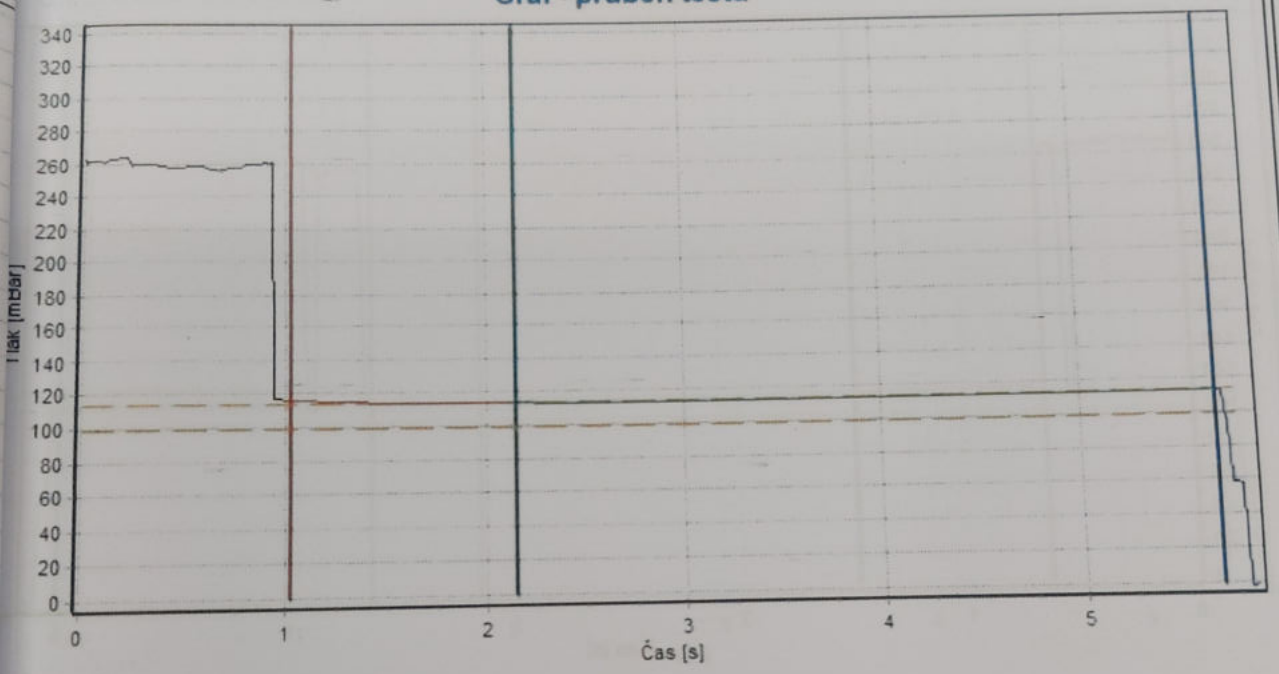

Plán:		Test č.:	**5**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**113,556 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,03 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**1:8 min**
Délka zkušební trati:	**40,8 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.02.2022** ve **10:27:19** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB1-6
K šachtě:	ŠB1-7
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B1

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

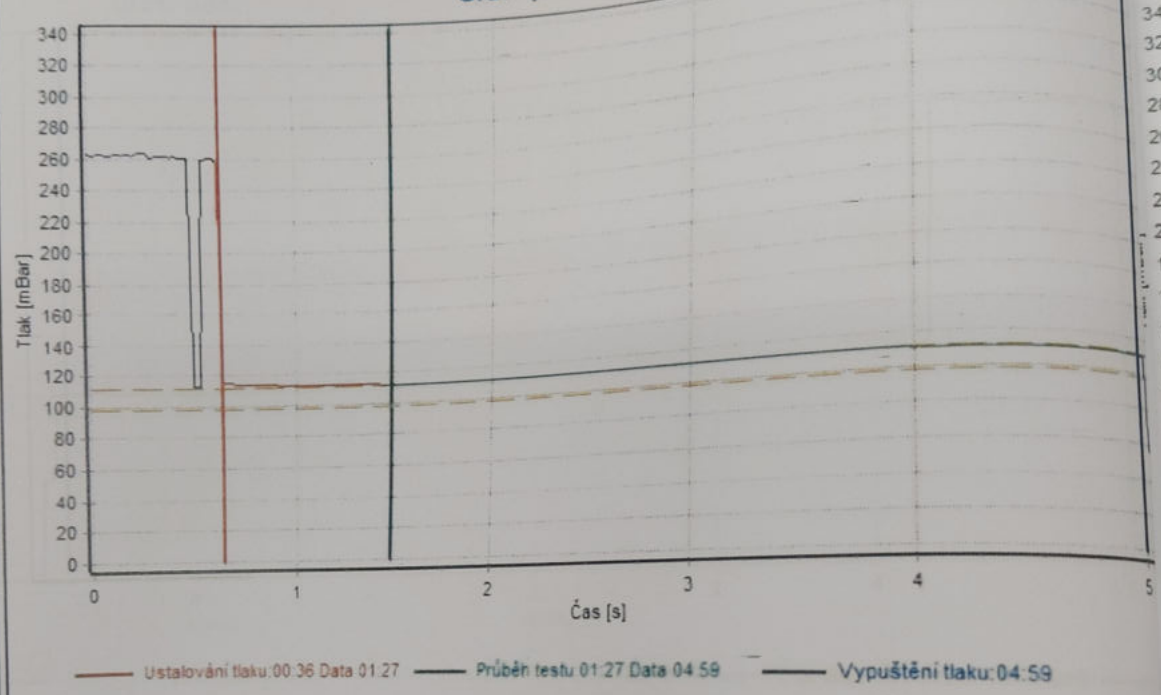

Plán:		Test č.:	6
Materiál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Vnitřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	112,289 mBar
		Přípustná ztráta:	15 mBar
Profil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	1,25 mBar
Průměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:52 min
Délka zkušební trati:	7,1 m	Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Zkouška byla provedena 10.02.2022 ve 10:46:52 hodin.		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min
Poznámka:			

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB1-7**
K šachtě:	**ŠB1-8**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

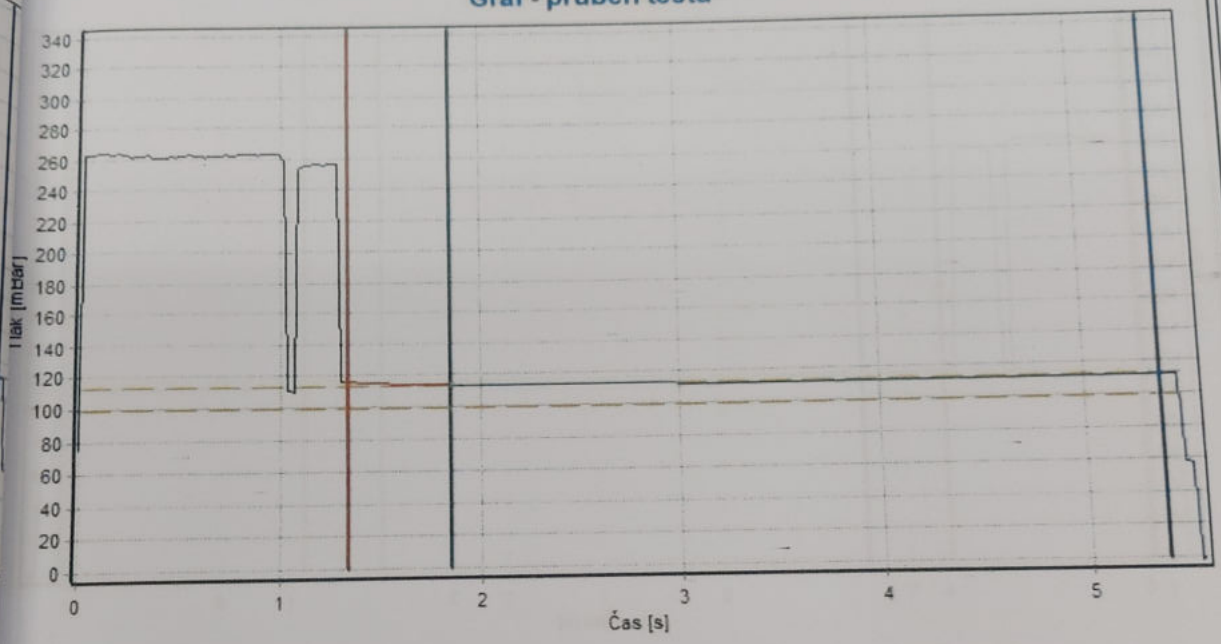

Plán:		Test č.:	**7**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**113,51 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,76 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:32 min**
Délka zkušební trati:	**40 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **11:01:28** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A1, ŠA1-1_ŠA11
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA1-1
K šachtě:	ŠA11
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA A1

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

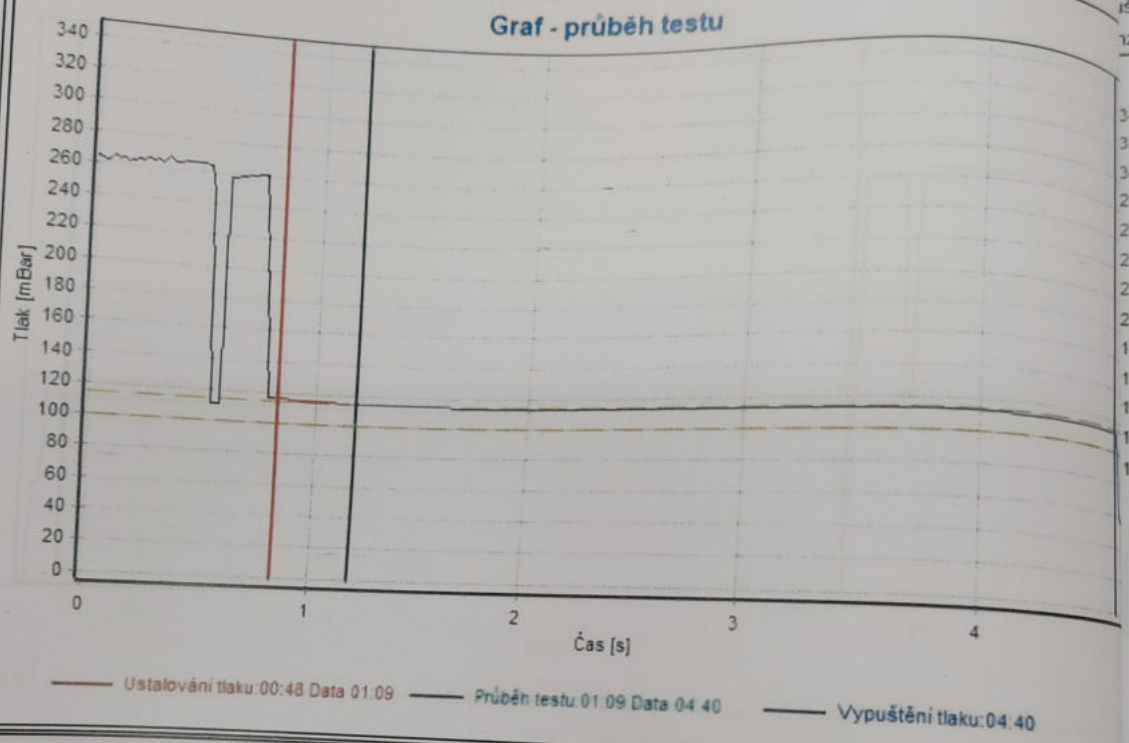

Plán:			
Materiál:	Polypropylén	Test č.:	8
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
		Počáteční přetlak:	114,625 mBar
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBar
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	2,03 mBar
Délka zkušební trati:	14,3 m	Doba ustálení:	0:22 min
Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **11:31:46** hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A1, ŠA1-2_ŠA1-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA1-2**
K šachtě:	**ŠA1-1**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A1**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

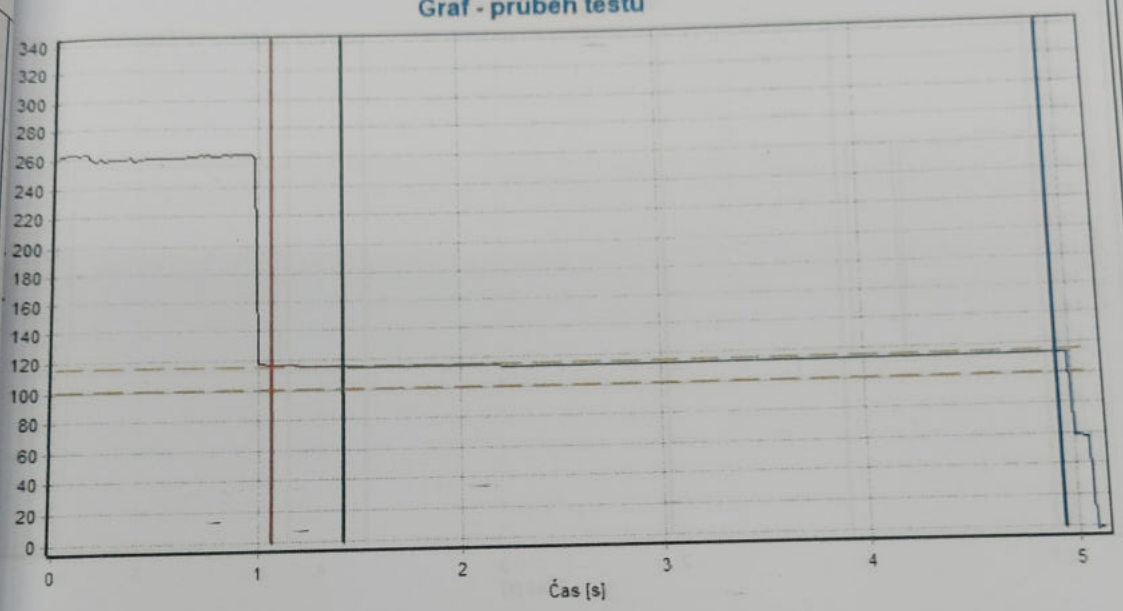

Test č.:	**9**
Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Počáteční přetlak:	**115,298 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**2,07 mBar**
Doba ustálení:	**0:22 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

ián:	
ateriál:	**Polypropylén**
nitřní ochrana:	**Žádná**
rofil potrubí:	**Kruhový**
růměr:	**250 mm**
élka zkušební trati:	**21,2 m**

kouška byla provedena **11.02.2022** ve **11:52:33** hodin.

oznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

ákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
ekologické služby

Název úseku:	STOKA A1, ŠA1-3_ŠA1-2
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA1-3
K šachtě:	ŠA1-2
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA A1

Zkoušející:	Marek Matys		
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Senzor:	2TLK0061	Třída zkoušky:	LC
		Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

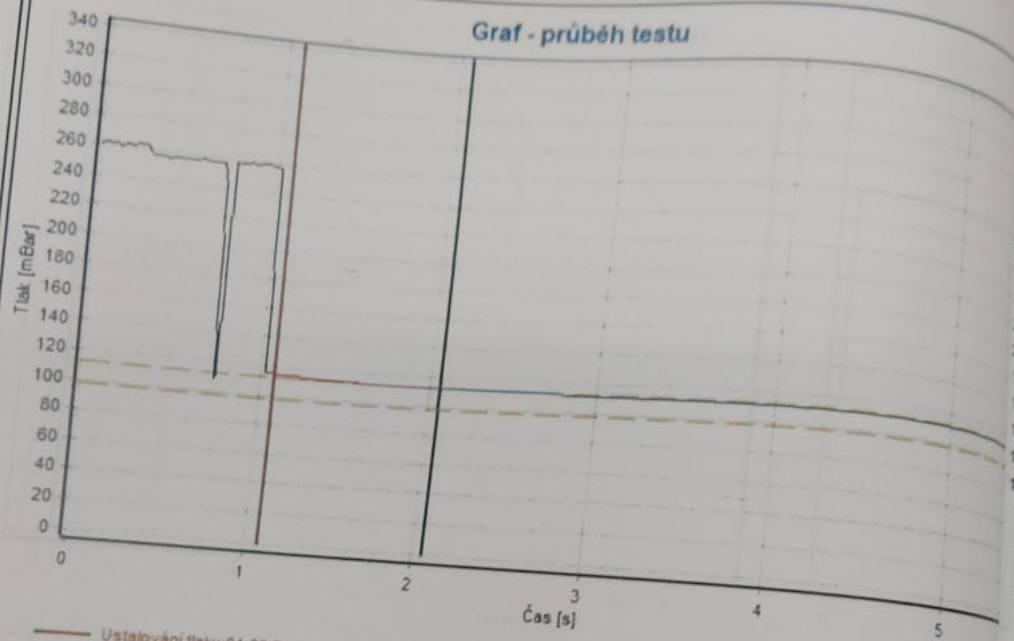

Plán:			
Materiál:	Polypropylén	Test č.:	10
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
		Počáteční přetlak:	112,406 mBar
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBar
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	1,14 mBar
Délka zkušební trati:	16,9 m	Doba ustálení:	0:60 min
Zkouška byla provedena 11.02.2022 ve 12:12:35 hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a

SEZAKO
ekologické služby

Název úseku	
Oblast:	
Od šachty:	
K šachtě:	
Stanoviště:	
Město:	
Ulice:	

ušející:	Marek Matys
šební metoda:	CSN EN1610
nzor:	2TLK0061

Gr

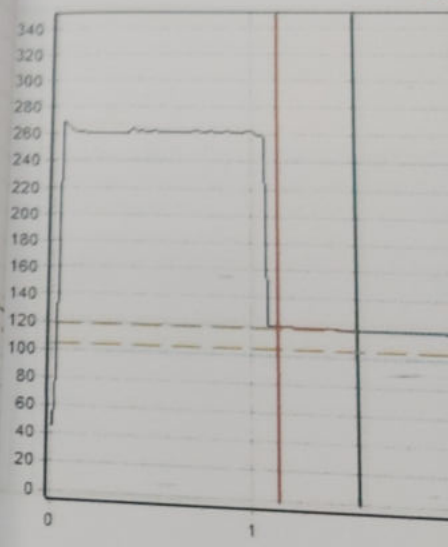

ln:	
teriál:	Polypropylén
itřní ochrana:	Žádná
ofil potrubí:	Kruhový
ůměr:	250 mm
lka zkušební trati:	0 m
ouška byla provedena 11.02.2022 ve 12:32:	
známka:	

ýsledek: **Obstál ve zkoušce**

ákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brn

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA1-4**
K šachtě:	**ŠA1-3**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

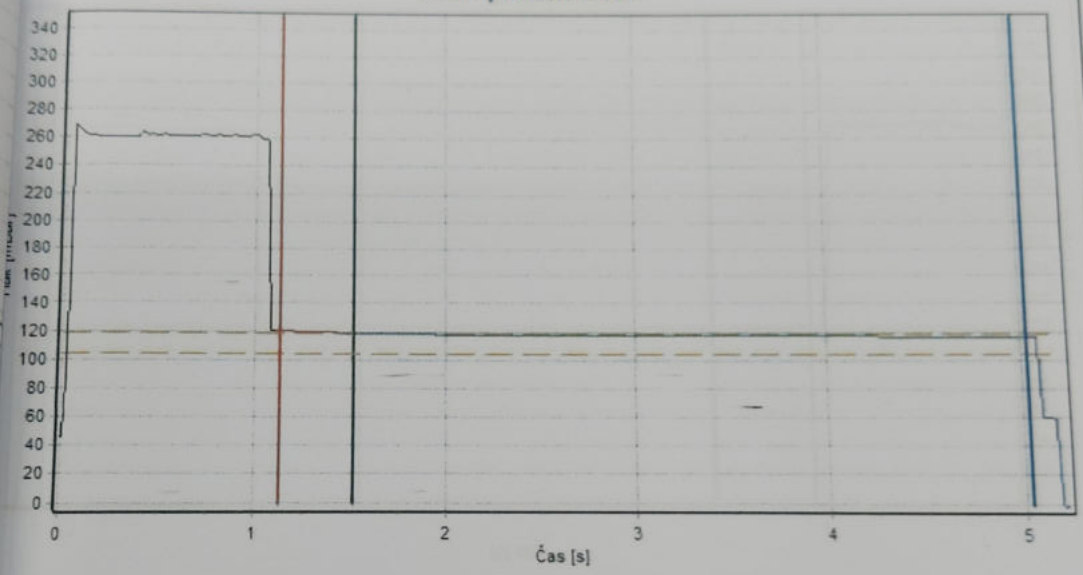

Plán:		Test č.:	**11**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**118,605 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**2,09 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:24 min**
Délka zkušební trati:	**0 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **12:32:54** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA1-5**
K šachtě:	**ŠA1-4**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

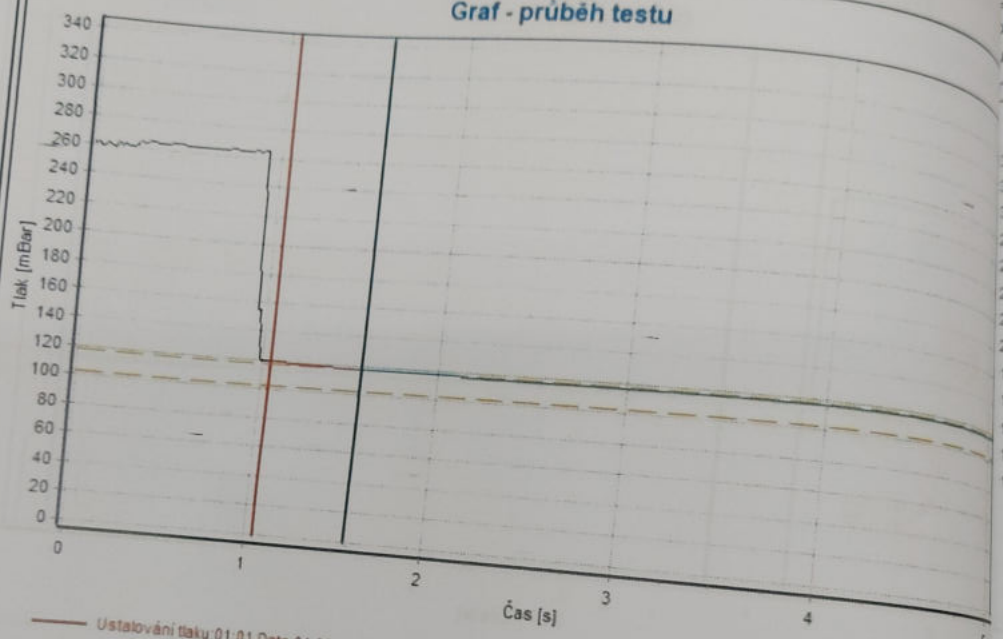

Plán:
Materiál: **Polypropylén**
Vnitřní ochrana: **Žádná**

Profil potrubí: **Kruhový**
Průměr: **250 mm**
Délka zkušební trati: **26,1 m**
Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **12:52:04** hodin.
Poznámka:

Test č.:	**12**
Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Počáteční přetlak:	**117,837 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**1,68 mBar**
Doba ustálení:	**0:32 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno
EZAKO
Ekologické služby
Název úsek
Oblast:
Od šachty:
K šachtě:
Stanoviště:
Město:
Ulice:
ušející: Marek Matys
šební metoda: CSN EN1610
nzor: 2TLK0061
Ustalování tlaku:01:04 Data 01:30
án:
ateriál: Polypropylén
itřní ochrana: Žádná
ofil potrubí: Kruhový
ůměr: 250 mm
élka zkušební trati: 24,7 m
ouška byla provedena 11.02.2022 ve 13
oznámka:
ýsledek: Obstál ve zkouš
ákazník:
Imos Brno a.s., 6270

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A1, ŠA1-6_ŠA1-5**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA1-6**
K šachtě:	**ŠA1-5**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

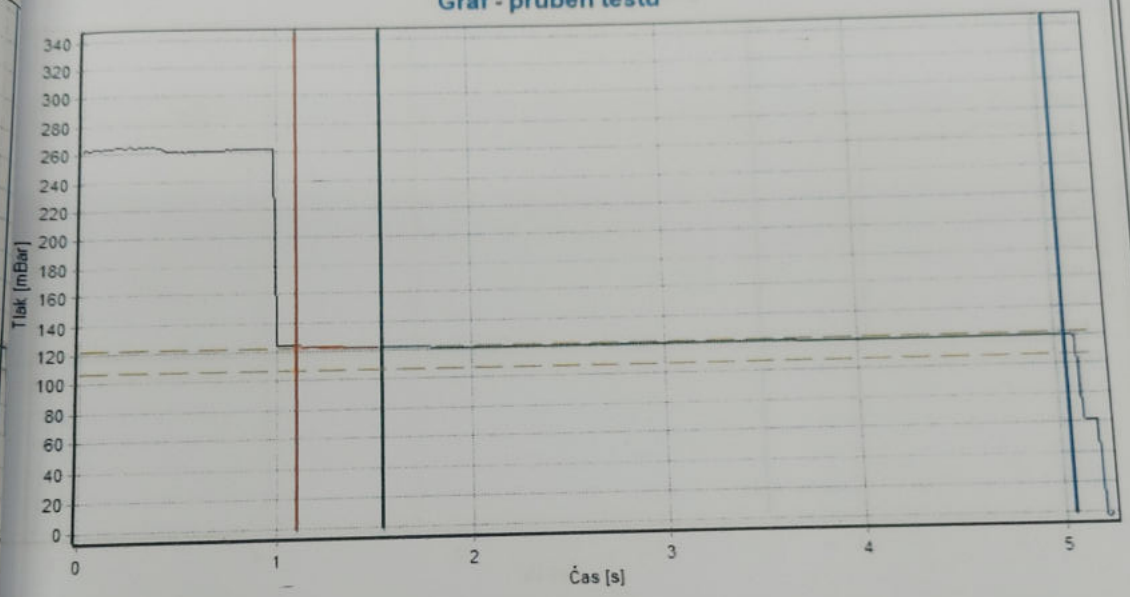

Ustalování tlaku:01:04 Data 01:30 — Průběh testu:01:30 Data 05:01 — Vypuštění tlaku:05:01

Plán:	
Materiál:	**Polypropylén**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**
Profil potrubí:	**Kruhový**
Průměr:	**250 mm**
Délka zkušební trati:	**24,7 m**

Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **13:18:09** hodin.

Poznámka:

Test č.:	**13**
Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Počáteční přetlak:	**122,149 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**1,94 mBar**
Doba ustálení:	**0:27 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA1-7**
K šachtě:	**ŠA1-6**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

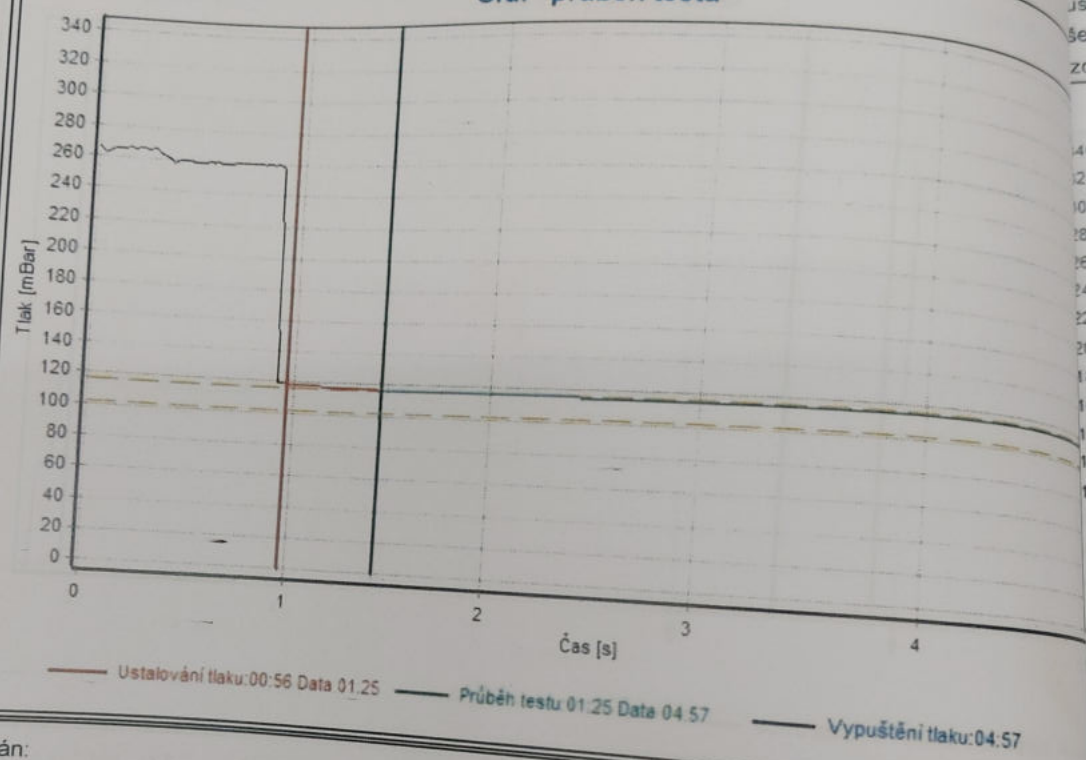

Plán:		Test č.:	**14**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**116,552 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,91 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:30 min**
Délka zkušební trati:	**27,3 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **13:42:35** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**
Poznámka:			

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos
SEZAKO
Ekologické služby
Marek Matys
CSN EN1610
2TLK0061
Ustalování tlaku:01:00 Da
Polypropylén
Žádná
Kruhový
250 mm
40,3 m
Obstál v
Imos Brn

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA1-8**
K šachtě:	**ŠA1-7**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A1**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

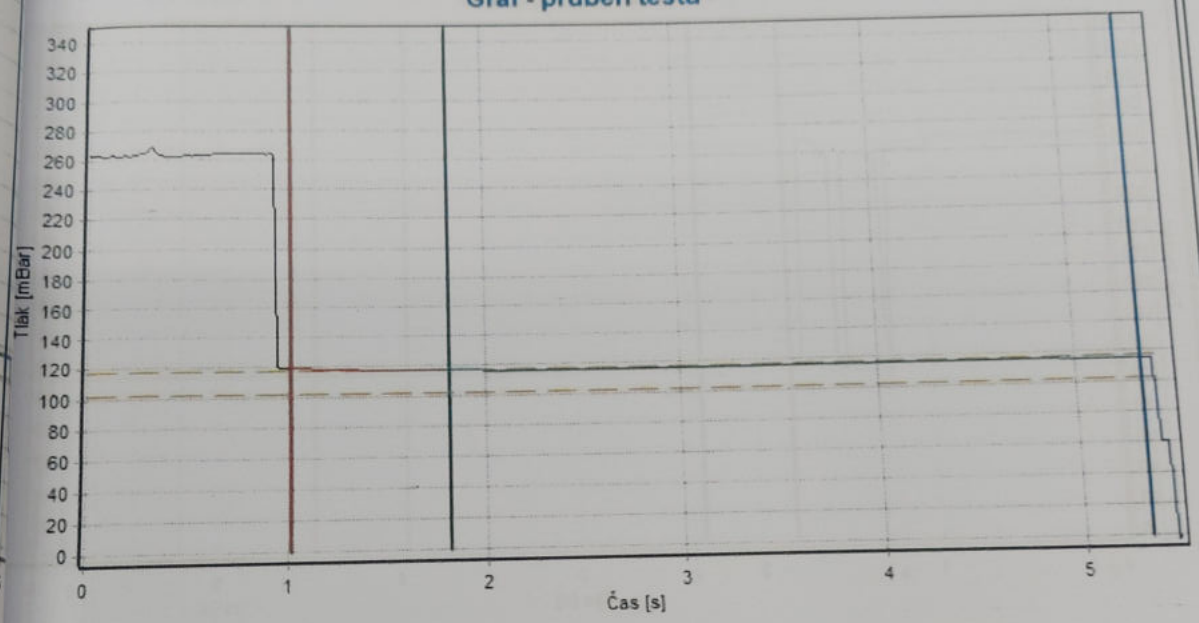

Plán:		Test č.:	**15**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**116,704 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,37 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:49 min**
Délka zkušební trati:	**40,3 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **11.02.2022** ve **14:11:32** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A, ŠA-10_ŠA-11
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA-10
K šachtě:	ŠA-11
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA A

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

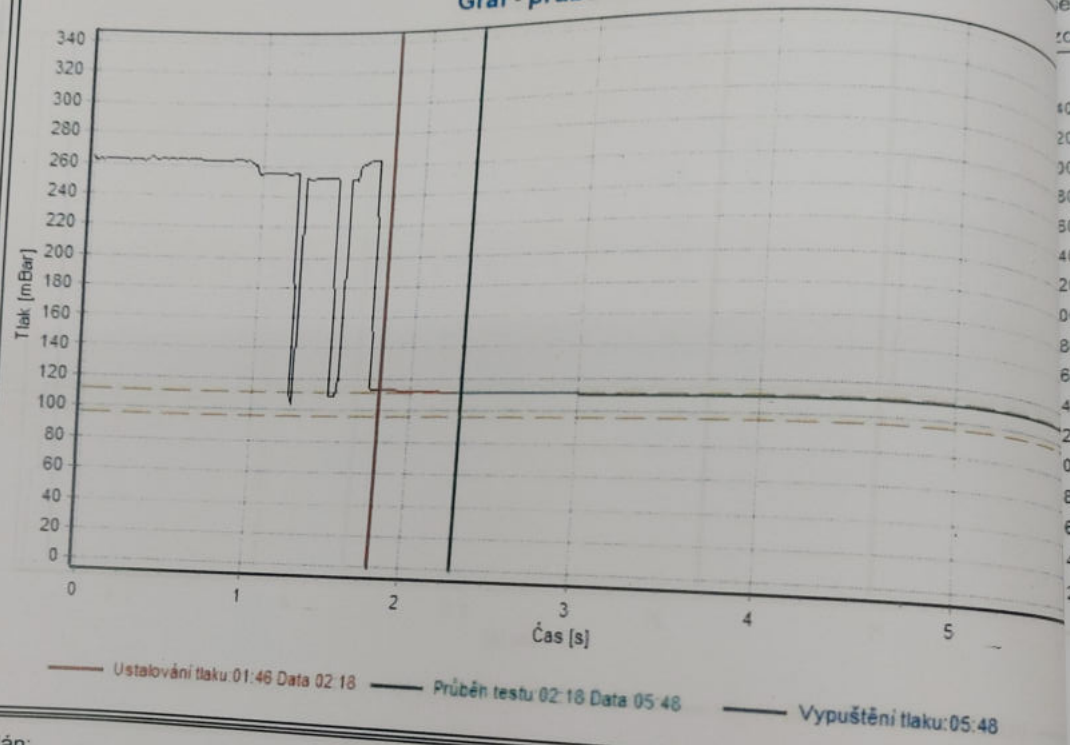

Plán:

Materiál: **Polypropylén**

Vnitřní ochrana: **Žádná**

Profil potrubí: **Kruhový**

Průměr: **250 mm**

Délka zkušební trati: **28,5 m**

Zkouška byla provedena **10.02.2022** ve **12:21:55** hodin.

Poznámka:

Test č.:	17
Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Počáteční přetlak:	111,261 mBar
Přípustná ztráta:	15 mBar
Skutečná ztráta:	1,6 mBar
Doba ustálení:	0:32 min
Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno

SEZAKO
Ekologické služby

Název úse
Oblast:
Od šachty
K šachtě:
Stanovišt
Město:
Ulice:

Marek Matys
CSN EN1610
2TLK0061

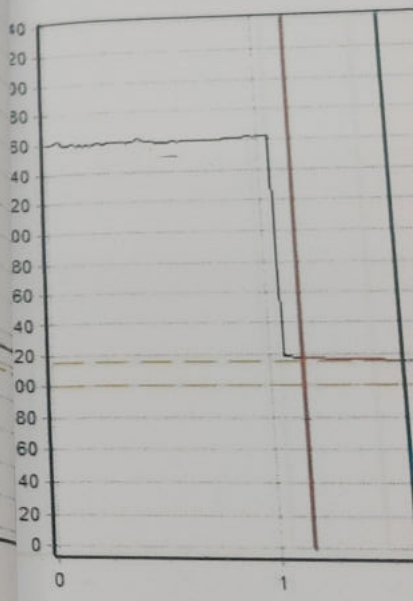

Polypropylén
Žádná
Kruhový
250 mm
ka zkušební trati: 30,25 m
uška byla provedena 10.02.2022
námka:

sledek: Obstál ve zk
azník:
Imos Brno a.s.,

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-10_ŠA-9**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-10**
K šachtě:	**ŠA-9**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

án:		Test č.:	**18**
ateriál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
nitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**115,584 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
		Skutečná ztráta:	**1,77 mBar**
rofil potrubí:	**Kruhový**	Doba ustálení:	**0:28 min**
růměr:	**250 mm**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
élka zkušební trati:	**30,25 m**	Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

kouška byla provedena **10.02.2022** ve **12:46:50** hodin.

oznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákaznik: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA-10
K šachtě:	ŠA4-1
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA A

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

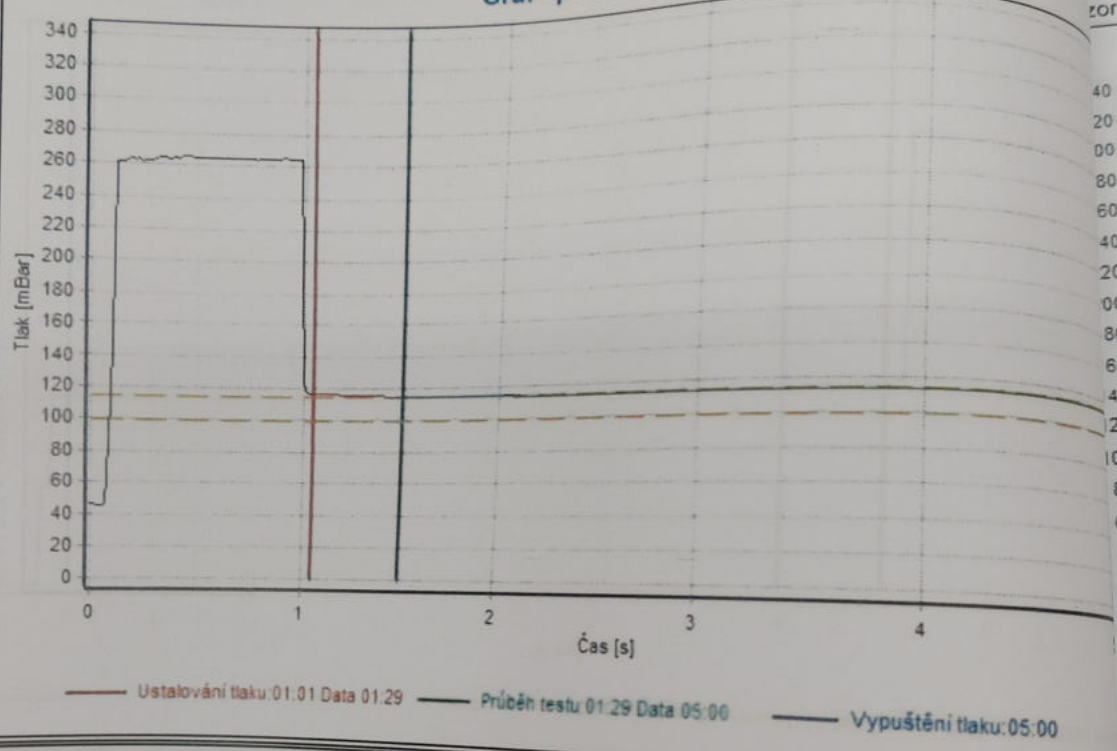

Plán:

Materiál:	Polypropylén	Test č.:	19
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
		Počáteční přetlak:	114,87 mB
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBar
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	1,73 mBar
Délka zkušební trati:	23 m	Doba ustálení:	0:28 min
Zkouška byla provedena 10.02.2022 ve 13:16:43 hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

SEZAKO Prostějov s.r.o.
DigiCAN Press

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA4-2**
K šachtě:	**ŠA4-1**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA A4**

ouštějící:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

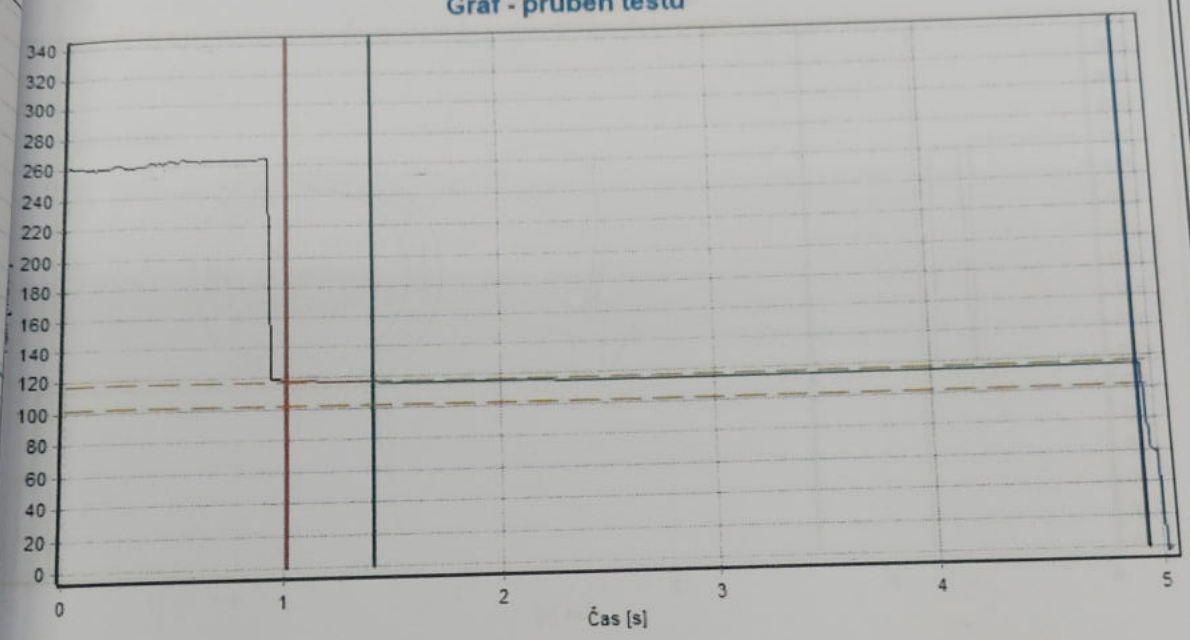

lán:	
lateriál:	**Polypropylén**
nitřní ochrana:	**Žádná**
rofil potrubí:	**Kruhový**
růměr:	**250 mm**
élka zkušební trati:	**0 m**

kouška byla provedena **10.02.2022** ve **13:41:38** hodin.

oznámka:

Test č.:	**20**
Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Počáteční přetlak:	**116,866 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**2,07 mBar**
Doba ustálení:	**0:25 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA4-2
K šachtě:	ŠA4-3
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA A4

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

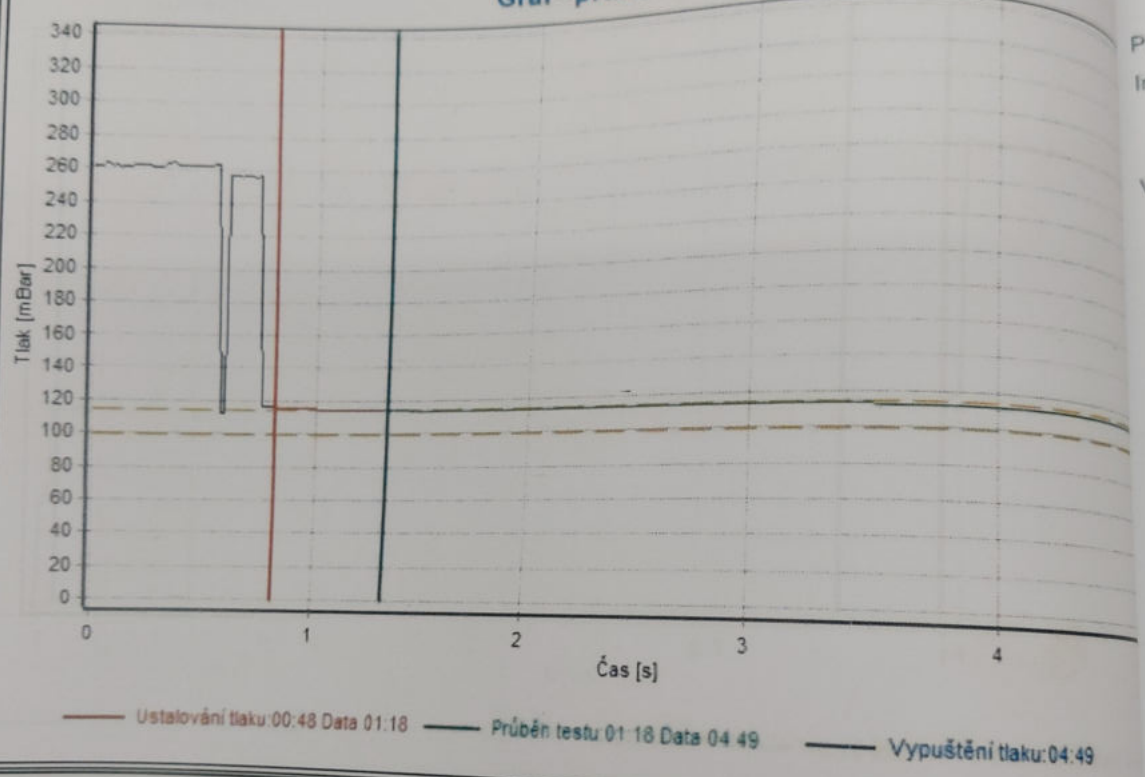

Plán:	–		
Materiál:	Polypropylén	Test č.:	21
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
		Počáteční přetlak:	113,797 m
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBar
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	1,6 mBar
Délka zkušební trati:	14 m	Doba ustálení:	0:32 min
Zkouška byla provedena **10.02.2022** ve **14:01:13** hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

SEZAKO Prostějov s.r.o.

Testované úseky celkem: **20** o c

Otestováno **20** potrubí, z toh

Délka testovaného potrubí c

Otestováno **0** šachet, z toho

Hloubka testovaných šachet

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Č

Vypracoval:

SAMOSTATNÝ DEFEKTOSK
LT/B 2. st
č. certifi
0167/30/
MAREK

Dodavatel:

SEZAKO®
J.B. Pecky
796 01 PR
tel.: 582
IČ: 25579703 D

Souhrn

Testované úseky celkem: **20** o celkové délce: **499,45 m.**

Otestováno **20** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **499,45 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Vypracoval:

SAMOSTATNÝ DEFEKTOSKOPICKÝ PRACOVNÍK
LT/B 2. stupeň
č. certifikátu
0167/30/20/LTB
MAREK MATYS

Dodavatel:

SEZAKO® Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14 34
796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 336 366
IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

Zákazník:

Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO®

Ekologické služby

Obsah:

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5
Test č. 22: 09.03.2022 - 14:39:30 - Byla změněna vstupní data
STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
Test č. 23: 09.03.2022 - 14:55:25 - Obstál ve zkoušce
STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3
Test č. 24: 09.03.2022 - 16:38:24 - Neobstál ve zkoušce
STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2
Test č. 25: 09.03.2022 - 16:13:19 - Neobstál ve zkoušce
STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1
Test č. 26: 09.03.2022 - 17:14:03 - Neobstál ve zkoušce
STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6
Test č. 27: 09.03.2022 - 17:40:28 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1
Test č. 28: 10.03.2022 - 7:11:04 - Obstál ve zkoušce
STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4
Test č. 29: 10.03.2022 - 7:18:41 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10
Test č. 30: 10.03.2022 - 7:45:47 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a
Test č. 31: 10.03.2022 - 8:13:02 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-10_ŠB-9
Test č. 32: 10.03.2022 - 8:36:03 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-9_ŠB-8
Test č. 33: 10.03.2022 - 9:02:11 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-8_ŠB-7
Test č. 34: 10.03.2022 - 9:31:38 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-7_ŠB-6
Test č. 35: 10.03.2022 - 10:02:13 - Byla změněna vstupní data
STOKA B, ŠB-6_ŠB-5
Test č. 36: 10.03.2022 - 10:31:50 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-5_ŠB-4
Test č. 37: 10.03.2022 - 10:56:56 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-4_ŠB-3
Test č. 38: 10.03.2022 - 11:22:40 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-3_ŠB-2
Test č. 39: 10.03.2022 - 11:52:54 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-2_ŠB-1
Test č. 40: 10.03.2022 - 13:05:45 - Obstál ve zkoušce
STOKA B, ŠB-1_ŠA-6
Test č. 41: 10.03.2022 - 13:42:33 - Obstál ve zkoušce
STOKA A, ŠA-7_ŠA-6
Test č. 42: 10.03.2022 - 14:24:52 - Obstál ve zkoušce
STOKA A, ŠA-7_ŠA-8
Test č. 43: 10.03.2022 - 14:52:52 - Obstál ve zkoušce

Obsah:

STOKA A, ŠA-8_ŠA-9
Test č. 44: 10.03.2022

Obsah:

STOKA A, ŠA-8_ŠA-9

Test č. 44: 10.03.2022 - 15:35:20 - Obstál ve zkoušce 24

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB2-6
K šachtě:	ŠB2-5
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B2

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 V
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

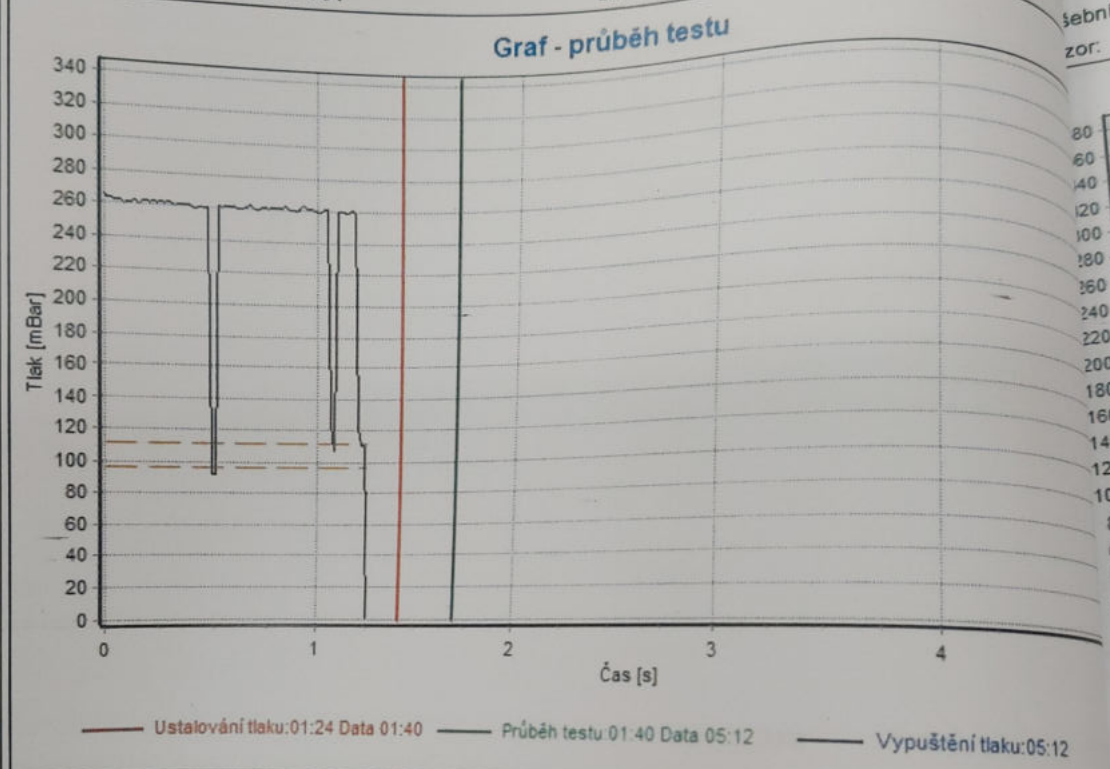

Plán:		Test č.:	22
Materiál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Vnitřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	116,995 m
		Připustná ztráta:	15 mBar
Profil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	10,4 mBar
Průměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:39 min
Délka zkušební trati:	34 m	Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Zkouška byla provedena 09.03.2022 ve 14:39:31 hodin.		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min
Poznámka:			

Výsledek: Byla změněna vstupní data

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crh

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

EZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-5**
K šachtě:	**ŠB2-4**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

ušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

Ustalování tlaku:02:40 Data 03:04 — Průběh testu:03:04 Data 06:36 — Vypuštění tlaku:06:36

lán:		Test č.:	**23**
ateriál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
nitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**111,118 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
rofil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**11,46 mBar**
růměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:25 min**
élka zkušební trati:	**43,3 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

kouška byla provedena **09.03.2022** ve **14:55:26** hodin.

oznámka:

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-4**
K šachtě:	**ŠB2-3**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

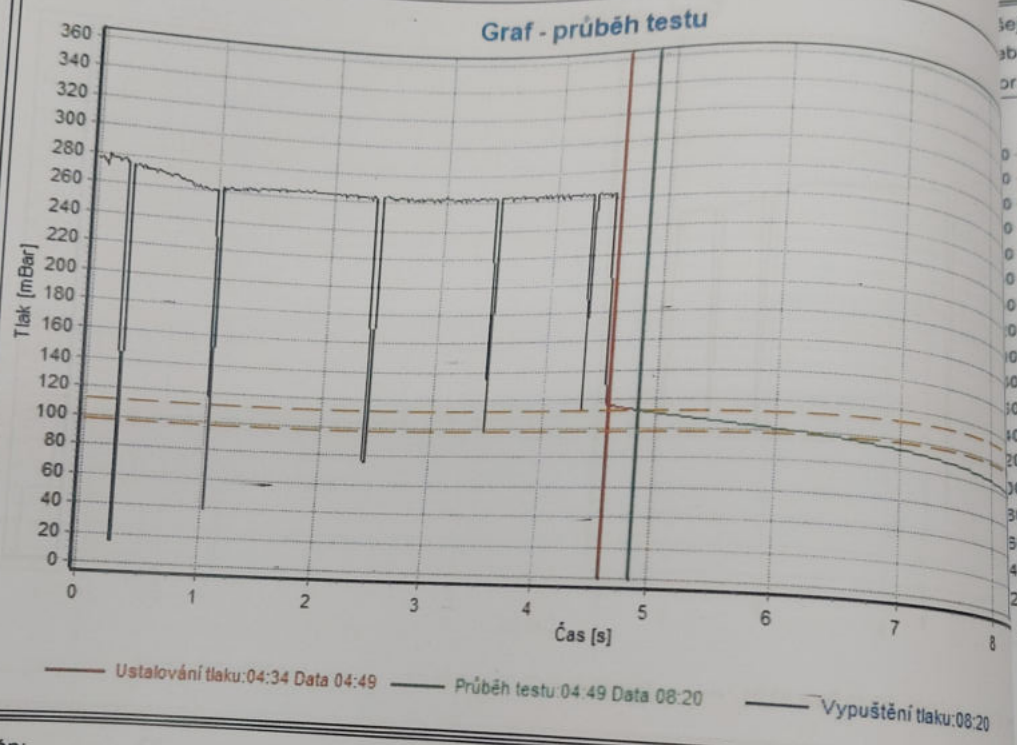

Plán:

Materiál:	**Polypropylén**	Test č.:	**24**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
		Počáteční přetlak:	**112,02**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Skutečná ztráta:	**29,09 mB**
Délka zkušební trati:	**27,5 m**	Doba ustálení:	**0:16 min**
Zkouška byla provedena **09.03.2022** ve **16:38:25** hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: **Neobstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Ch

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-3**
K šachtě:	**ŠB2-2**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

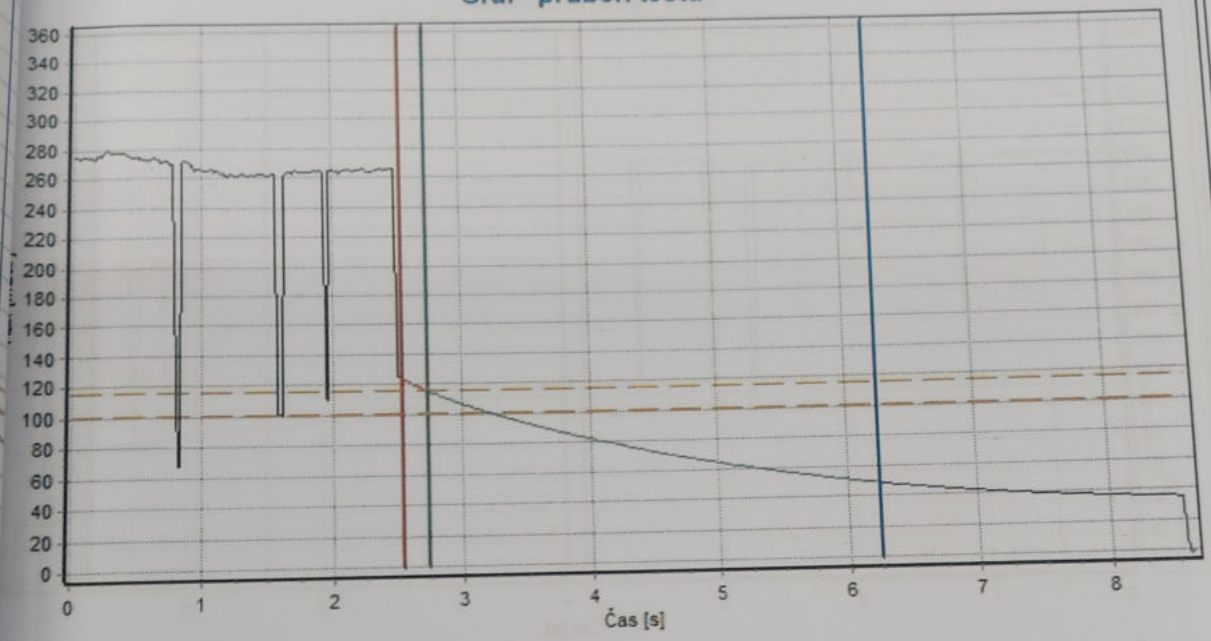

Ustalování tlaku:02:31 Data 02:42 — Průběh testu:02:42 Data 06:14 — Vypuštění tlaku:06:14

lán:		Test č.:	**25**
lateriál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
nitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**115,736 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
rofil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**66,91 mBar**
růměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:12 min**
élka zkušební trati:	**19,4 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
kouška byla provedena **09.03.2022** ve **16:13:20** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

oznámka:

Výsledek: **Neobstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

SEZAKO
Ekologické služby

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

Název úseku:	STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB2-2
K šachtě:	ŠB2-1
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B2

Zkoušející: Marek Matys
Zkušební metoda: CSN EN1610
Senzor: 2TLK0061

Výstroj: OM 402UNI-B ,78-K51-2
Třída zkoušky: LC
Zkouška senzoru: 30.07.2020

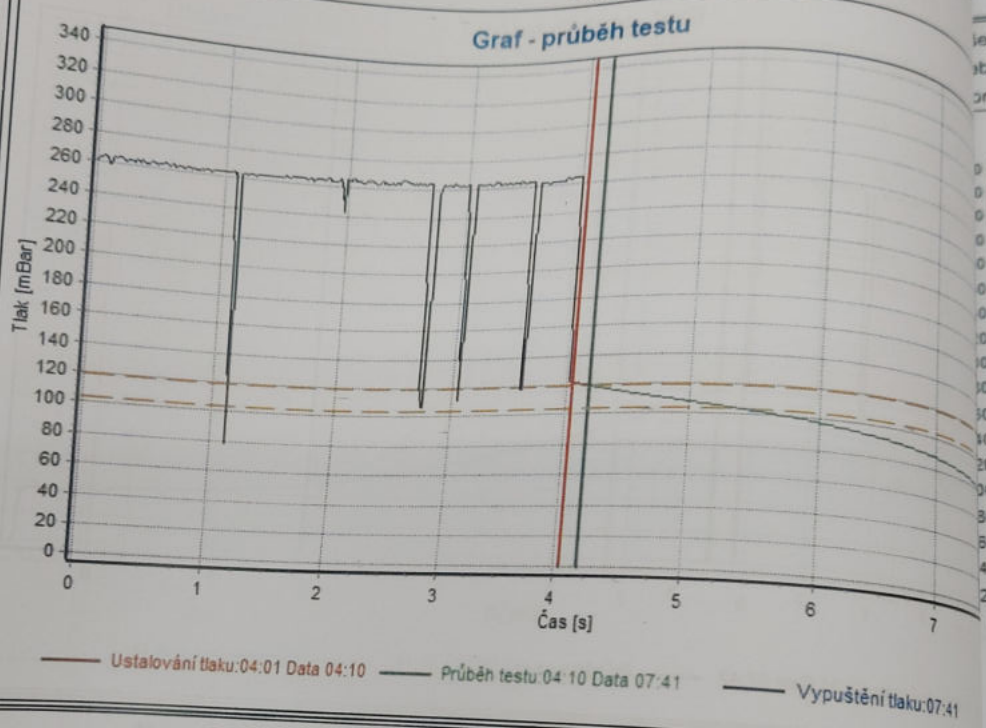

Plán:
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná

Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 41,3 m
Zkouška byla provedena 09.03.2022 ve 17:14:04 hodin.
Poznámka:

Test č.:	26
Požadovaný minimální přetlak:	100 mB
Počáteční přetlak:	119,254
Přípustná ztráta:	15 mBa
Skutečná ztráta:	37,19 m
Doba ustálení:	0:10 min
Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: Neobstál ve zkoušce

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Ch

SEZAKO Prostějov s.r.o.
DigiCAN Press

Projekt: Imos Brno a.s., P
SEZAKO
Ekologické služby
Název úseku: ST
Oblast: P
Od šachty: Š
K šachtě: Š
Stanoviště:
Město: P
Ulice:
Zkoušející: Marek Matys
Zkušební metoda: CSN EN1610
Senzor: 2TLK0061
Graf
Ustalování tlaku:00:30 Data 00:46
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná
Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 6,2 m
Zkouška byla provedena 09.03.2022 ve 17
Poznámka:
Výsledek: Obstál ve zkouš
Zákazník:
Imos Brno a.s., 627

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB2-1**
K šachtě:	**ŠB-6**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B2**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

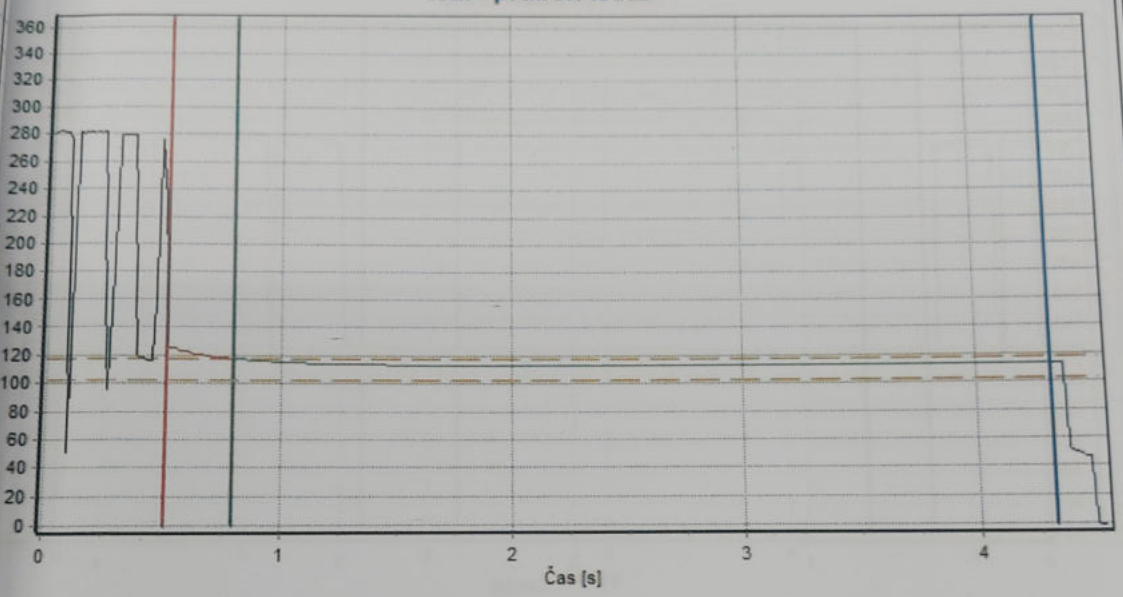

lán:	
lateriál:	**Polypropylén**
nitřní ochrana:	**Žádná**
rofil potrubí:	**Kruhový**
Průměr:	**250 mm**
Délka zkušební trati:	**6,2 m**

Zkouška byla provedena **09.03.2022** ve **17:40:29** hodin.

Poznámka:

Test č.:	**27**
Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Počáteční přetlak:	**117,521 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**5,11 mBar**
Doba ustálení:	**0:18 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB1-2
K šachtě:	ŠB1-1
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B1

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

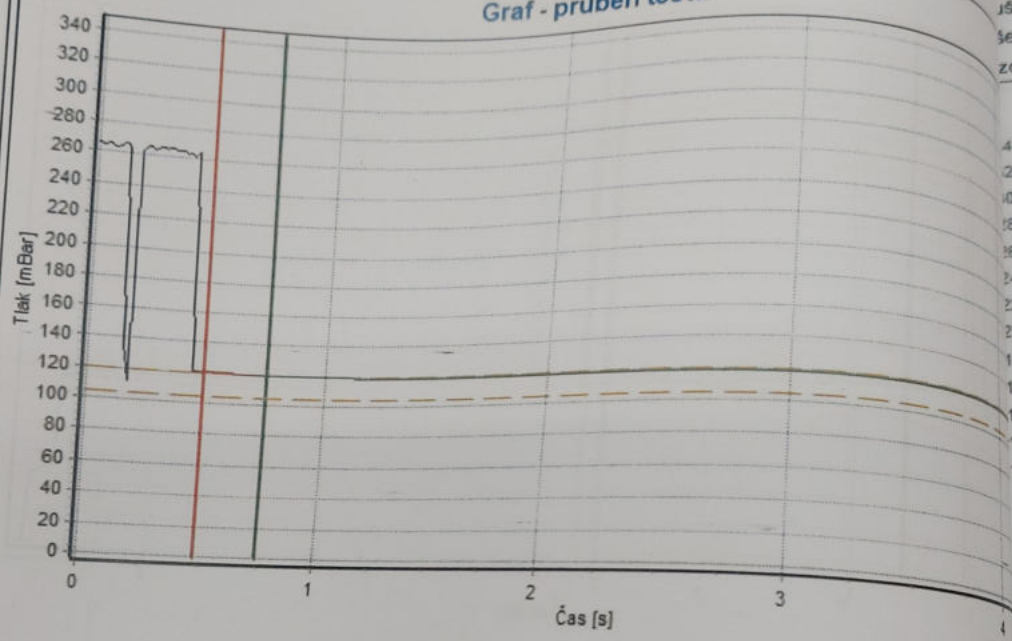

Plán:		Test č.:	28
Materiál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	100 mB
Vnitřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	119,65
		Přípustná ztráta:	15 mB
Profil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	1,72 mB
Průměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:17 min
Délka zkušební trati:	38,9 m	Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 7:11:05 hodin.		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min
Poznámka:			

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel C

Projekt: Imos Brno

SEZAKO
Ekologické služby

Název úse
Oblast:
Od šachty
K šachtě:
Stanoviště
Město:
Ulice:

Marek Matys
CSN EN1610
2TLK0061

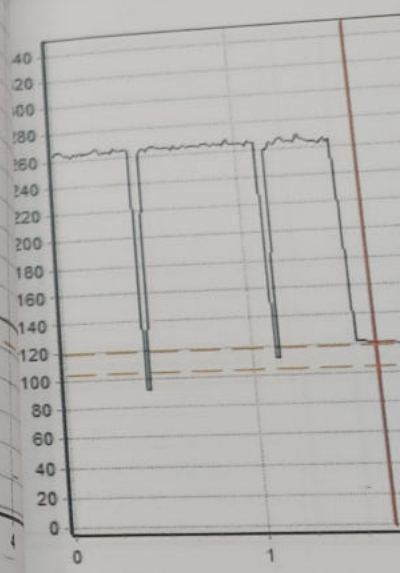

Ustalování tlaku:01:36 Data 02

Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná
Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 42,7 m
Zkouška byla provedena 10.03.202
Poznámka:

Výsledek: Obstál ve z

Zákazník:

Imos Brno a

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB1-1**
K šachtě:	**ŠB-4**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B1**

koušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
kušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
enzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

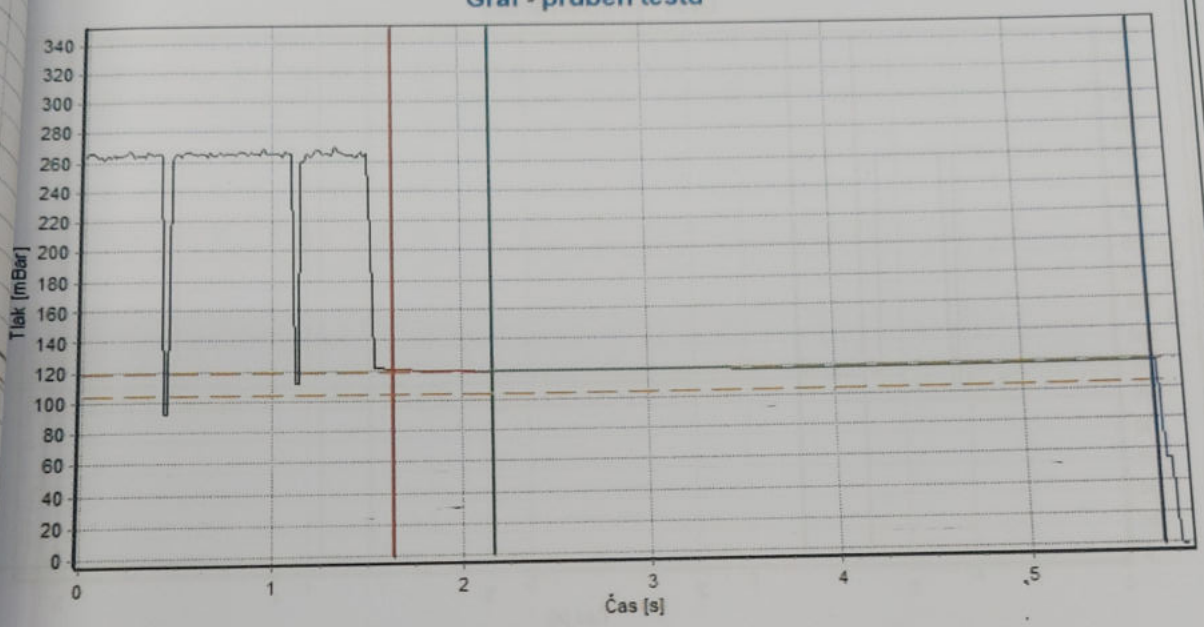

Ustalování tlaku:01:36 Data 02:09 — Průběh testu:02:09 Data 05:39 — Vypuštění tlaku:05:39

Plán:		Test č.:	**29**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**118,733 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,32 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:33 min**
Délka zkušební trati:	**42,7 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **7:18:42** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB-11a
K šachtě:	ŠB-10
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 V
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

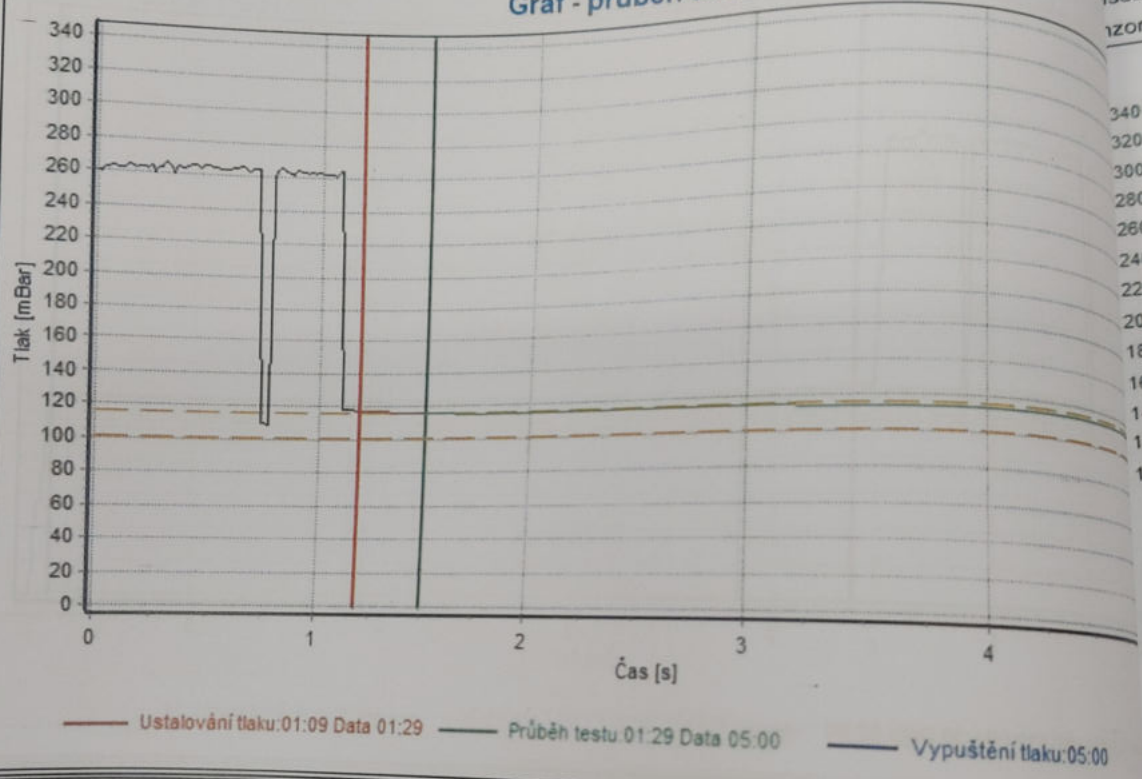

Plán:			
Materiál:	Polypropylén	Test č.:	30
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
		Počáteční přetlak:	115,928 m
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBar
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	1,87 mBar
Délka zkušební trati:	35,4 m	Doba ustálení:	0:20 min
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **7:45:48** hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Ch

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-11**
K šachtě:	**ŠB-11a**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

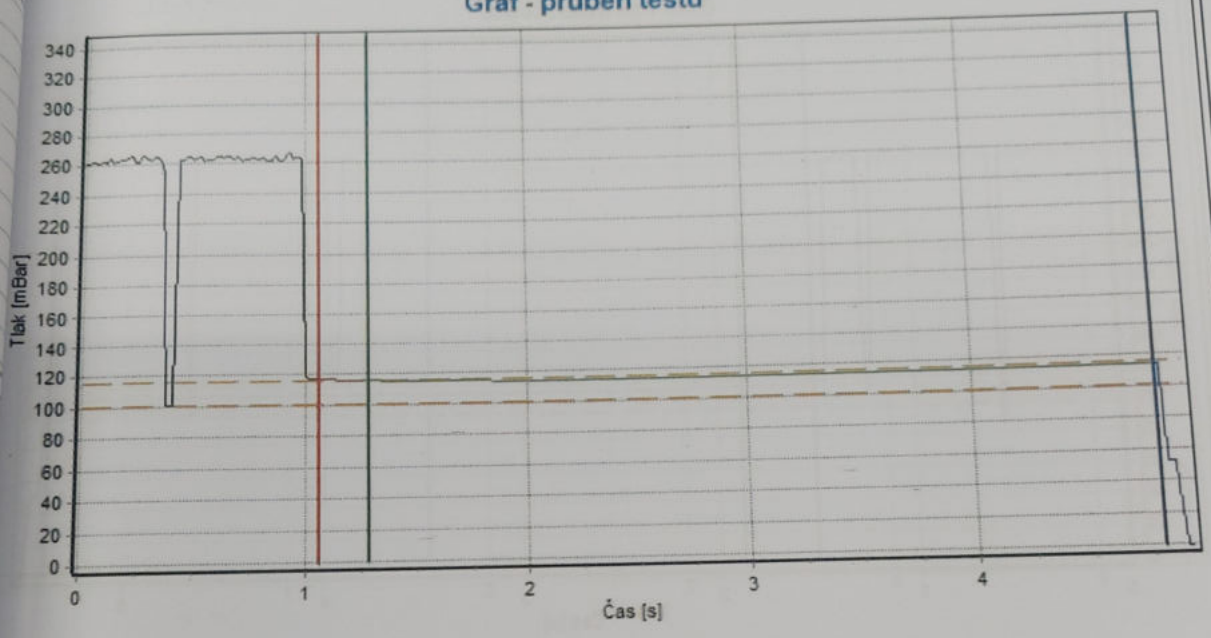

Ustalování tlaku:01:03 Data 01:15 — Průběh testu:01:15 Data 04:46 — Vypuštění tlaku:04:46

Plán:

Materiál: **Polypropylén**

Vnitřní ochrana: **Žádná**

Profil potrubí: **Kruhový**

Průměr: **250 mm**

Délka zkušební trati: **5,3 m**

Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **8:13:03** hodin.

Poznámka:

Test č.:	**31**
Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Počáteční přetlak:	**115,946 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**2,44 mBar**
Doba ustálení:	**0:14 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA B, ŠB-10_ŠB-9
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB-10
K šachtě:	ŠB-9
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 Vb
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

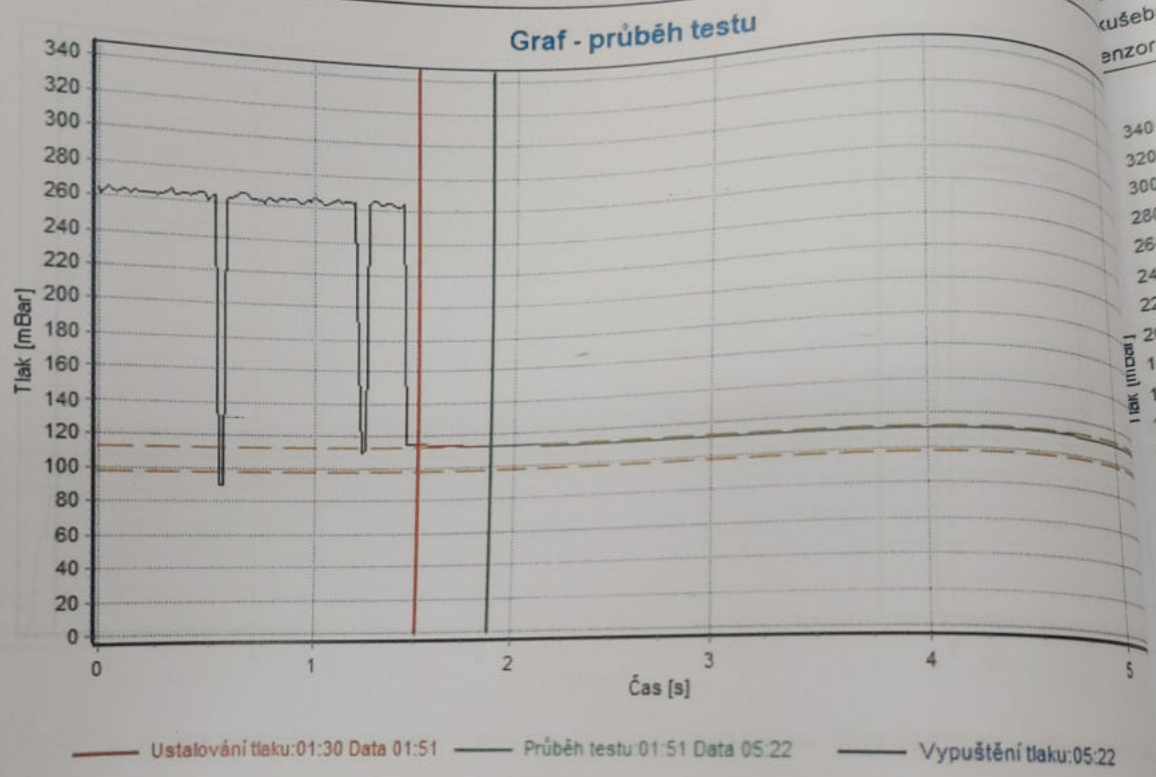

Plán:
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná

Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 40,2 m
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 8:36:04 hodin.
Poznámka:

Test č.:	32
Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Počáteční přetlak:	112,754 m
Přípustná ztráta:	15 mBar
Skutečná ztráta:	1,8 mBar
Doba ustálení:	0:23 min
Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crh

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-9_ŠB-8**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-9**
K šachtě:	**ŠB-8**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

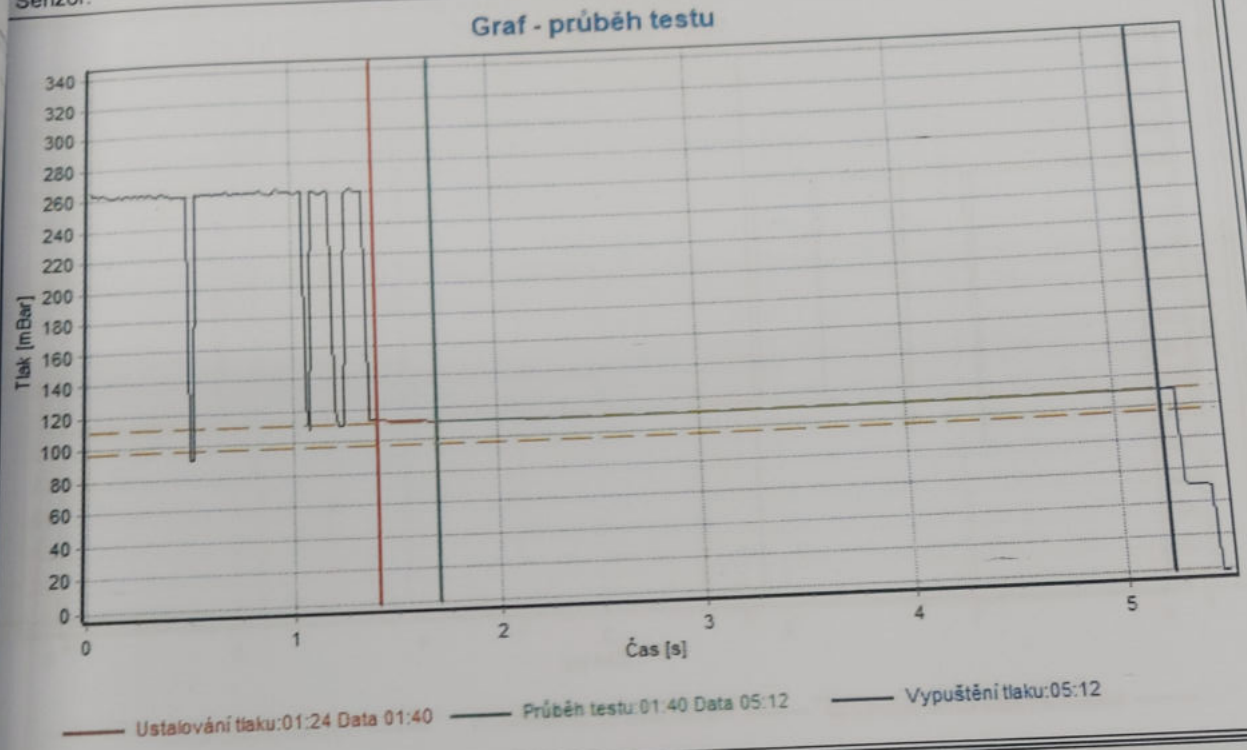

Plán:		Test č.:	**33**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**111,616 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,99 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:18 min**
Délka zkušební trati:	**24,1 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **9:02:12** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-8_ŠB-7**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-8**
K šachtě:	**ŠB-7**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 V**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

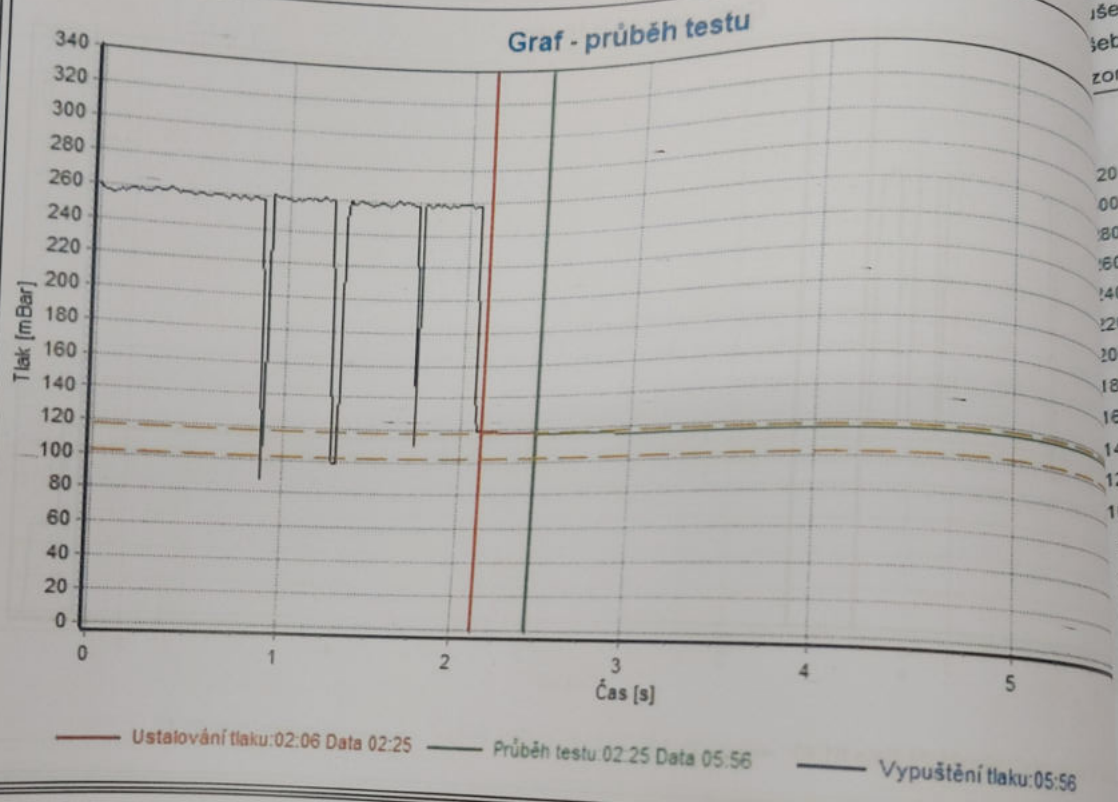

Plán:

Materiál:	**Polypropylén**	Test č.:	**34**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
		Počáteční přetlak:	**117,046 m**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Skutečná ztráta:	**2,1 mBar**
Délka zkušební trati:	**17,6 m**	Doba ustálení:	**0:20 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **9:31:39** hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crhá

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-7_ŠB-6**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-7**
K šachtě:	**ŠB-6**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

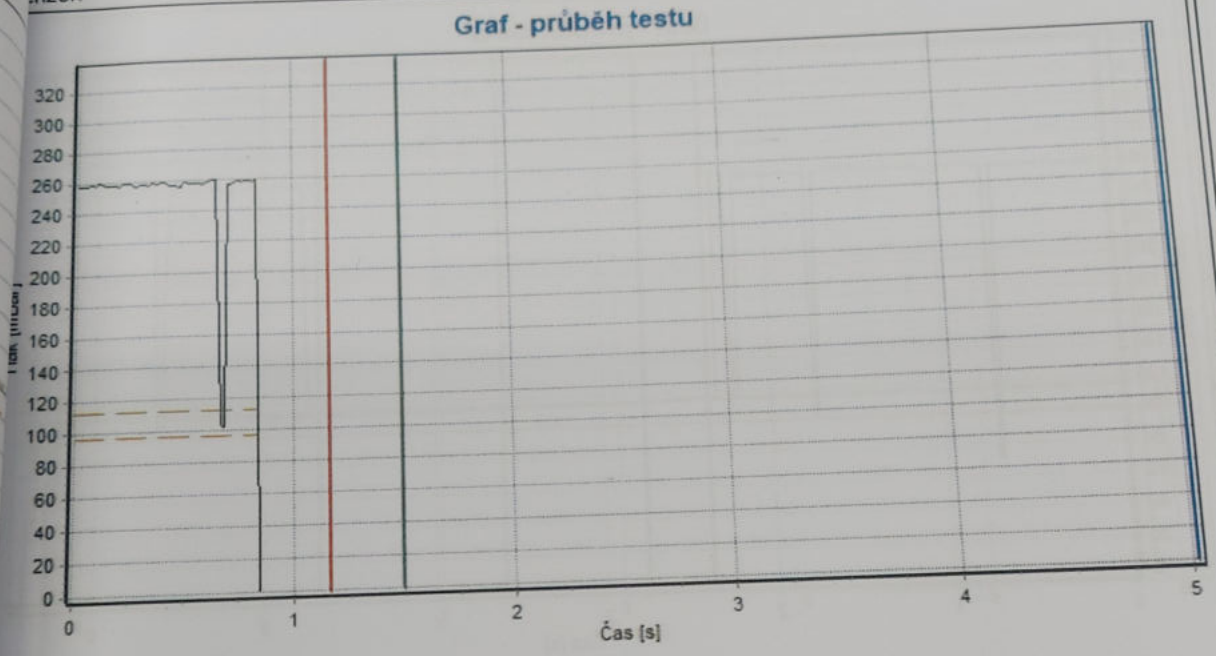

Ustalování tlaku:01:09 Data 01:29 — Průběh testu:01:29 Data 05:00 — Vypuštění tlaku:05:00

Plán:		Test č.:	**35**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**111,742 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,91 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:21 min**
Délka zkušební trati:	**34,8 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **10:02:14** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Byla změněna vstupní data**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

SEZAKO
Ekologické služby

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

Název úseku:	STOKA B, ŠB-6_ŠB-5
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB-6
K šachtě:	ŠB-5
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B

Zkoušející: Marek Matys
Zkušební metoda: CSN EN1610
Senzor: 2TLK0061

Výstroj: OM 402UNI-B ,78-KS1-2-
Třída zkoušky: LC
Zkouška senzoru: 30.07.2020

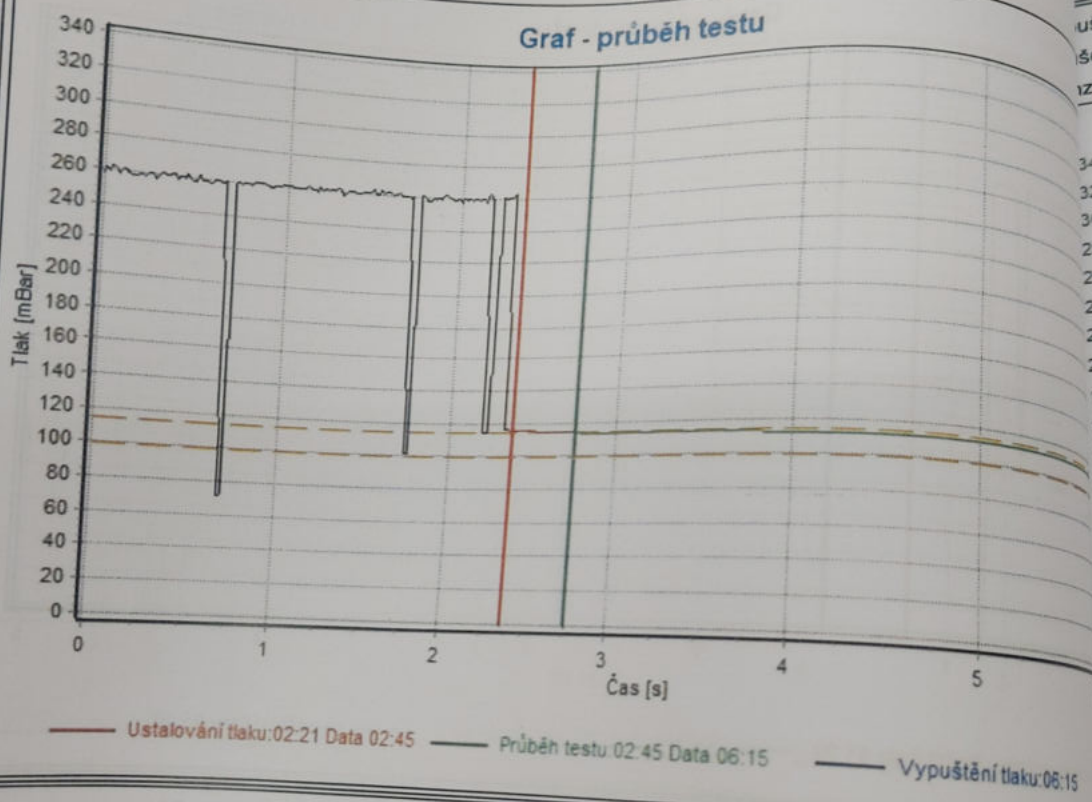

Plán:
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná

Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 44,4 m
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 10:31:51 hodin.
Poznámka:

Test č.:	36
Požadovaný minimální přetlak:	100 mB
Počáteční přetlak:	113,964
Přípustná ztráta:	15 mBa
Skutečná ztráta:	1,84 mB
Doba ustálení:	0:24 mi
Požadovaná doba zkoušky:	3:31 mi
Skutečná doba zkoušky:	3:32 mi

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel C

SEZAKO Prostějov s.r.o.
DigiCAN Pr

SEZAKO
Ekologické služby
Projekt: Im
ušející: Marek Matys
šební metoda: CSN EN1610
nzor: 2TLK0061
Ustalování tlaku:01
Plán:
ateriál: Polyprop
itřní ochrana: Žádná
ofil potrubí: Kruhový
ůměr: 250 mm
élka zkušební trati: 39,5
ouška byla provedena 1
oznámka:
ýsledek: Obstá
ákazník:
Imos

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-5_ŠB-4**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-5**
K šachtě:	**ŠB-4**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

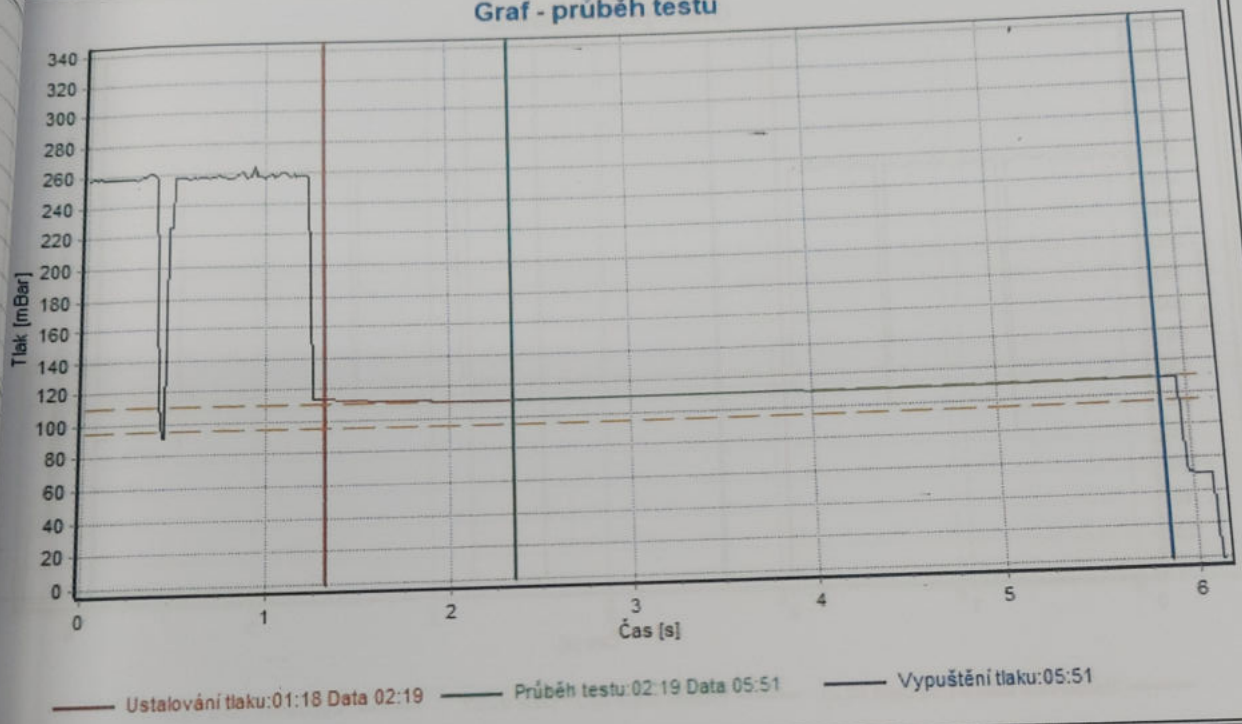

Plán:		Test č.:	**37**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**110,688 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**0,94 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**1:3 min**
Délka zkušební trati:	**39,5 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **10:56:57** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

SEZAKO
Ekologické služby

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

Název úseku:	STOKA B, ŠB-4_ŠB-3
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB-4
K šachtě:	ŠB-3
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B

Zkoušející: Marek Matys
Zkušební metoda: CSN EN1610
Senzor: 2TLK0061

Výstroj: OM 402UNI-B ,78-K51-2 V
Třída zkoušky: LC
Zkouška senzoru: 30.07.2020

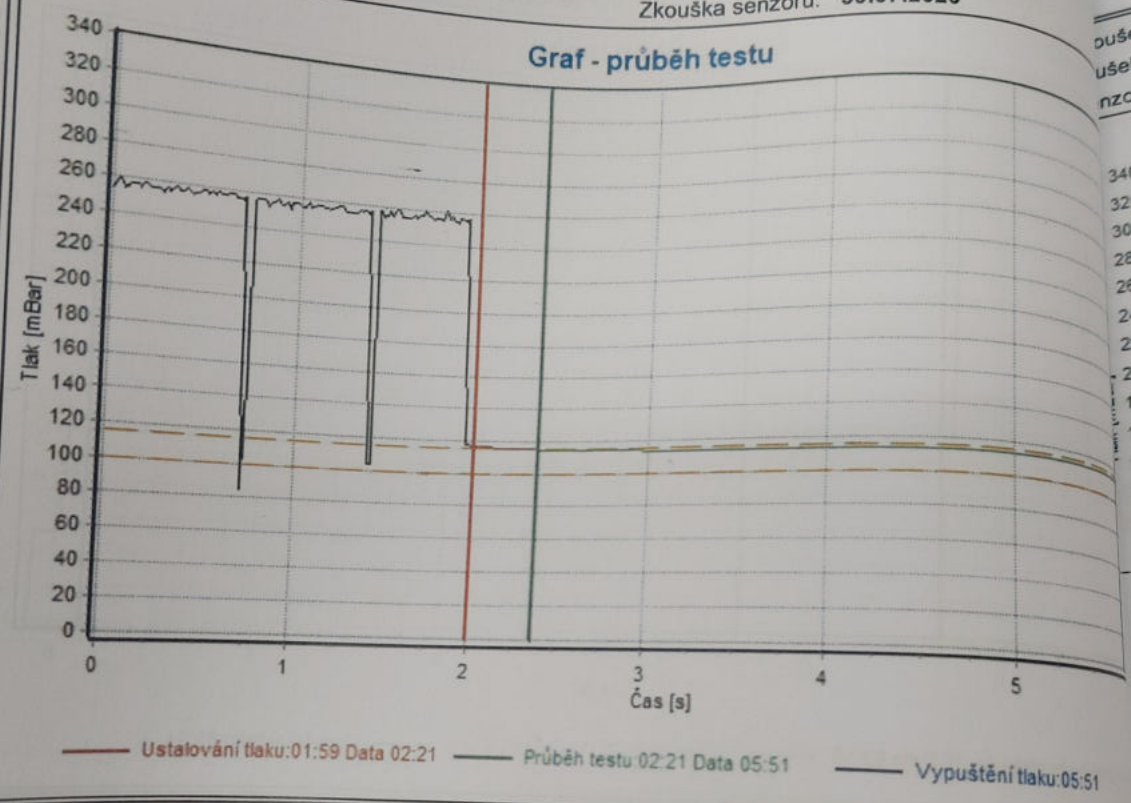

Plán:
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná

Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 50,5 m
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 11:22:41 hodin.
Poznámka:

Test č.:	38
Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Počáteční přetlak:	115,13 mBar
Přípustná ztráta:	15 mBar
Skutečná ztráta:	1,95 mBar
Doba ustálení:	0:23 min
Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Cr

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-3_ŠB-2**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-3**
K šachtě:	**ŠB-2**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

koušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
kušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
enzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

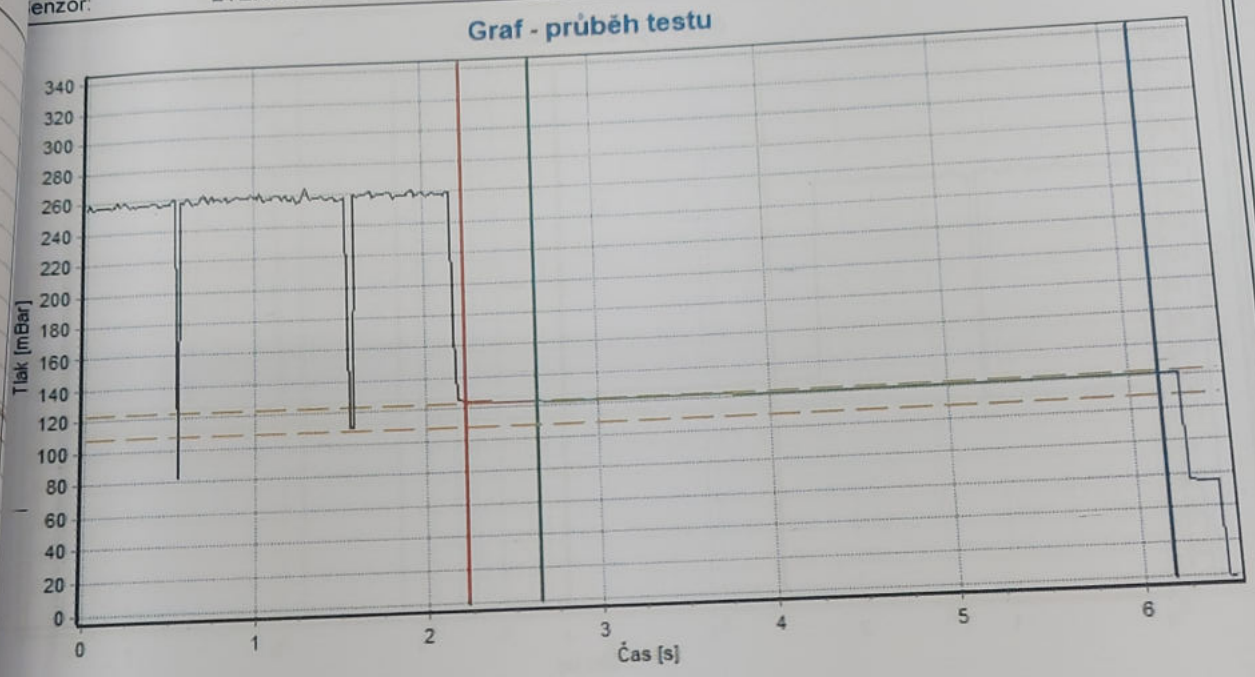

Ustalování tlaku:02:12 Data 02:37 — Průběh testu:02:37 Data 06:08 — Vypuštění tlaku:06:08

Plán:		Test č.:	**39**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**123,024 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,79 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:26 min**
Délka zkušební trati:	**17,5 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **11:52:55** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

SEZAKO
Ekologické služby

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

Název úseku:	STOKA B, ŠB-2_ŠB-1
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠB-2
K šachtě:	ŠB-1
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B

Zkoušející: Marek Matys
Zkušební metoda: CSN EN1610
Senzor: 2TLK0061

Výstroj: OM 402UNI-B ,78-K51-2 V
Třída zkoušky: LC
Zkouška senzoru: 30.07.2020

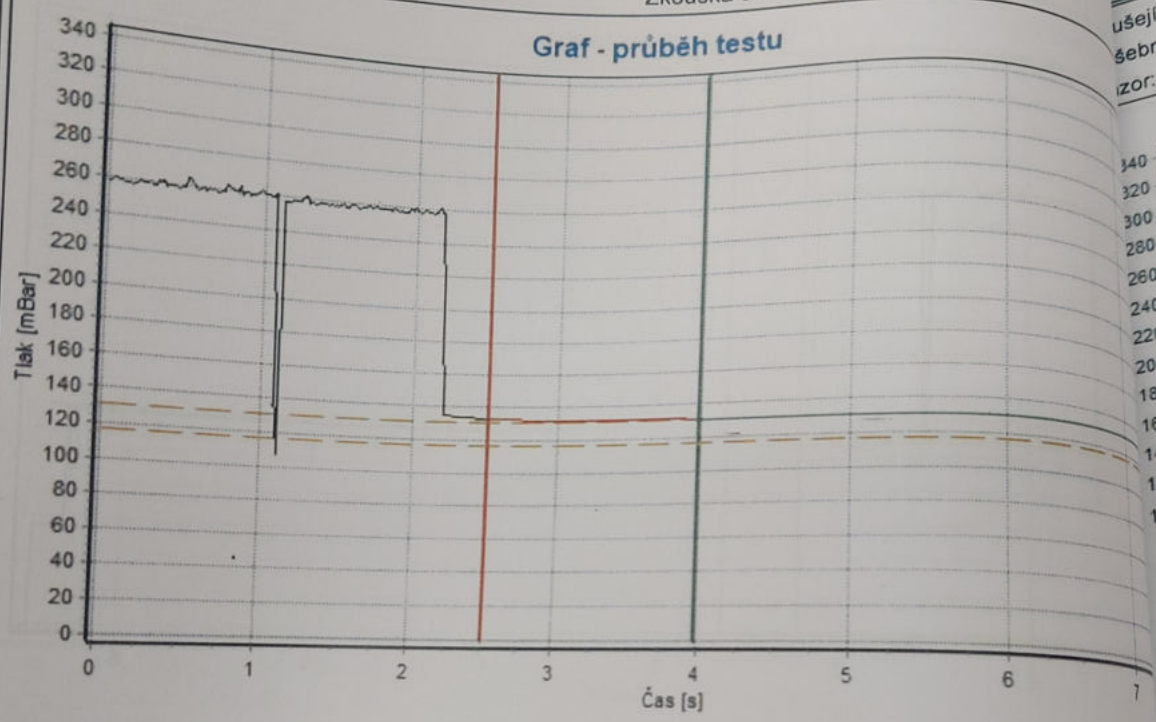

Plán:
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná

Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 21,2 m
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 13:05:46 hodin.
Poznámka:

Test č.:	40
Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
Počáteční přetlak:	131,35 mB
Přípustná ztráta:	15 mBar
Skutečná ztráta:	0,81 mBar
Doba ustálení:	1:29 min
Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Ch

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA B, ŠB-1_ŠA-6**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠB-1**
K šachtě:	**ŠA-6**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

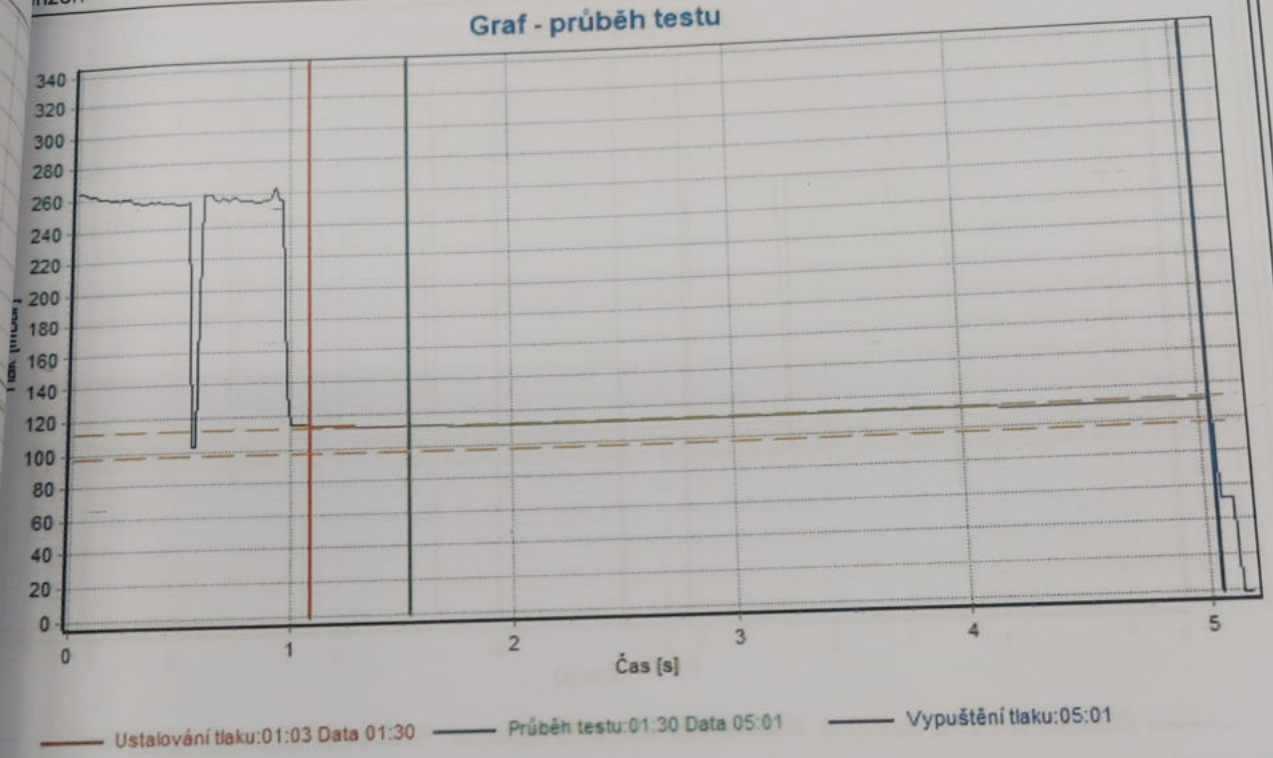

Plán:		Test č.:	**41**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**112,351 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**1,61 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:28 min**
Délka zkušební trati:	**29,1 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **13:42:34** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: Imos Brno a.s., Předslav Zakázka: Obec Předslav

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A, ŠA-7_ŠA-6
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA-7
K šachtě:	ŠA-6
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA B

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

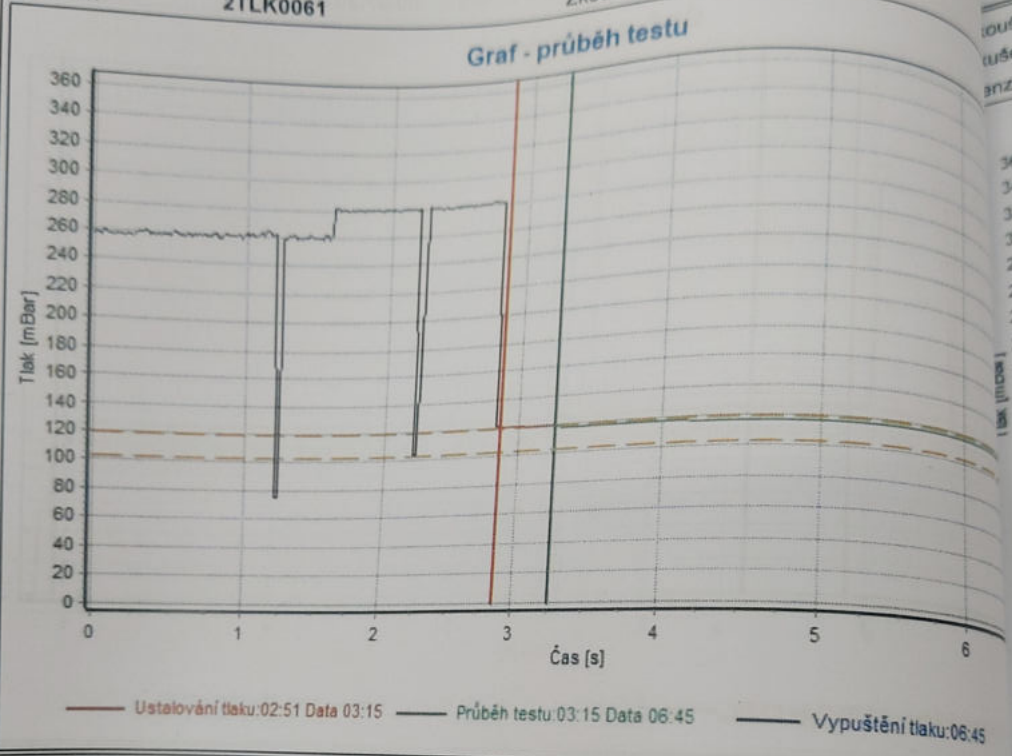

Plán:		Test č.:	42
Materiál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	100 mB
Vnitřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	118,35
		Přípustná ztráta:	15 mBa
Profil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	1,96 mB
Průměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:25 mi
Délka zkušební trati:	11,2 m	Požadovaná doba zkoušky:	3:31 mi
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 14:24:53 hodin.		Skutečná doba zkoušky:	3:32 mi
Poznámka:			

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Cr

Projekt: Imos Brn

SEZAKO
Ekologické služby

Název ús
Oblast:
Od šach
K šachtě
Stanovi
Město:
Ulice:

Zkoušející: Marek Matys
Zkušební metoda: CSN EN1610
Senzor: 2TLK0061

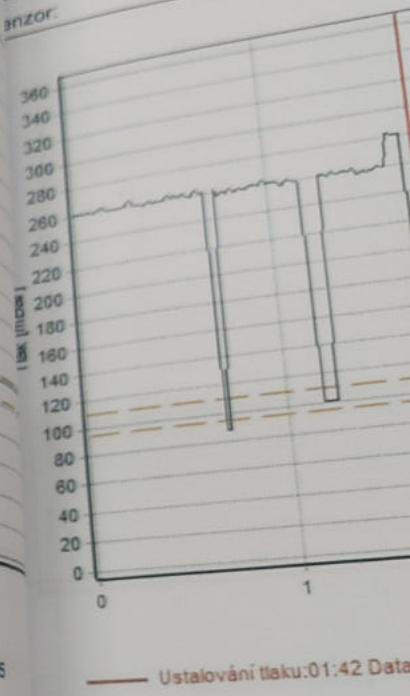

Plán:
Materiál: Polypropylén
Vnitřní ochrana: Žádná
Profil potrubí: Kruhový
Průměr: 250 mm
Délka zkušební trati: 46,7 m
Zkouška byla provedena 10.03.
Poznámka:

Výsledek: Obstál ve

Zákazník:

Imos Brno

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A, ŠA-7_ŠA-8**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA-7**
K šachtě:	**ŠA-8**
Stanoviště:	
Město:	**Předslav**
Ulice:	**STOKA B**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LC**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

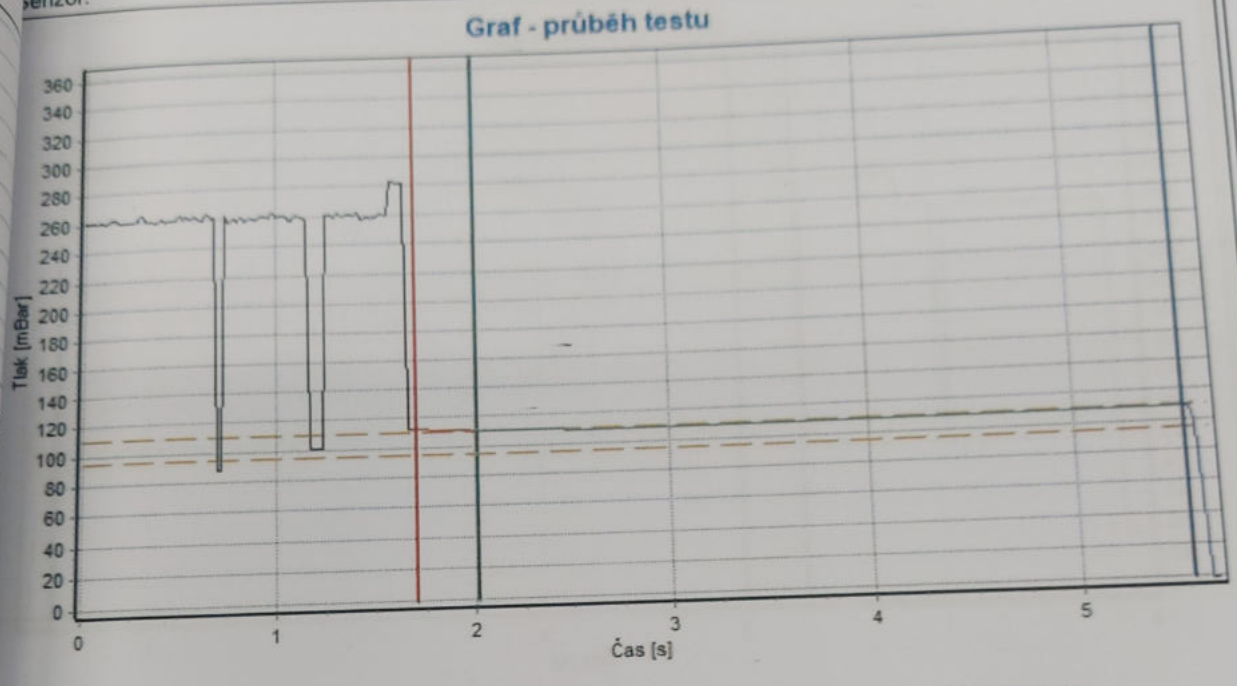

Plán:		Test č.:	**43**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**100 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**110,481 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**2,08 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:19 min**
Délka zkušební trati:	**46,7 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**3:31 min**
Zkouška byla provedena **10.03.2022** ve **14:52:53** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**3:32 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Projekt: **Imos Brno a.s., Předslav** Zakázka: **Obec Předslav**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A, ŠA-8_ŠA-9
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA-8
K šachtě:	ŠA-9
Stanoviště:	
Město:	Předslav
Ulice:	STOKA A

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 V01
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LC
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

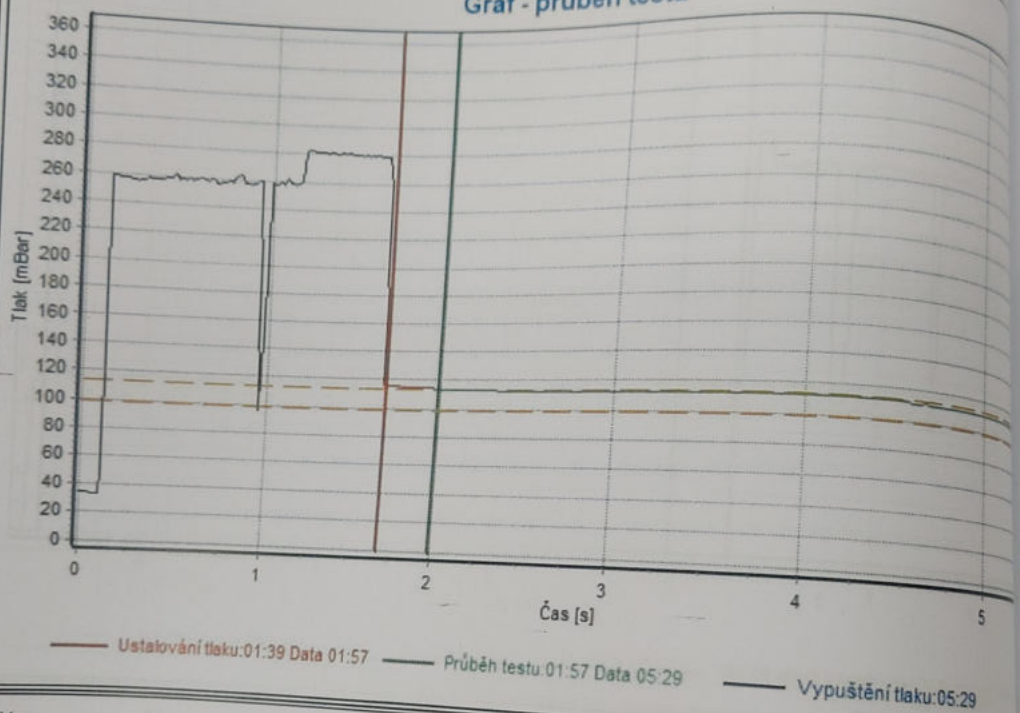

Plán:

Materiál:	Polypropylén	Test č.:	44
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	100 mBar
		Počáteční přetlak:	113,898 mB
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBar
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	2,38 mBar
Délka zkušební trati:	30,5 m	Doba ustálení:	0:19 min
Zkouška byla provedena 10.03.2022 ve 15:35:21 hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	3:31 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	3:32 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Testované úseky celkem: 23 o celkové
Otestováno 23 potrubí, z toho 3 nev
Délka testovaného potrubí celkem:
Otestováno 0 šachet, z toho 0 nev
Hloubka testovaných šachet celke

Pro:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovi

Vypracoval:

Dodavatel:

SEZ
J
79
IČ: 255

Souhrn

Testované úseky celkem: **23** o celkové délce: **701,299999999999 m.**

Otestováno **23** potrubí, z toho **3** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **701,299999999999 m** z toho **88,2 m** nevyhovující.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Vypracoval:

SAMOSTATNÝ DEFEKTOSKOPICKÝ PRACOVNÍK
LT/B 2. stupeň
č. certifikátu
0167/30/20/LTB
MAREK MATYS

Zákazník:

Dodavatel:

SEZAKO Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14 34
796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 336 366
IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

.....

.....

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsek - statistika

09.02.2022 - 17.02.2022

Rozměr: 250 mm / 250 mm

Datum	Úsek	Ulice	Materiál	Insp. délka [m]	Rozměr [mm]	Fota
09.02.2022	STOKA A, ŠA-10_ŠA-11	STOKA A	PP-Polypropylen	28,50	250 / 250	0
09.02.2022	STOKA A, ŠA-10_ŠA-9	STOKA A	PP-Polypropylen	30,50	250 / 250	0
17.02.2022	STOKA A, ŠA-7_ŠA-6	STOKA A	PP-Polypropylen	11,20	250 / 250	1
17.02.2022	STOKA A, ŠA-8_ŠA-7	STOKA A	PP-Polypropylen	46,70	250 / 250	3
17.02.2022	STOKA A, ŠA-9_ŠA-8	STOKA A	PP-Polypropylen	30,50	250 / 250	3
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-1_ŠA-11	STOKA A1	PP-Polypropylen	14,30	250 / 250	3
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-2_ŠA1-1	STOKA A1	PP-Polypropylen	21,20	250 / 250	0
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-3_ŠA1-2	STOKA A1	PP-Polypropylen	16,90	250 / 250	0
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3	STOKA A1	PP-Polypropylen	25,30	250 / 250	2
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4	STOKA A1	PP-Polypropylen	26,10	250 / 250	2
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-6_ŠA1-5	STOKA A1	PP-Polypropylen	24,70	250 / 250	1
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-7_ŠA1-6	STOKA A1	PP-Polypropylen	27,30	250 / 250	0
09.02.2022	STOKA A1, ŠA1-8_ŠA1-7	STOKA A1	PP-Polypropylen	40,30	250 / 250	0
09.02.2022	STOKA A4, ŠA-10_ŠA4-1	STOKA A4	PP-Polypropylen	23,00	250 / 250	2
09.02.2022	STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-1	STOKA A4	PP-Polypropylen	18,30	250 / 250	2
09.02.2022	STOKA A4, ŠA4-2_ŠA4-3	STOKA A4	PP-Polypropylen	14,00	250 / 250	4
09.02.2022	STOKA B 1-1, ŠB1-6_ŠB1-1-1	STOKA B 1-1	PP-Polypropylen	42,80	250 / 250	2
17.02.2022	STOKA B, ŠB-1_ŠA-6	STOKA B	PP-Polypropylen	29,10	250 / 250	4
10.02.2022	STOKA B, ŠB-10_ŠB-9	STOKA B	PP-Polypropylen	40,20	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B, ŠB-11_ŠB-11a	STOKA B	PP-Polypropylen	5,30	250 / 250	1
10.02.2022	STOKA B, ŠB-11a_ŠB-10	STOKA B	PP-Polypropylen	35,40	250 / 250	1
17.02.2022	STOKA B, ŠB-2_ŠB-1	STOKA B	PP-Polypropylen	21,20	250 / 250	2
17.02.2022	STOKA B, ŠB-3_ŠB-2	STOKA B	PP-Polypropylen	17,50	250 / 250	1
17.02.2022	STOKA B, ŠB-4_ŠB-3	STOKA B	PP-Polypropylen	50,50	250 / 250	3
10.02.2022	STOKA B, ŠB-5_ŠB-4	STOKA B	PP-Polypropylen	39,50	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B, ŠB-6_ŠB-5	STOKA B	PP-Polypropylen	44,40	250 / 250	1
10.02.2022	STOKA B, ŠB-7_ŠB-6	STOKA B	PP-Polypropylen	34,80	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B, ŠB-8_ŠB-7	STOKA B	PP-Polypropylen	17,60	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B, ŠB-9_ŠB-8	STOKA B	PP-Polypropylen	24,10	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4	STOKA B1	PP-Polypropylen	42,70	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1	STOKA B1	PP-Polypropylen	38,90	250 / 250	3
09.02.2022	STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2	STOKA B1	PP-Polypropylen	49,50	250 / 250	5
09.02.2022	STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3	STOKA B1	PP-Polypropylen	27,20	250 / 250	2
09.02.2022	STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4	STOKA B1	PP-Polypropylen	25,20	250 / 250	2
09.02.2022	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5	STOKA B1	PP-Polypropylen	40,80	250 / 250	4
09.02.2022	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7	STOKA B1	PP-Polypropylen	7,10	250 / 250	0
09.02.2022	STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8	STOKA B1	PP-Polypropylen	40,00	250 / 250	1
10.02.2022	STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6	STOKA B2	PP-Polypropylen	6,20	250 / 250	1
10.02.2022	STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1	STOKA B2	PP-Polypropylen	41,30	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2	STOKA B2	PP-Polypropylen	19,40	250 / 250	0
10.02.2022	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	STOKA B2	PP-Polypropylen	27,50	250 / 250	2
10.02.2022	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4	STOKA B2	PP-Polypropylen	43,30	250 / 250	4
10.02.2022	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5	STOKA B2	PP-Polypropylen	34,00	250 / 250	0

Monitoring kanaliz
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sez

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhř

Úsek - statistika

09.02.2022 - 17.02.2022

Rozměry pro Rozměr: 250 mm / 250 mm

Počet	Úseky	43 Ks	Součet délek	Úseky	1244,30 m
	Inspekce	43 Ks		Inspekce	1244,30 m
	Monit. z protisměru	0 Ks		Monit. z protisměru	0,00 m
	Stanice	162 Ks			
	Fota	76 Ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	43 Ks	Součet délek	Úseky	1244,30 m
	Inspekce	43 Ks		Inspekce	1244,30 m
	Monit. z protisměru	0 Ks		Monit. z protisměru	0,00 m
	Stanice	162 Ks			
	Fota	76 Ks			

Vytištěno: 17.02.2022

Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO®

Ekologické služby

Obsah:

STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10

Test č. 1: 22.09.2022 - 10:30:19 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9

Test č. 2: 22.09.2022 - 10:54:14 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

Test č. 3: 22.09.2022 - 11:16:18 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7

Test č. 4: 22.09.2022 - 11:56:35 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6

Test č. 5: 22.09.2022 - 12:27:07 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4

Test č. 6: 22.09.2022 - 12:33:23 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1

Test č. 7: 22.09.2022 - 12:52:15 - Obstál ve zkoušce

STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15

Test č. 8: 22.09.2022 - 13:21:52 - Obstál ve zkoušce

Projekt: IMOS Brno a.

ZAKO

Název

Oblast

Od ša

K šac

Stanc

Měst

Ulice

šející: Marek Matys

ební metoda: CSN EN1610

or: 2TLK0061

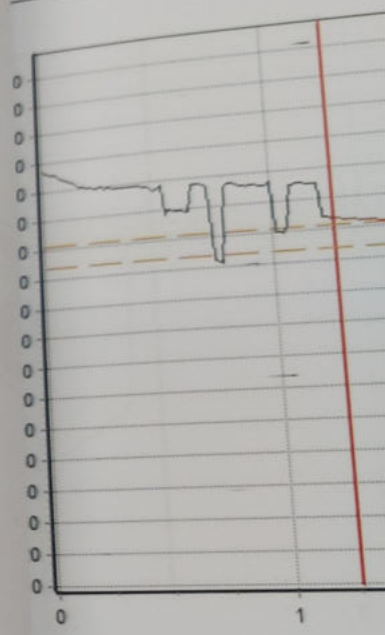

Ustalování tlaku:01:15 Data

iál: Polypropylén

í ochrana: Žádná

potrubí: Kruhový

ěr: 250 mm

zkušební trati: 34,4 m

ška byla provedena 22.09.2

ámka:

ledek: Obstál ve

zník:

Imos Brno

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

EZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-11**
K šachtě:	**ŠA3-10**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

n:		Test č.:	**1**
teriál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
třní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**222,653 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
		Skutečná ztráta:	**2,77 mBar**
ofil potrubí:	**Kruhový**	Doba ustálení:	**0:20 min**
ıměr:	**250 mm**	Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
lka zkušební trati:	**34,4 m**	Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

ouška byla provedena **22.09.2022** ve **10:30:20** hodin.

známka:

ýsledek: **Obstál ve zkoušce**

ıkazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-10**
K šachtě:	**ŠA3-9**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

Zkoušející: **Marek Matys**
Zkušební metoda: **CSN EN1610**
Senzor: **2TLK0061**

Výstroj: **OM 402UNI-B ,78-K51-2 V5**
Třída zkoušky: **LD**
Zkouška senzoru: **30.07.2020**

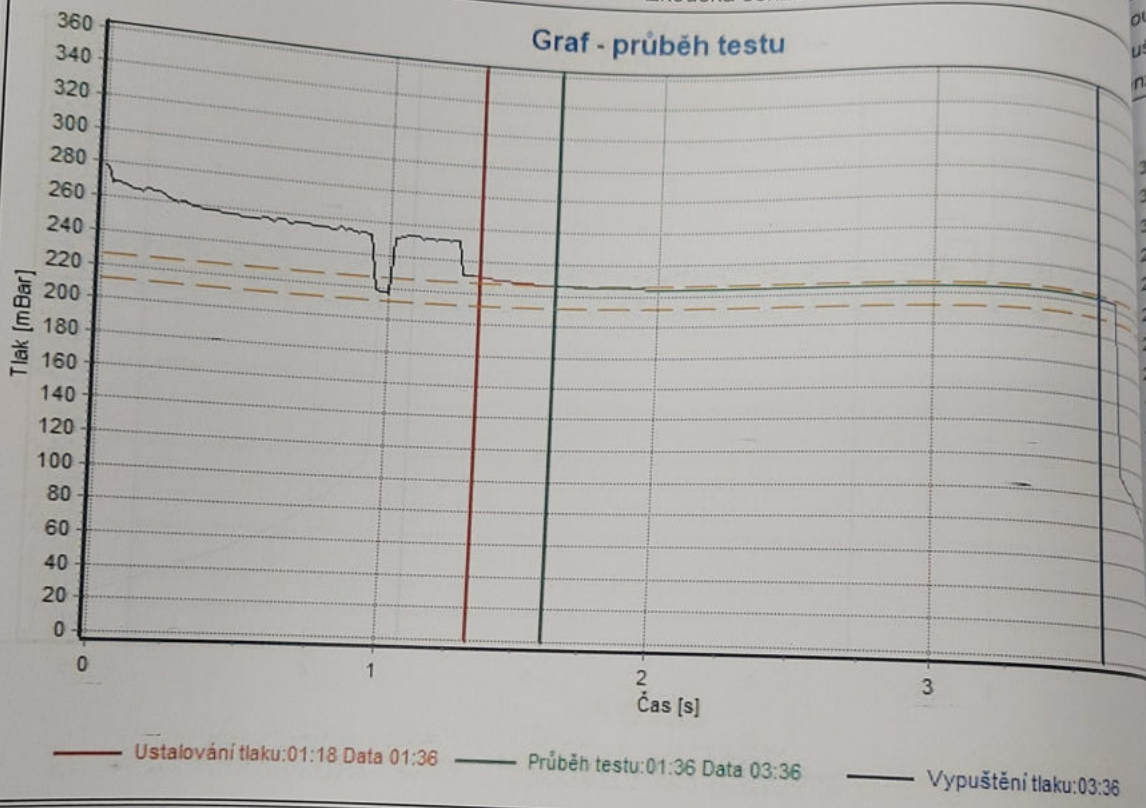

Plán:
Materiál: **Polypropylén**
Vnitřní ochrana: **Žádná**

Profil potrubí: **Kruhový**
Průměr: **250 mm**
Délka zkušební trati: **41,7 m**
Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **10:54:15** hodin.
Poznámka:

Test č.: **2**
Požadovaný minimální přetlak: **200 mBar**
Počáteční přetlak: **226,065**
Přípustná ztráta: **15 mBar**
Skutečná ztráta: **2,62 mBar**
Doba ustálení: **0:18 min**
Požadovaná doba zkoušky: **2:1 min**
Skutečná doba zkoušky: **2:2 min**

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crh

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-9**
K šachtě:	**ŠA3-8**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

oušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

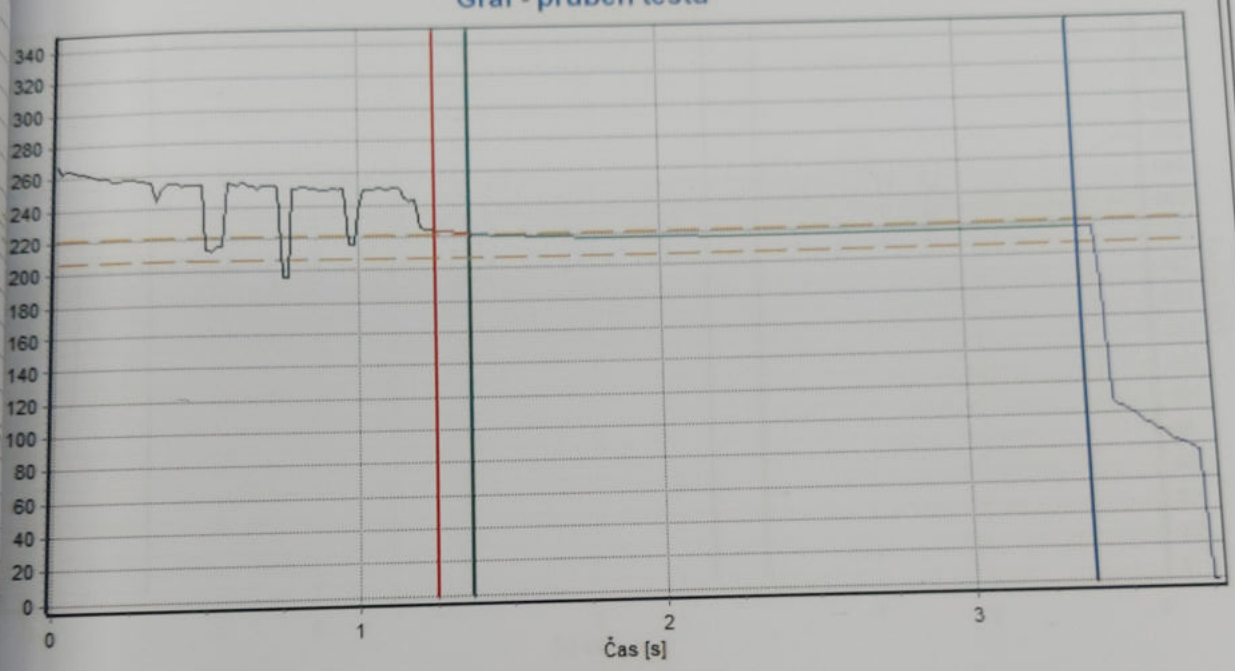

Ustalování tlaku:01:14 Data 01:21 — Průběh testu:01:21 Data 03:21 — Vypuštění tlaku:03:21

n:	
eriál:	**Polypropylén**
ční ochrana:	**Žádná**
fil potrubí:	**Kruhový**
měr:	**250 mm**
ka zkušební trati:	**28,3 m**

uška byla provedena **22.09.2022** ve **11:16:19** hodin.

známka:

Test č.:	**3**
Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Počáteční přetlak:	**221,617 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**4,96 mBar**
Doba ustálení:	**0:8 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

ýsledek: **Obstál ve zkoušce**

kazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA3-8
K šachtě:	ŠA3-7
Stanoviště:	
Město:	Obec Předslav
Ulice:	STOKA A3

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 V
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LD
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

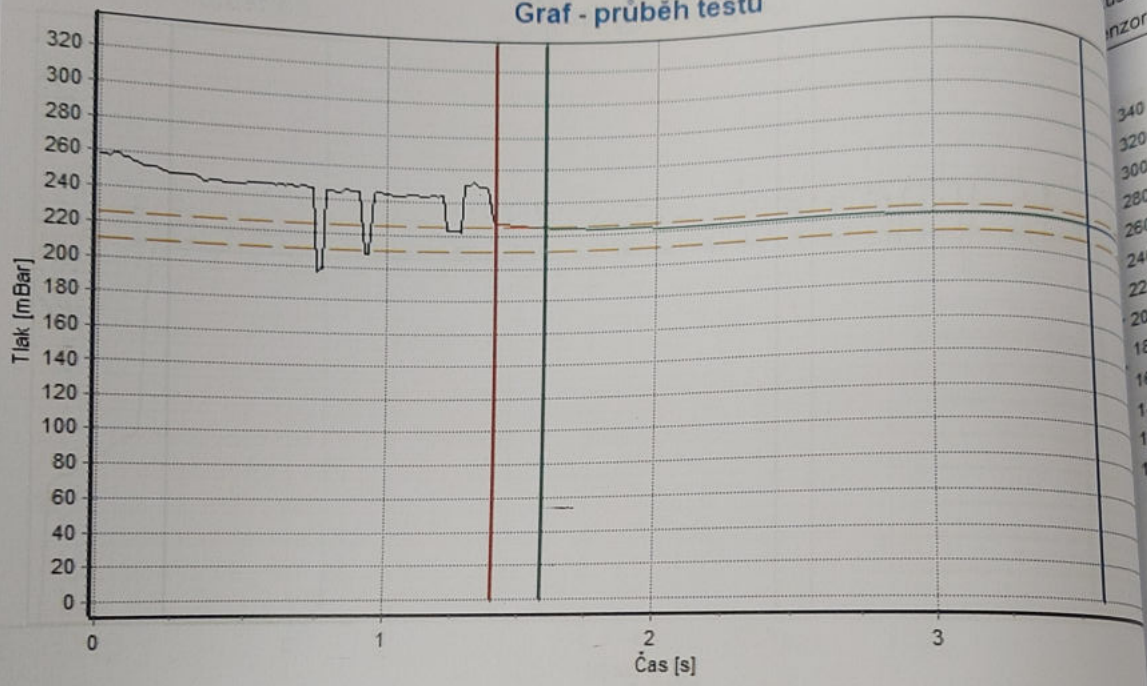

Plán:		Test č.:	4
Materiál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	200 mB
Vnitřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	224,871
		Přípustná ztráta:	15 mBar
Profil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	3,53 mB
Průměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:12 min
Délka zkušební trati:	32,8 m	Požadovaná doba zkoušky:	2:1 min
		Skutečná doba zkoušky:	2:2 min

Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **11:56:36** hodin.

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crh

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

EZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-7**
K šachtě:	**ŠA3-6**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

ouštějící:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
nzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

n:	
eriál:	**Polypropylén**
tční ochrana:	**Žádná**
fil potrubí:	**Kruhový**
měr:	**250 mm**
ka zkušební trati:	**35,2 m**

uška byla provedena **22.09.2022** ve **12:27:08** hodin.

známka:

Test č.:	**5**
Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Počáteční přetlak:	**231,914 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**4,39 mBar**
Doba ustálení:	**0:15 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

ýsledek: **Obstál ve zkoušce**

kazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA3-6
K šachtě:	ŠA3-4
Stanoviště:	
Město:	Obec Předslav
Ulice:	STOKA A3

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 V
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LD
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

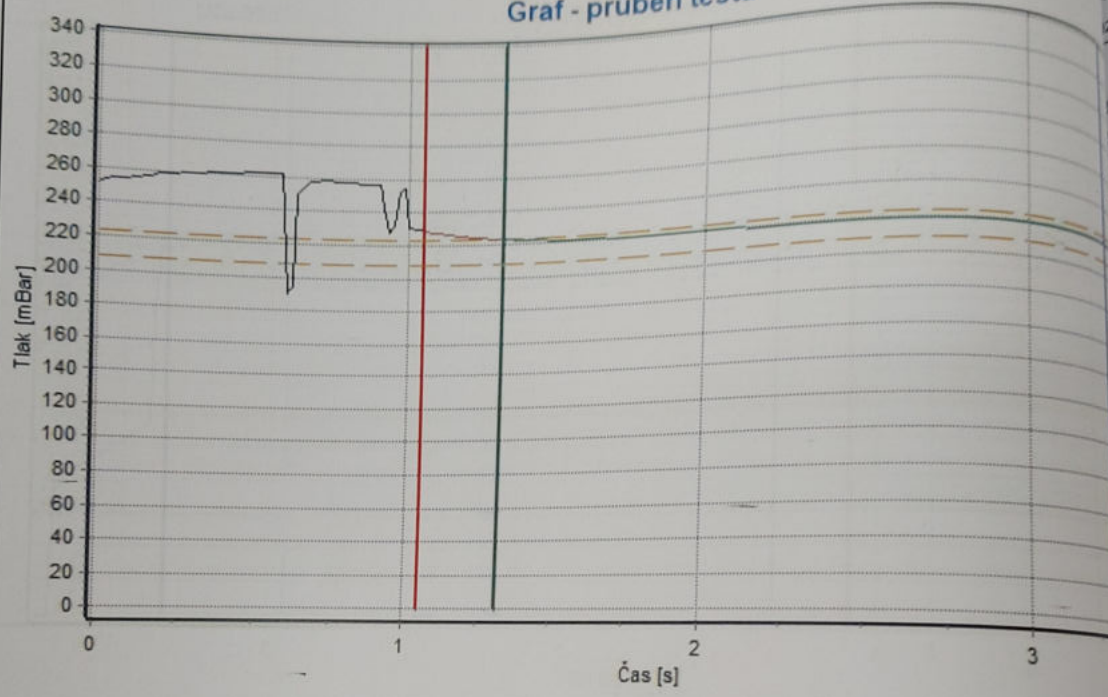

Plán:			
Materiál:	Polypropylén	Test č.:	6
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	200 mB
		Počáteční přetlak:	222,90
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mBa
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	4,06 mB
Délka zkušební trati:	57,6 m	Doba ustálení:	0:17 min
Zkouška byla provedena 22.09.2022 ve 12:33:24 hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	2:1 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	2:2 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Cr

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-2**
K šachtě:	**ŠA3-1**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

ušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
šební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
zor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

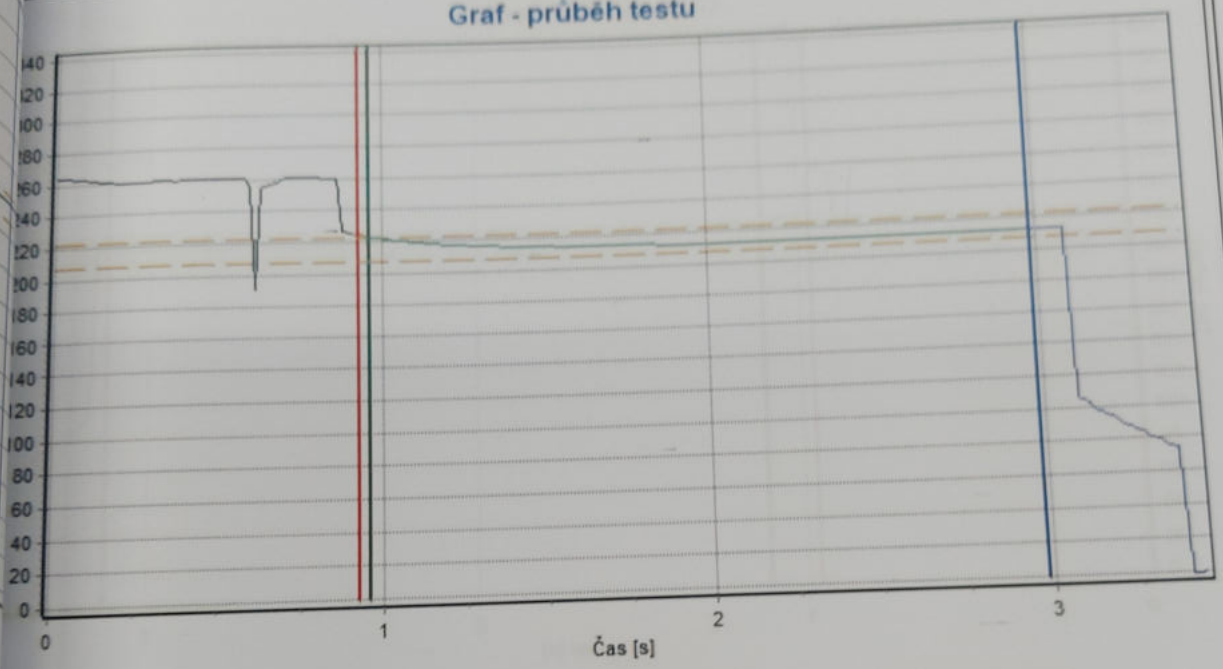

Ustalování tlaku:00:54 Data 00:56 — Průběh testu:00:56 Data 02:57 — Vypuštění tlaku:02:57

Test č.:	**7**
Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Počáteční přetlak:	**222,352 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**10,28 mBar**
Doba ustálení:	**0:3 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

::	
eriál:	**Polypropylén**
ční ochrana:	**Žádná**
il potrubí:	**Kruhový**
měr:	**250 mm**
ka zkušební trati:	**25,8 m**

uška byla provedena **22.09.2022** ve **12:52:16** hodin.

známka:

ýsledek: **Obstál ve zkoušce**

kazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA3-1
K šachtě:	ŠA15
Stanoviště:	
Město:	Obec Předslav
Ulice:	STOKA A3

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LD
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

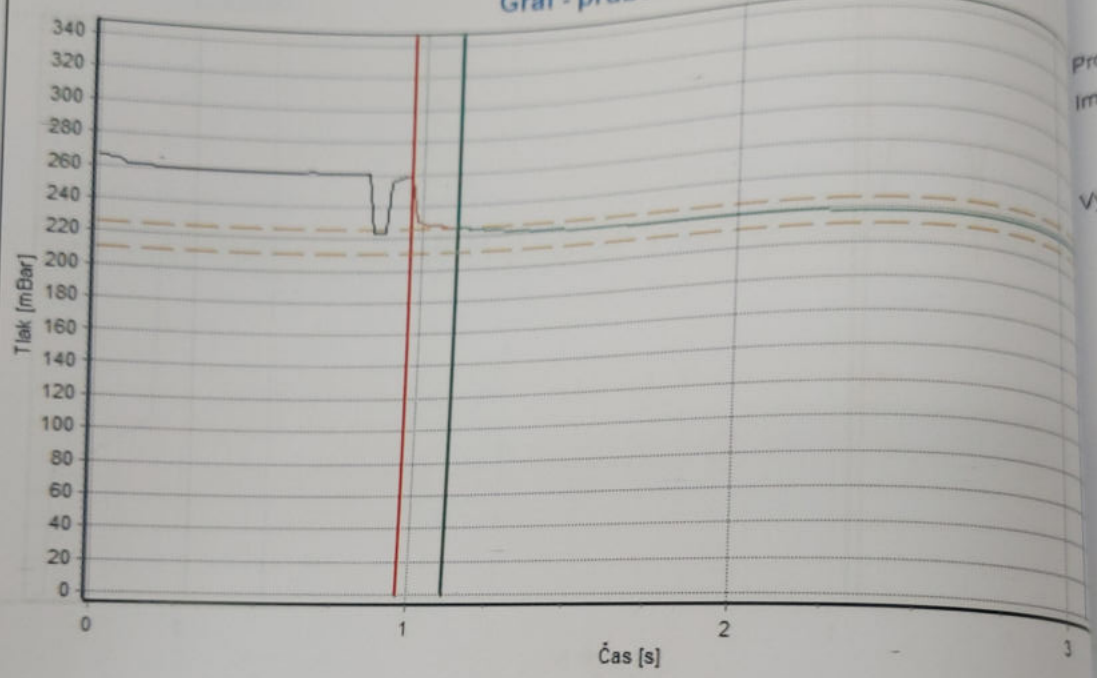

Plán:			
Materiál:	Polypropylén	Test č.:	8
Vnitřní ochrana:	Žádná	Požadovaný minimální přetlak:	200 mB
		Počáteční přetlak:	225,7
Profil potrubí:	Kruhový	Přípustná ztráta:	15 mB
Průměr:	250 mm	Skutečná ztráta:	7,23 m
Délka zkušební trati:	22,3 m	Doba ustálení:	0:10 m
Zkouška byla provedena 22.09.2022 ve 13:21:53 hodin.		Požadovaná doba zkoušky:	2:1 min
Poznámka:		Skutečná doba zkoušky:	2:2 min

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel C

Testované úseky celkem: 8 o ce
Otestováno 8 potrubí, z toho
Délka testovaného potrubí c
Otestováno 0 šachet, z toh
Hloubka testovaných šache

Pro:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-

Vypracoval:

odavatel:

Souhrn

Testované úseky celkem: **8** o celkové délce: **278,1 m.**

Otestováno **8** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **278,1 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Vypracoval:

Dodavatel: Zákazník:

.....

.....

SEZAKO
Ekologické služby

Monitoring kanalizace
středisko Prostějov
J.B. Pecky 14, 796 01 Prostějov
tel.: +420 582 336 366
www.sezako.cz, sezako@sezako.cz

Monitorování kanalizace pro:

Imos Brno, a.s.

místo: *Obec Předslav*
ulice (stoka): STOKA A, A1, A3
STOKA B, B2, B2-1

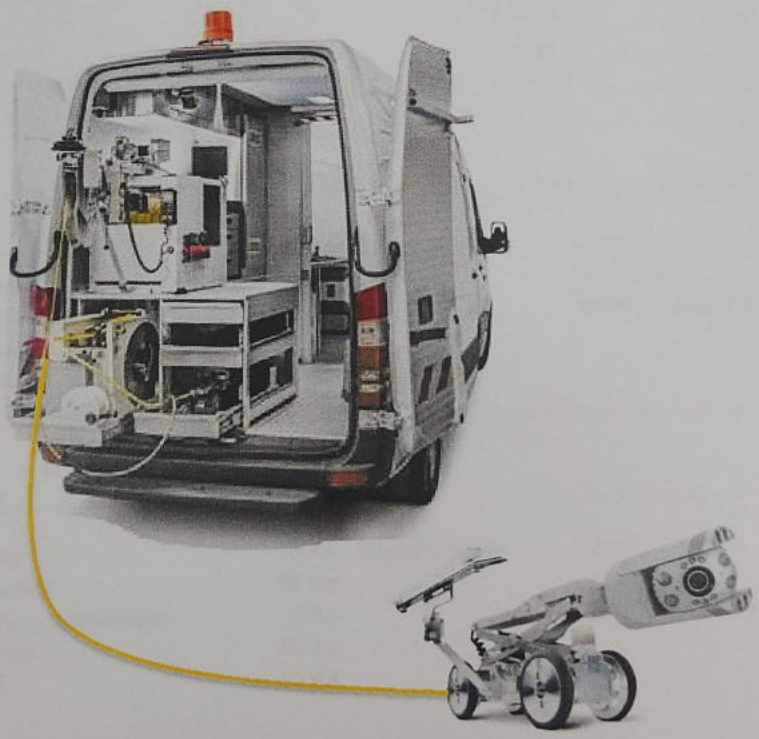

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsek - statistika

22.09.2022 - 22.09.2022

Druh odvodnění: Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Ulice	Materiál	Insp. délka [m]	Roz. [mm]	Fota
22.09.2022	STOKA A, ŠA-12_ŠA-11		PP-Polypropylen	44,00	250 / 250	6
22.09.2022	STOKA A, ŠA-13_ŠA-12		PP-Polypropylen	15,90	250 / 250	2
22.09.2022	STOKA A, ŠA-18_ŠA-17		PP-Polypropylen	20,30	250 / 250	1
22.09.2022	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1		PP-Polypropylen	15,00	300 / 300	0
22.09.2022	STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3		PP-Polypropylen	51,60	250 / 250	1
22.09.2022	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4		PP-Polypropylen	30,00	300 / 300	0
22.09.2022	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5		PP-Polypropylen	32,70	300 / 300	1
22.09.2022	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3		PP-Polypropylen	25,30	250 / 250	0
22.09.2022	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4		PP-Polypropylen	26,00	250 / 250	1
22.09.2022	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15		PP-Polypropylen	22,30	250 / 250	0
22.09.2022	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10		PP-Polypropylen	34,40	250 / 250	1
22.09.2022	STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1		PP-Polypropylen	25,80	250 / 250	0
22.09.2022	STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4		PP-Polypropylen	57,60	250 / 250	5
22.09.2022	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7		PP-Polypropylen	32,80	250 / 250	4
22.09.2022	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8		PP-Polypropylen	28,30	250 / 250	4
22.09.2022	STOKA B, ŠB-2_ŠB-1		PP-Polypropylen	21,30	250 / 250	1
22.09.2022	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3		PP-Polypropylen	27,60	250 / 250	3
22.09.2022	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3		PP-Polypropylen	39,30	250 / 250	3

Rozměry pro Druh odvodnění: Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	18 Ks	Součet délek	Úseky	550,20 m
	Inspekce	18 Ks		Inspekce	550,20 m
	Monit. z protisměru	0 Ks		Monit. z protisměru	0,00 m
	Stanice	70 Ks			
	Fota	33 Ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	18 Ks	Součet délek	Úseky	550,20 m
	Inspekce	18 Ks		Inspekce	550,20 m
	Monit. z protisměru	0 Ks		Monit. z protisměru	0,00 m
	Stanice	70 Ks			
	Fota	33 Ks			

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**
horní šachta	ŠA-12
dolní šachta	ŠA-11

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	44,00 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	44,00 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-12
025	00:01:41	6,50	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
026	00:03:35	24,30	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Monitoring k
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-12_ŠA-11

horní šachta	ŠA-12
dolní šachta	ŠA-11

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku	**Inspektor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878
Délka inspekce	44,00 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
027	00:04:00	25,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
028	00:04:18	25,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, ku vložka
029	00:05:00	30,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, ku vložka
030	00:06:23	44,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:33	44,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-11

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hrade

Úsek STOKA A, ŠA-1

horní šachta	ŠA-12
dolní šachta	ŠA-11

Kmenová data

Délka úseku	44,00 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Směr znázornění: Ve směru proh

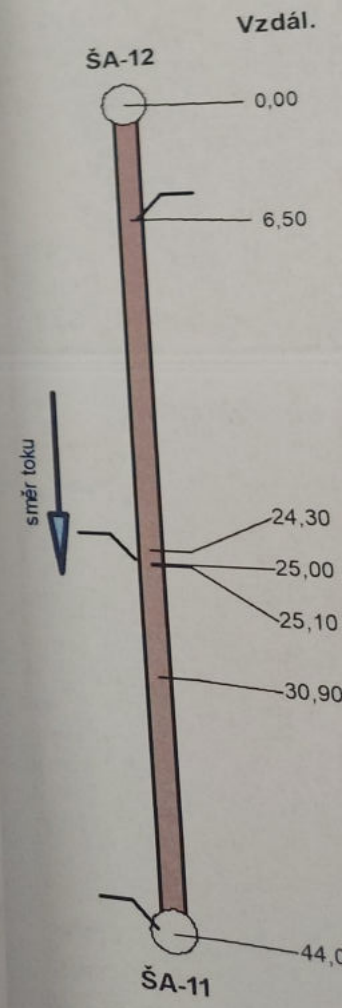

Vytištěno: 23.09.2022

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-11		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	44,00 m	**Insp. délka**	44,00 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

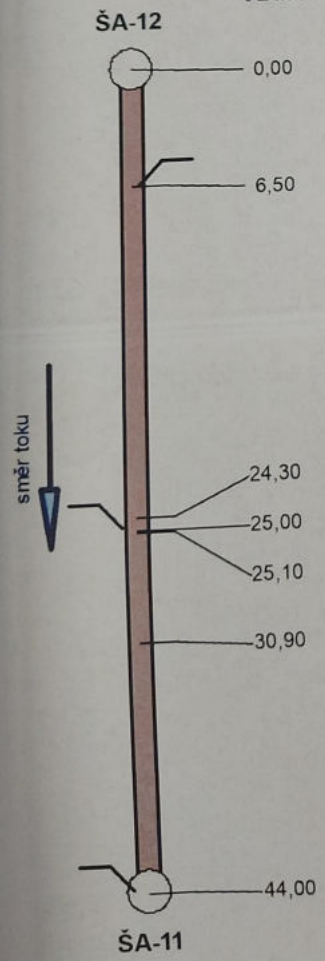

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-12
6,50	BCA.A.A 025		00:01:41	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
24,30	BCB.Z 026		00:03:35	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
25,00	BCA.A.A 027		00:04:00	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
25,10	BCB.Z 028		00:04:18	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
30,90	BCB.Z 029		00:05:00	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
44,00	BCA.A.A 030		00:06:23	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	BCE.A		00:06:33	Koncový uzel, Šachta, ŠA-11

Monitoring ka
tel.: +420 731 617 1
jcechy@sezako.cz

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**	**Datum insp**	
horní šachta	ŠA-12	**Rozměr**	
dolní šachta	ŠA-11	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vo hladiny v uz
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

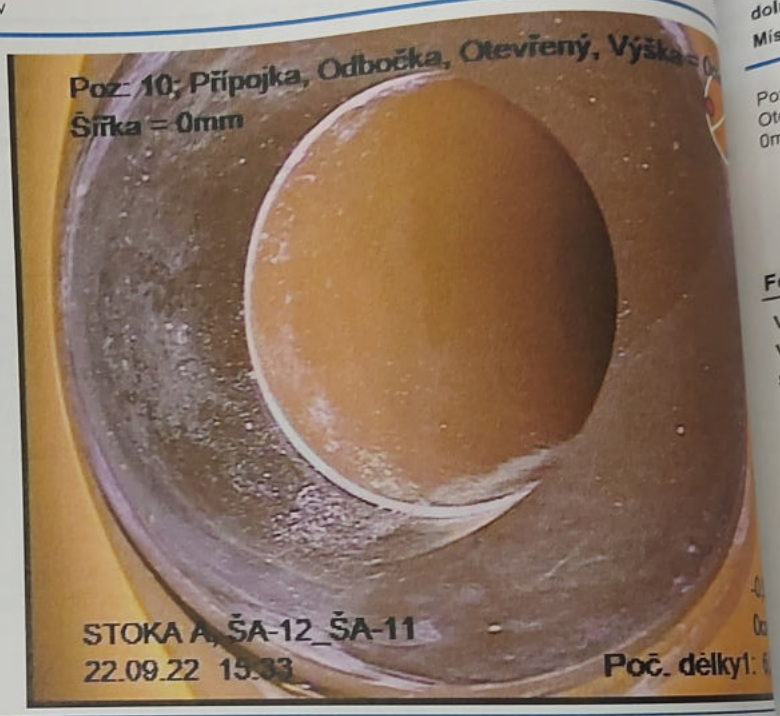

Fotografie	**025**
Video	00:01:41
Vzdál. ve směru tok	6,50 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	10
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

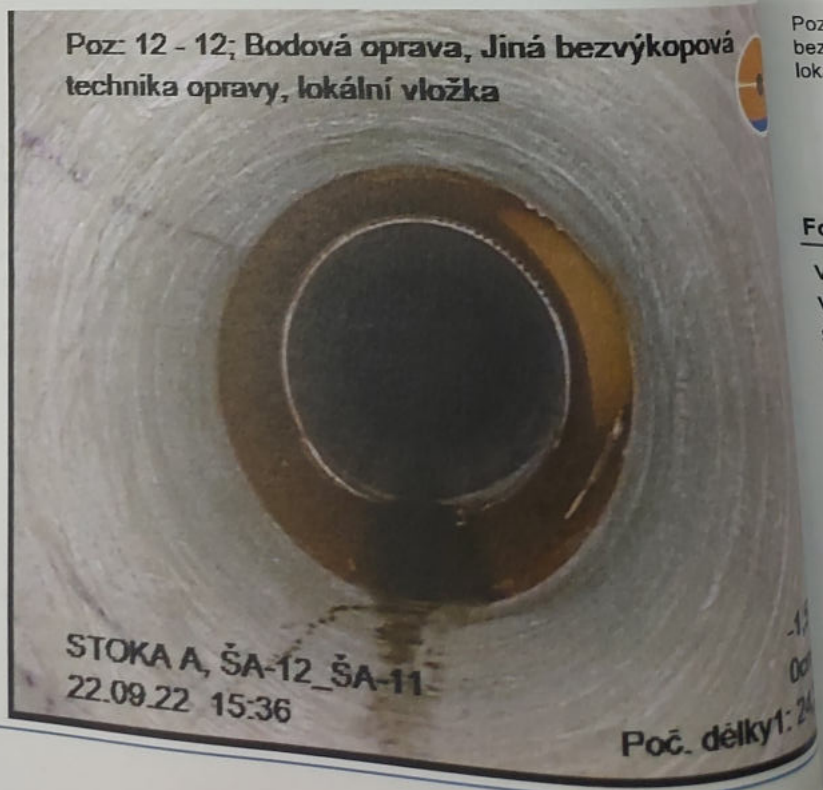

Fotografie	**026**
Video	00:03:35
Vzdál. ve směru tok	24,30 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠA-11	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**027**
Video	00:04:00
Vzdál. ve směru tok	25,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

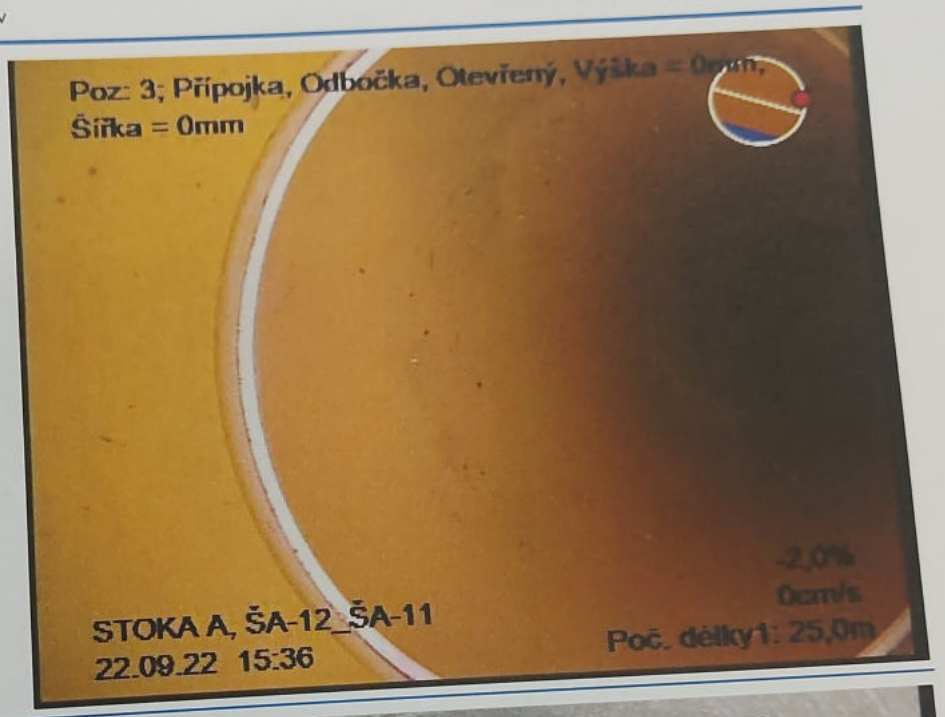

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	**028**
Video	00:04:18
Vzdál. ve směru tok	25,10 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

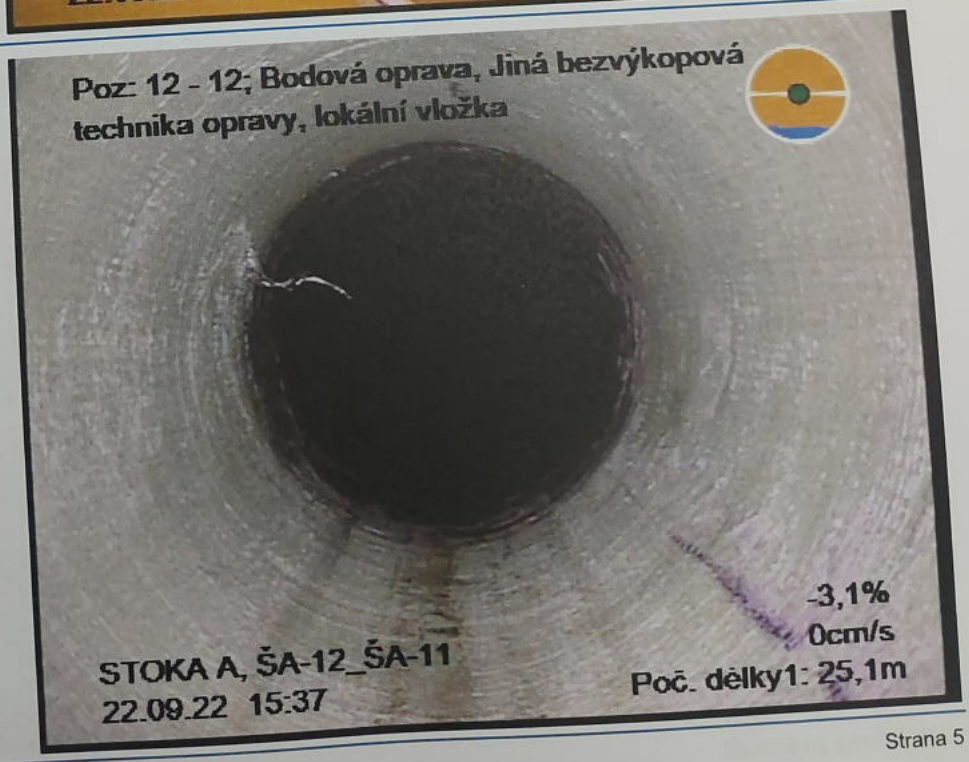

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-12_ŠA-11		
horní šachta	ŠA-12	Datum insp	
dolní šachta	ŠA-11	Rozměr	
Místní část/ulice	Obec Předslav	Druh kanaliz	Systém odpadní vo hladiny v ka

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	029
Video	00:05:00
Vzdál. ve směru tok	30,90 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

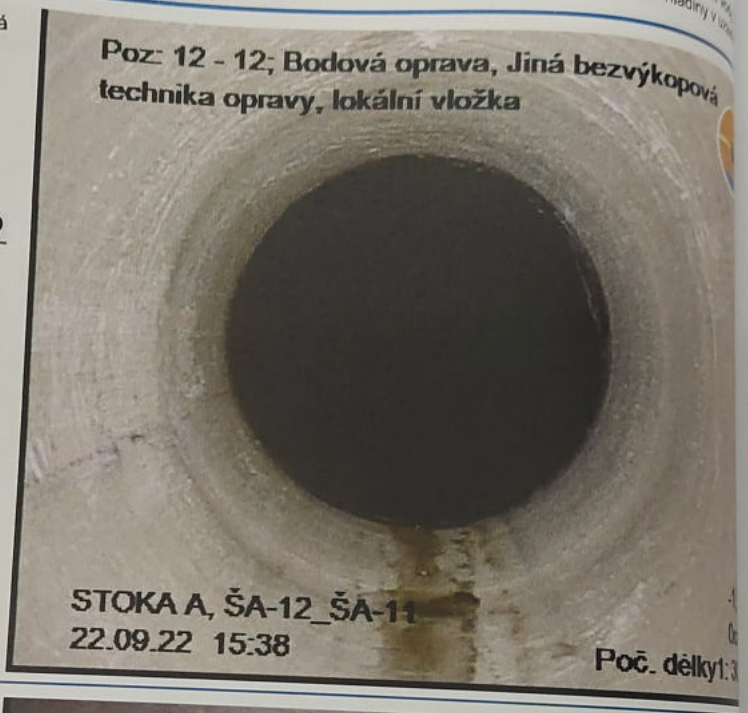

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	030
Video	00:06:23
Vzdál. ve směru tok	44,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

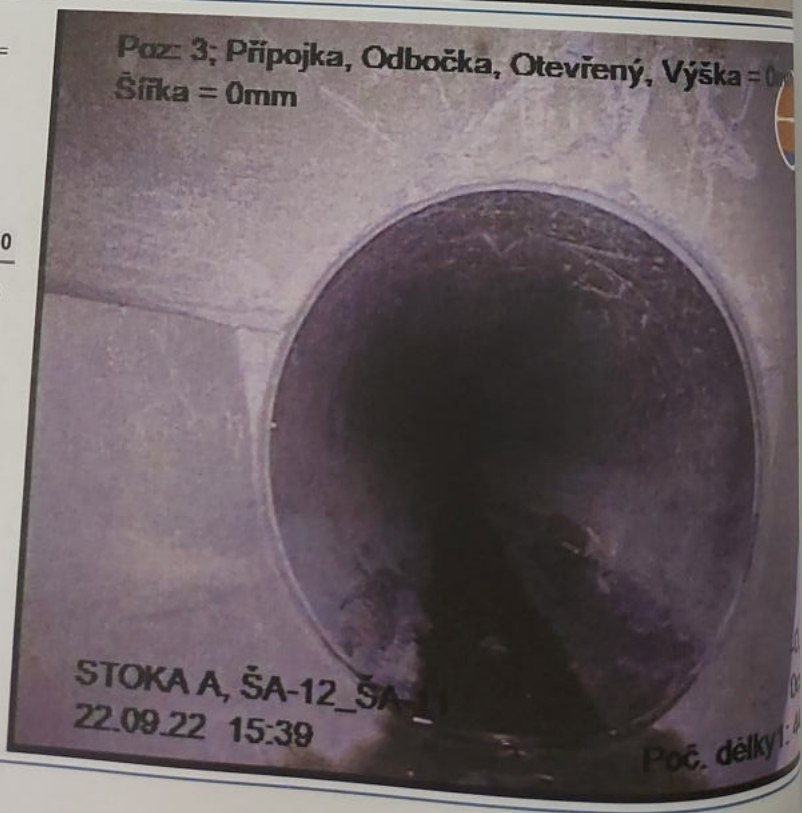

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • H

Úsek	STOKA
horní šachta	ŠA-12
dolní šachta	ŠA-11
Druh kanalizace	Systém hladiny
Materiál	Polypro

Data sklonu

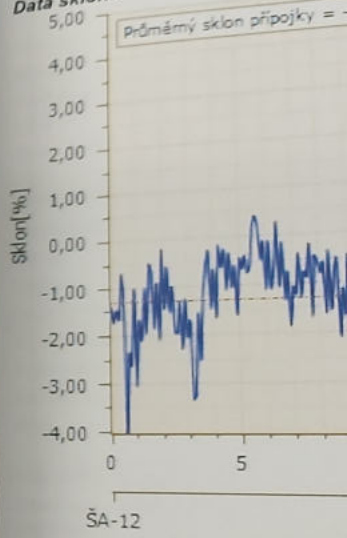

Vytištěno: 23.09.2022

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-11	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	44,00 m

Data sklonu

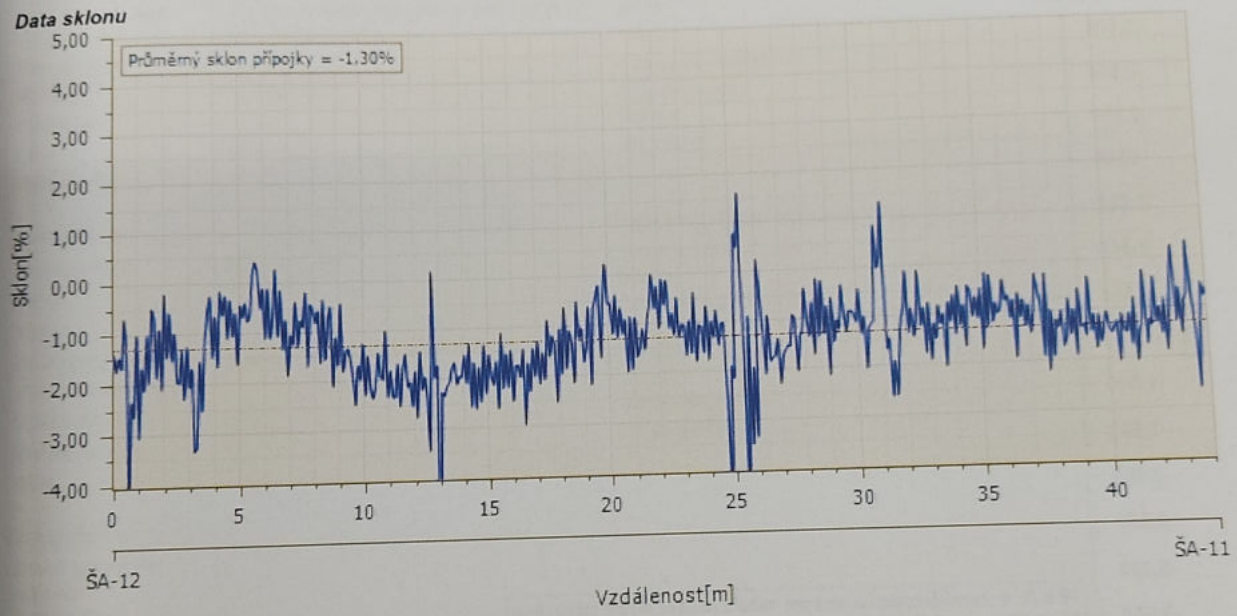

Monitoring kan
tel.: +420 731 617 15
jcechy@sezako.cz, ww

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-11	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 60
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	44,00 m

Výškový profil

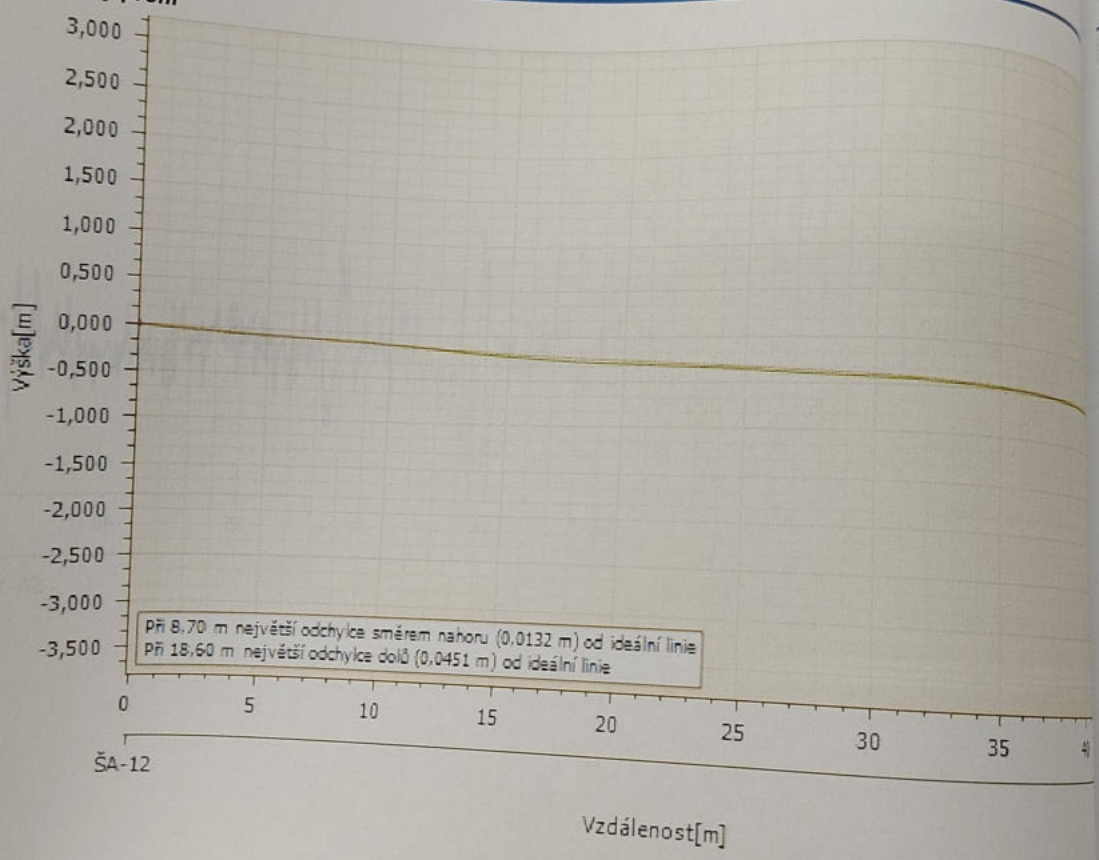

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha •

Úsek	**STOKA A**
horní šachta	ŠA-13
dolní šachta	ŠA-12

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	15,90 m
Druh kanalizace	Systém odp v uzavřené
Rok výroby	
Materiál	Polypropyle
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový p
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve smě
Délka inspekce	15,90 m
Vzdál. referenčního bodu	Středo inspek
Druh inspekce	Kamer
Proces inspekce	TV-pro
Poznámka	

Fotografie	Video	Vz
	00:00:05	
023	00:01:05	
024	00:02:57	

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A, ŠA-13_ŠA-12**
horní šachta	ŠA-13
dolní šachta	ŠA-12

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	15,90 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody	
WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	15,90 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-13
023	00:01:05	1,00	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
024	00:02:57	14,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Monitoring k
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	STOKA A, ŠA-13_ŠA-12
horní šachta	ŠA-13
dolní šachta	ŠA-12

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 87
Délka inspekce	15,90 m	Počasí	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	
Poznámka		Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:03:44	15,90	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-12

SEZAKO
Ekologické slu
Prostějov • Praha

Úsek	STOKA
horní šachta	ŠA-13
dolní šachta	ŠA-12

Kmenová data	
Délka úseku	15,90 m
Město	Obec Př
Ulice	
Materiál	Polyprop
Druh profilu	Kruhový
Rozměr [mm]	250 / 25

Směr znázornění: Ve sm

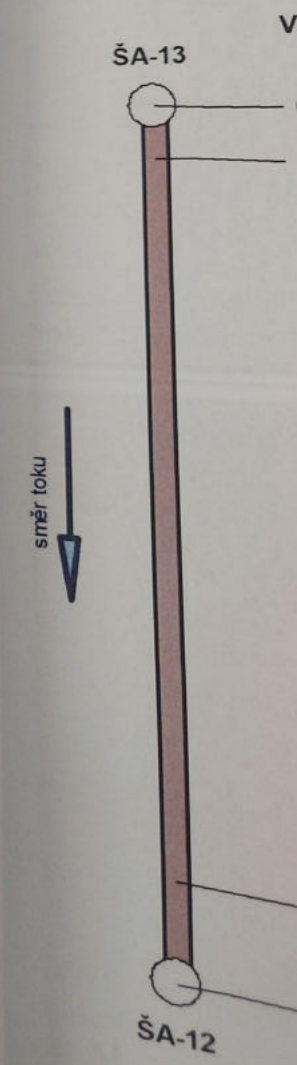

Vytištěno: 23.09.

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-13_ŠA-12**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-13	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-12		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	15,90 m	**Insp. délka**	15,90 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-13
1,00	BCB.Z	023	00:01:05	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
14,10	BCB.Z	024	00:02:57	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
15,90	BCE.A		00:03:44	Koncový uzel, Šachta, ŠA-12

Monitoring ka
tel.: +420 731 617 1
jcechy@sezako.cz

Obrazová zpráva úseku

Úsek			
horní šachta	STOKA A, ŠA-13_ŠA-12	Datum insp	
dolní šachta	ŠA-13	Rozměr	
Místní část/ulice	ŠA-12	Druh kanaliz	Systém odpadní vo hladiny v uzav
	Obec Předslav		

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

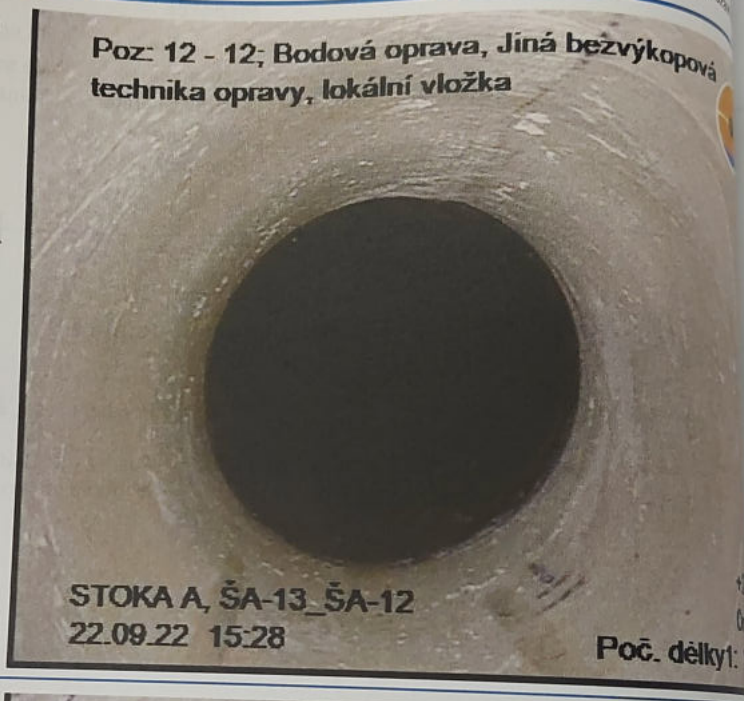

Fotografie	023
Video	00:01:05
Vzdál. ve směru tok	1,00 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

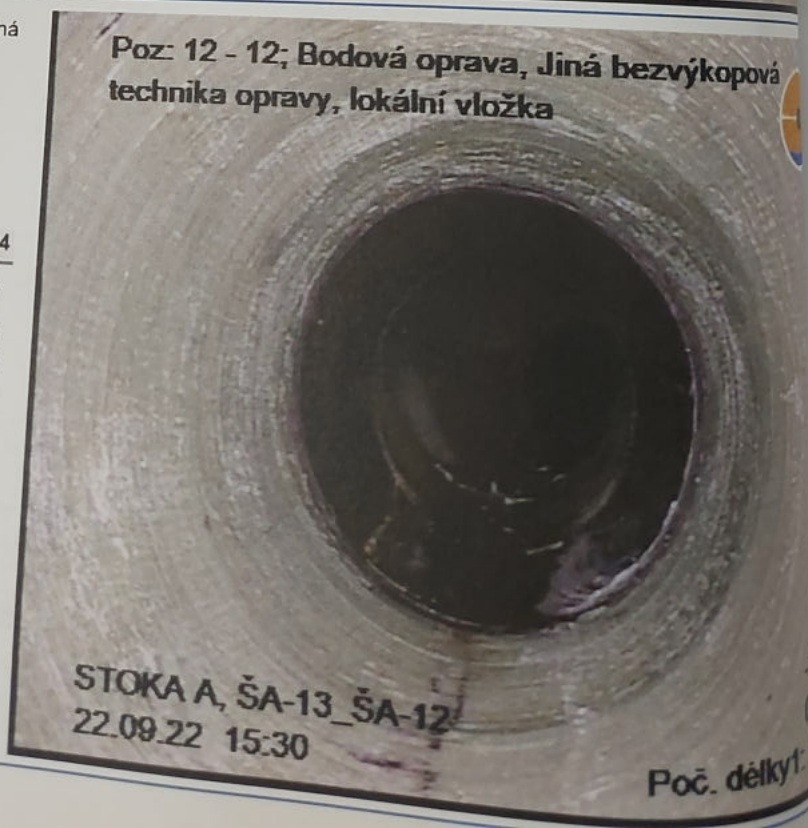

Fotografie	024
Video	00:02:57
Vzdál. ve směru tok	14,10 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Úsek	STO
horní šachta	ŠA-1
dolní šachta	ŠA-1
Druh kanalizace	Syst hlad
Materiál	Poly

Data sklonu

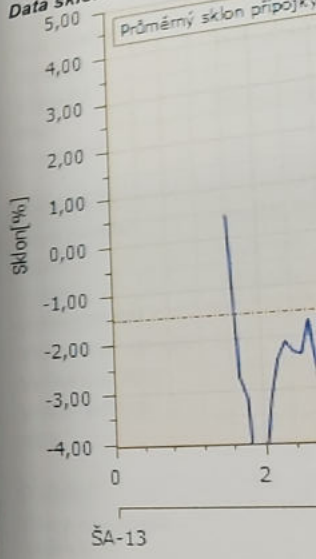

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA-13_ŠA-12**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-13	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-12	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	15,90 m

Data sklonu

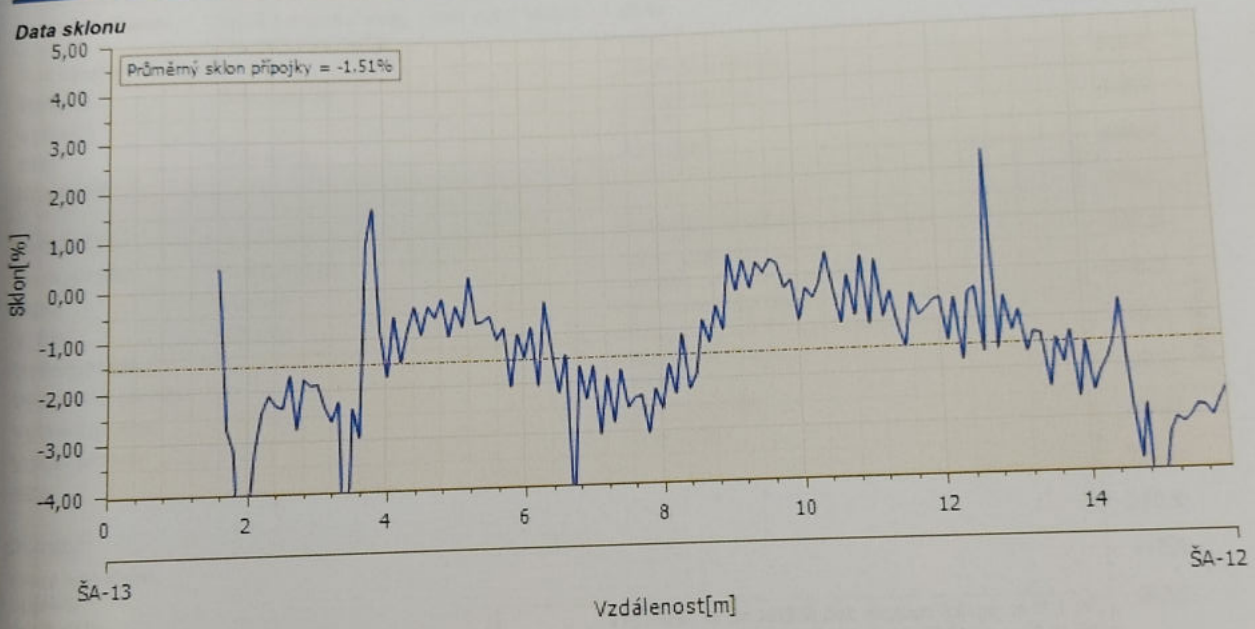

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	**STOKA A, ŠA-13_ŠA-12**	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA-13	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA-12	**Výška dna dole**	
Materiál	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel.
	Polypropylen	**Délka úseku**	15,90 m

Výškový profil

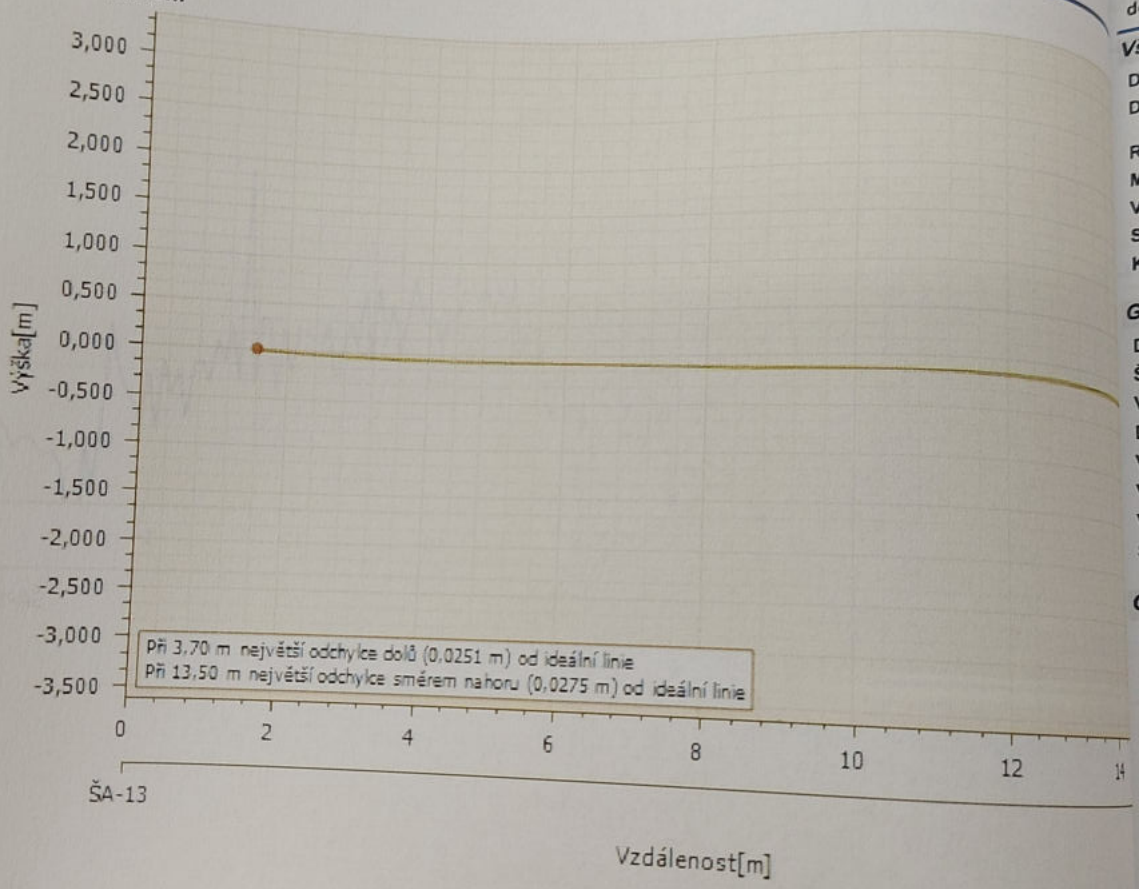

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A, ŠA-18_ŠA-17**
horní šachta	ŠA-18
dolní šachta	ŠA-17

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	20,30 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	20,30 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:06	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-17
001	00:03:26	18,60	BCA.A.A		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:21	20,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-18

Grafika úseku

Úsek			
horní šachta	**STOKA A, ŠA-18_ŠA-17**	**Datum insp**	
	ŠA-18	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vo hladiny v
dolní šachta	ŠA-17		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	20,30 m	**Insp. délka**	20,30 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Proti směru proudění
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-17
18,60	BCA.A.A	001	00:03:26	Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, V 0mm, Šířka = 0mm
20,30	BCE.A		00:04:21	Koncový uzel, Šachta, ŠA-18

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-18_ŠA-17	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-18	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠA-17	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**001**
Video	00:03:26
Vzdál. proti směru t	18,60 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2 - 3
Datový nosič	

Monitoring k
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA-18_ŠA-17**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-18	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-17	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel.
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	20,30 m

Data sklonu

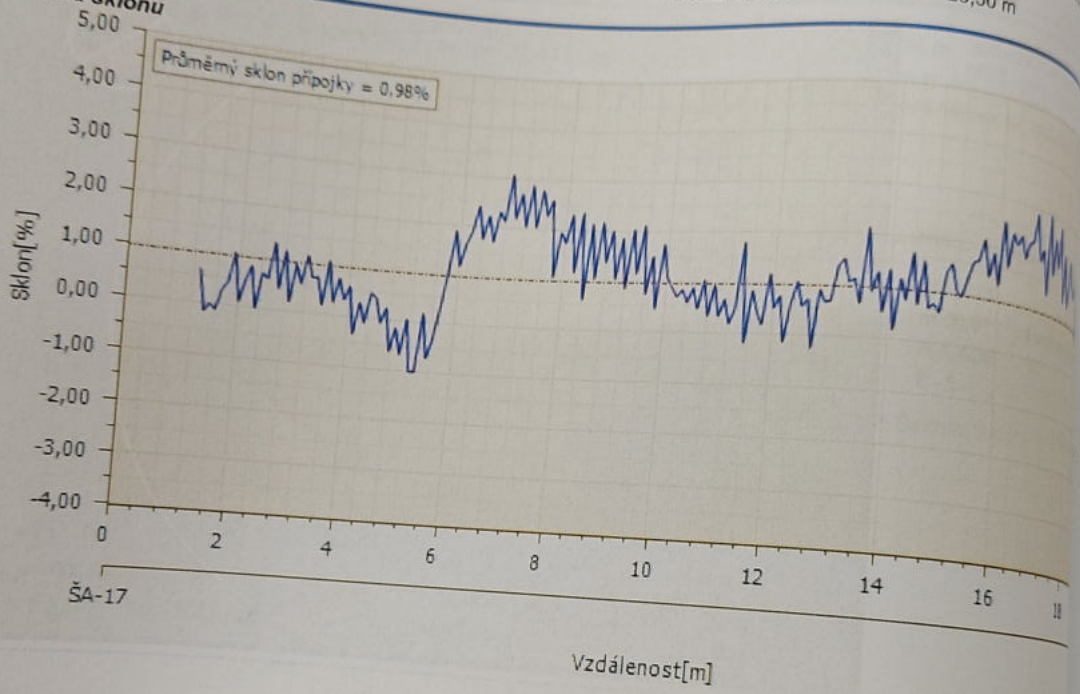

SEZAKO
Ekologické služb
Prostějov • Praha •

Úsek	STO
horní šachta	ŠA-1
dolní šachta	ŠA-1
Druh kanalizace	Systé hladi
Materiál	Polyp

Výškový profil

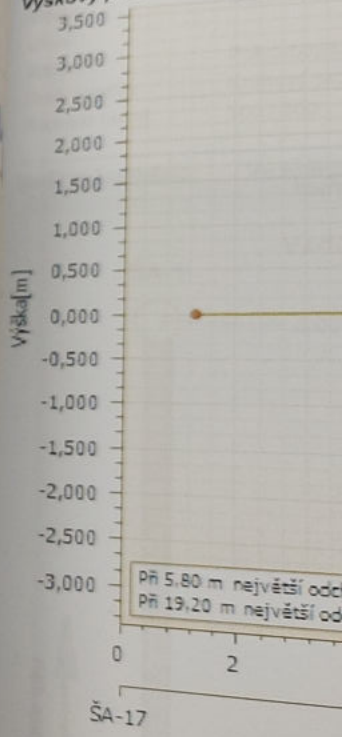

Vytištěno: 23.09.2022

Monitoring kanalizace
tel.. +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA-18_ŠA-17**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-18	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-17	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	20,30 m

Výškový profil

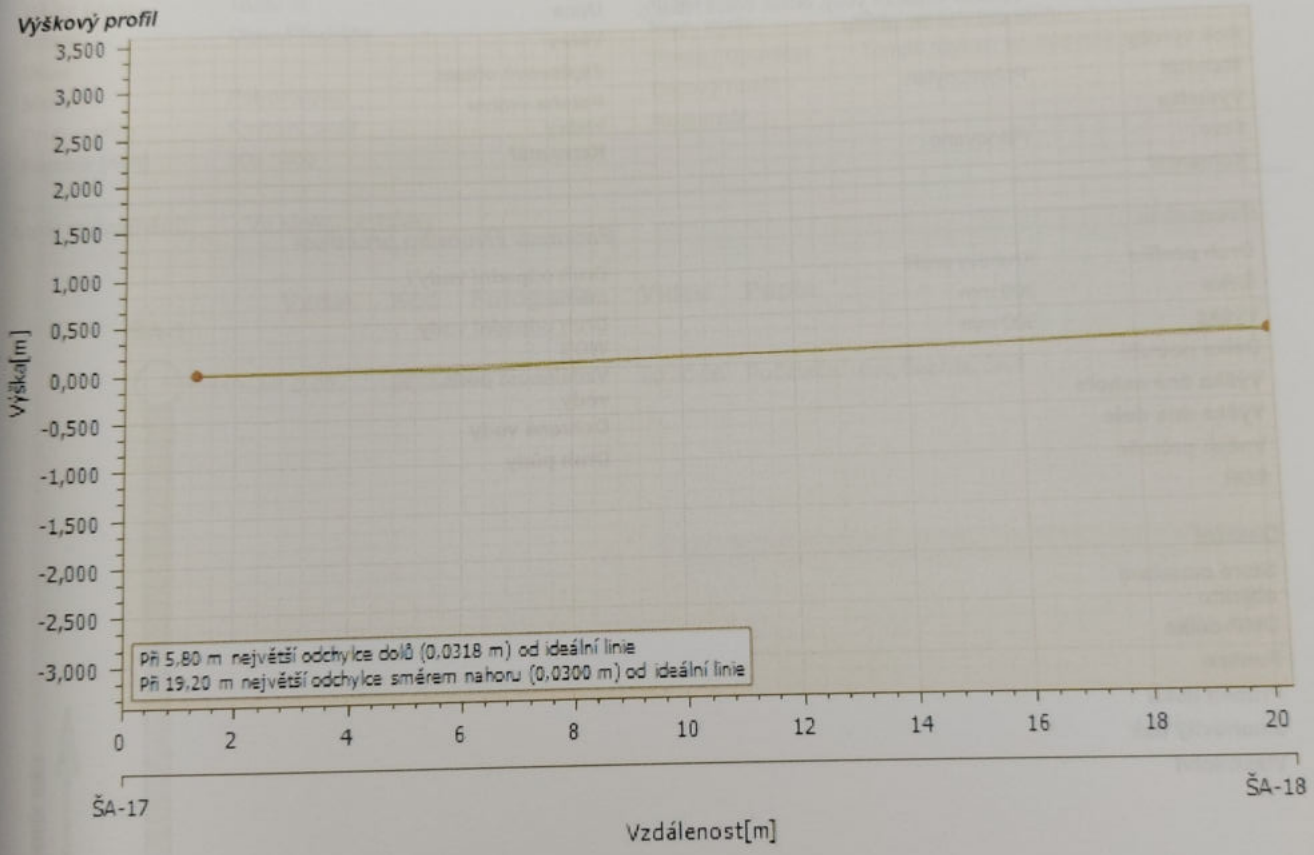

Monitoring k
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-2_ŠA-1

horní šachta	ŠA-2
dolní šachta	ŠA-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	15,00 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	15,00 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:06	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-1
	00:02:53	15,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-2

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha •

Úsek STOKA A,

horní šachta	ŠA-2
dolní šachta	ŠA-1

Kmenová data

Délka úseku	15,00 m
Město	Obec Předsla
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Směr znázornění: Ve směru p

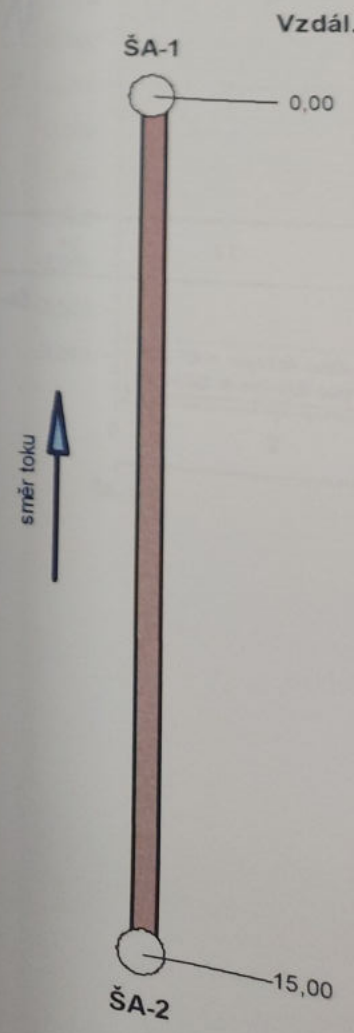

Vytištěno: 23.09.2022

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-2_ŠA-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-2	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-1		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	15,00 m	**Insp. délka**	15,00 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Proti směru proudění
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	300 / 300		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:06	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-1
15,00	BCE.A		00:02:53	Koncový uzel, Šachta, ŠA-2

Monitoring
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA-2_ŠA-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-2	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-1	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlynek
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	15,00 m

Data sklonu

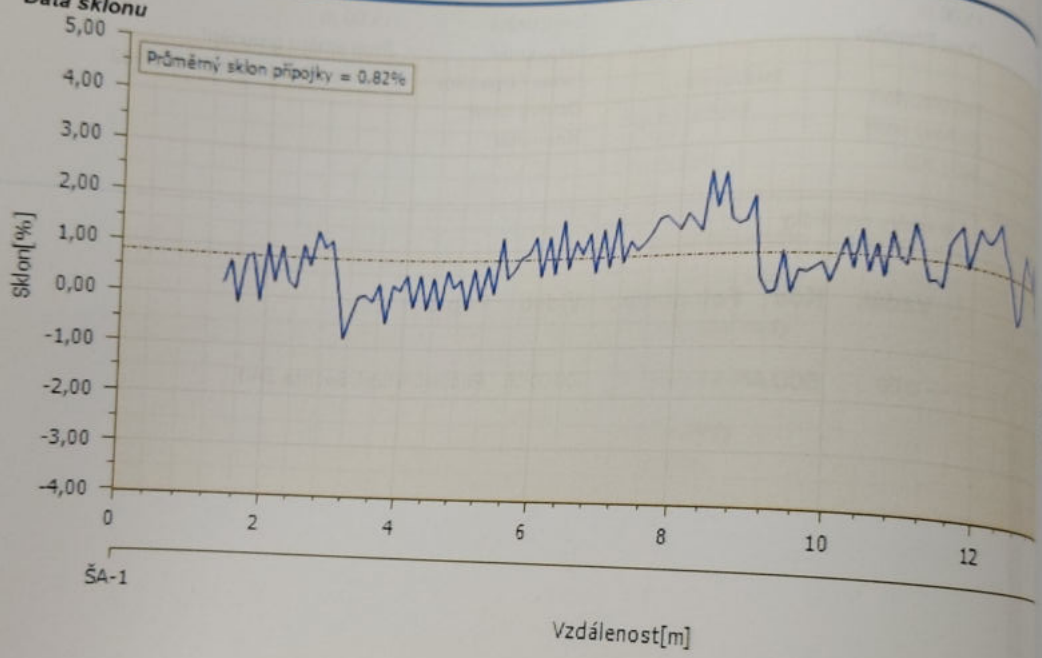

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha •

Úsek	**STOKA**
horní šachta	ŠA-2
dolní šachta	ŠA-1
Druh kanalizace	Systém hladiny
Materiál	Polypr

Výškový profil

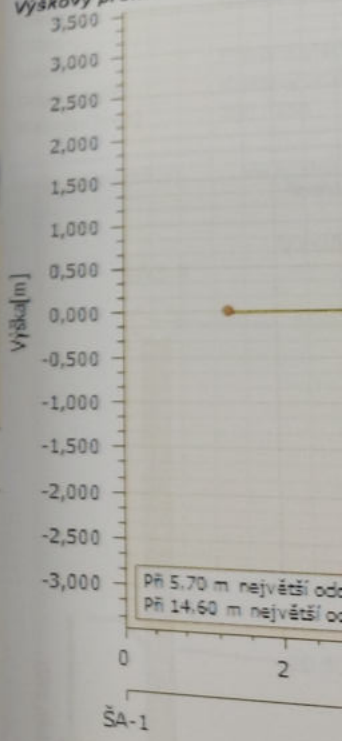

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-2	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA-1	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	15,00 m

Výškový profil

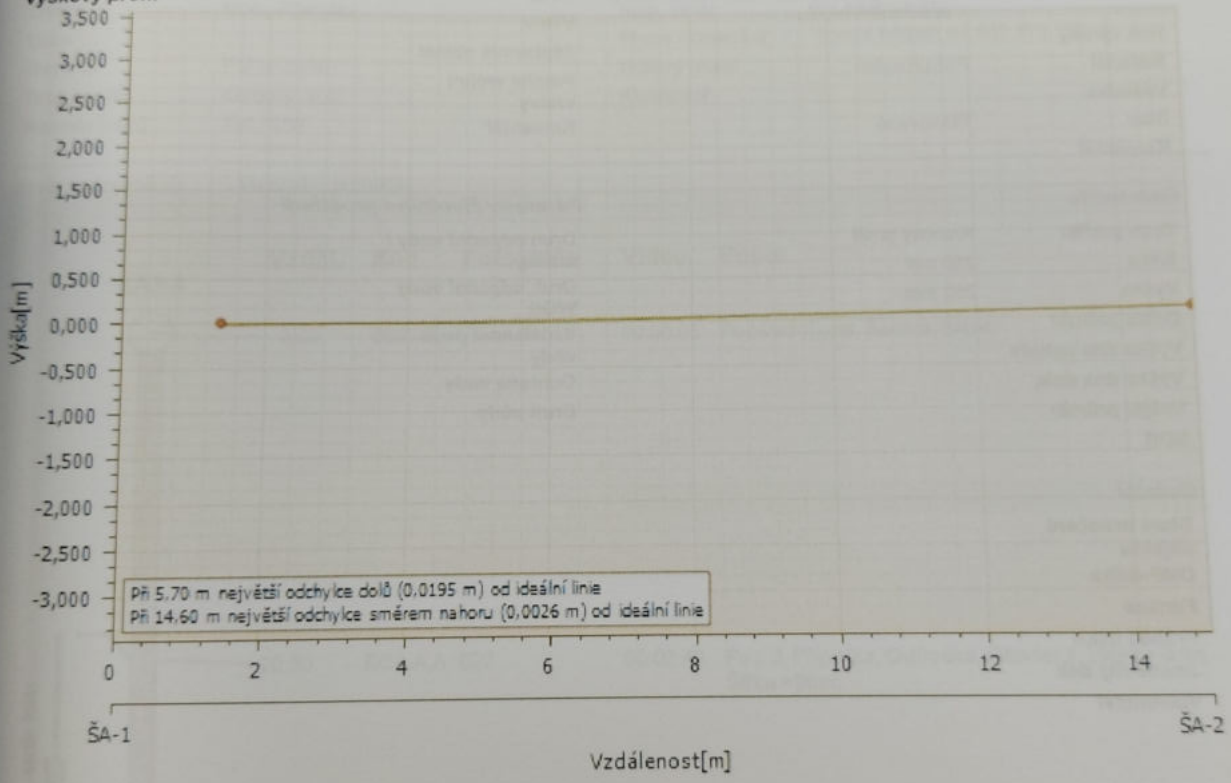

Monitoring k
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	
horní šachta	STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3
dolní šachta	ŠA3-4
	ŠA3-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	51,60 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	51,60 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 1
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-4
022	00:02:40	20,50	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:12	51,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-3

SEZAKO
Ekologické služ
Prostějov • Praha

Úsek	STOKA
horní šachta	ŠA3-4
dolní šachta	ŠA3-3

Kmenová data

Délka úseku	51,60 m
Město	Obec Před
Ulice	
Materiál	Polypropyl
Druh profilu	Kruhový p
Rozměr [mm]	250 / 250

Směr znázornění: Ve směr

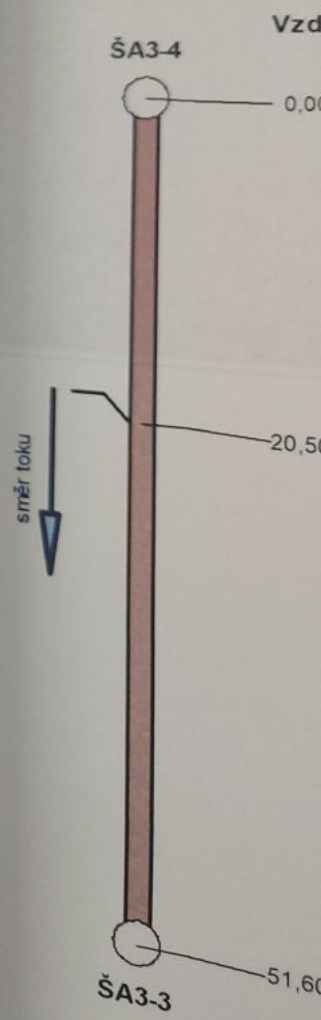

Vytištěno: 23.09.2022

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-4	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA3-3		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	51,60 m	**Insp. délka**	51,60 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-4
20,50	BCA.A.A 022		00:02:40	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
51,60	BCE.A		00:06:12	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-3

Monitoring kanalizac
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako
SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřim

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3	Datum insp	22.0
horní šachta	ŠA3-4	Rozměr	25
dolní šachta	ŠA3-3	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odto hladiny v uzavřeném
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

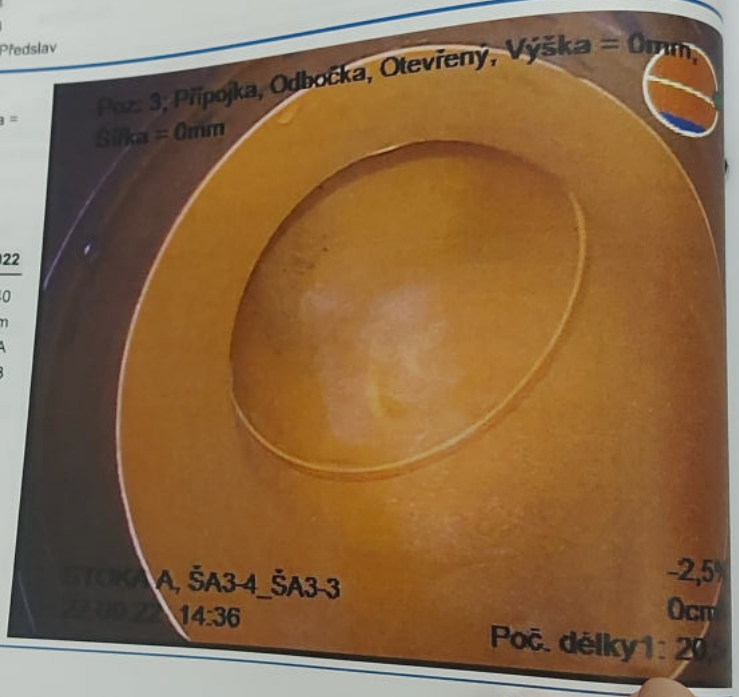

Fotografie	022
Video	00:02:40
Vzdál. ve směru tok	20,50 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

SEZAK
Ekologické
Prostějov • Prah

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

Materiál

Data sklonu

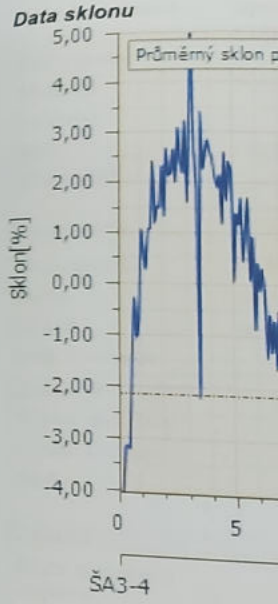

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-4	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA3-3	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	51,60 m

Data sklonu

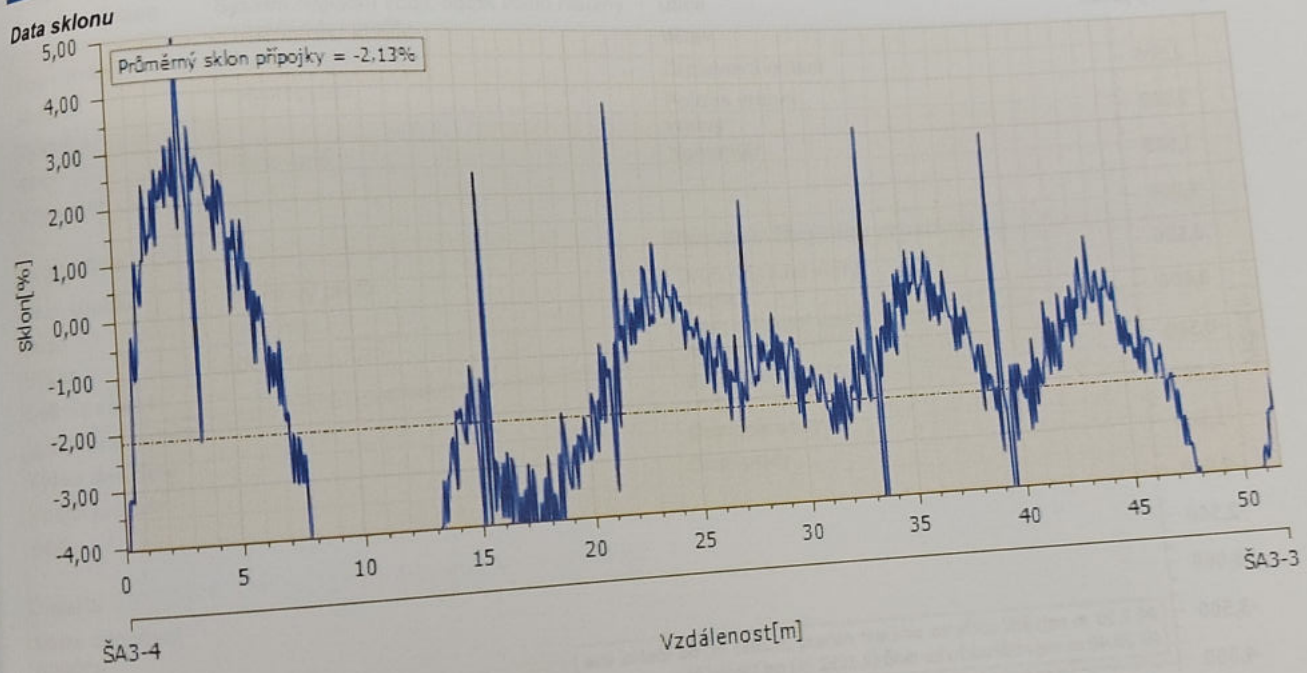

Monitoring kanalizac
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-4	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA3-3	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 1[illegible]
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	51,60 m

Výškový profil

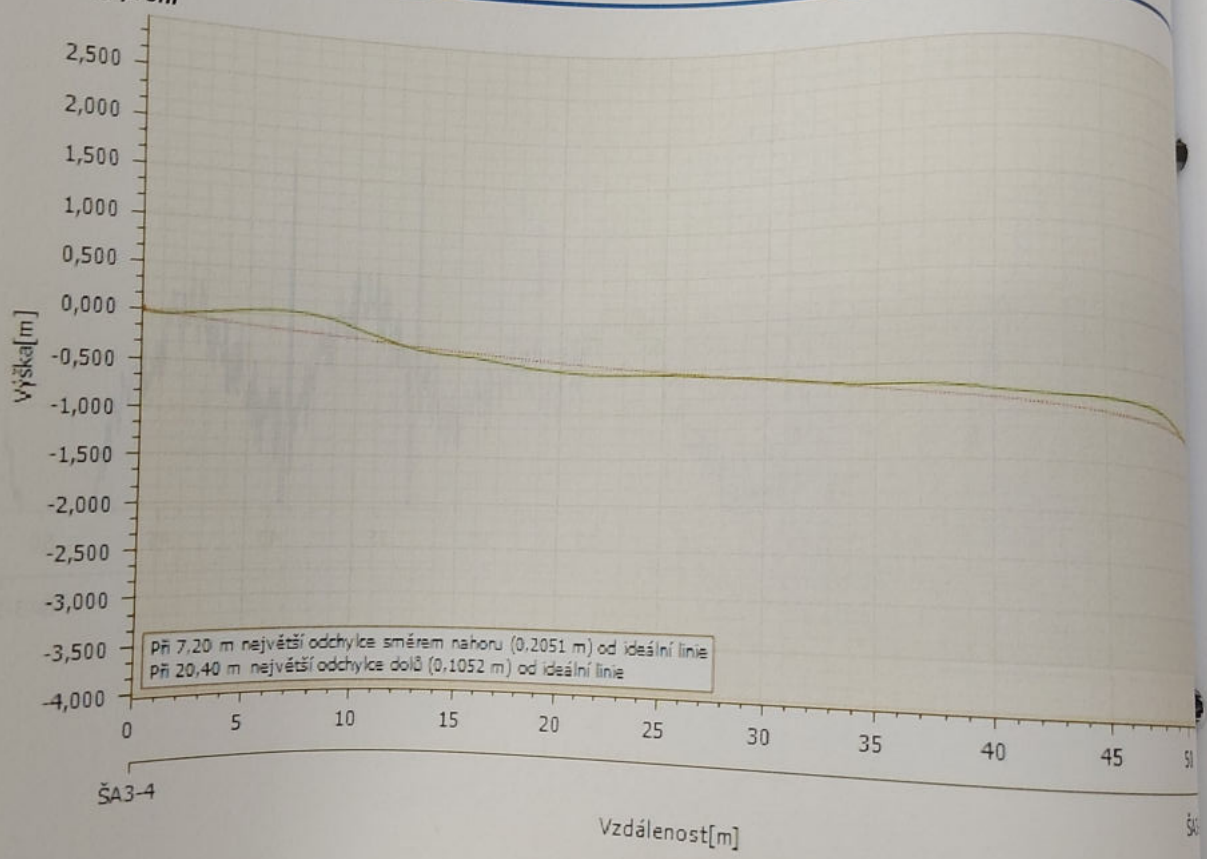

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A, ŠA-5_ŠA-4**
horní šachta	ŠA-5
dolní šachta	ŠA-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	30,00 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	30,00 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-5
	00:03:39	30,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-4

Grafika úseku

Úsek

horní šachta	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4 ŠA-5	Datum insp	
dolní šachta	ŠA-4	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, s hladiny v uzavř

Kmenová data

Délka úseku	30,00 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	30,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

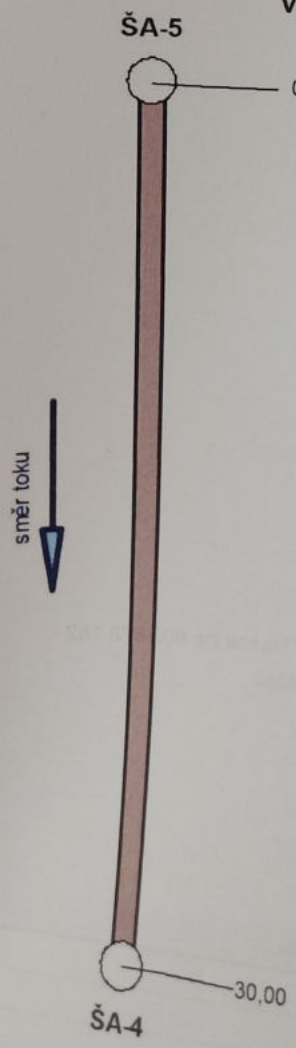

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-5
30,00	BCE.A		00:03:39	Koncový uzel, Šachta, ŠA-4

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	30,00 m

Data sklonu

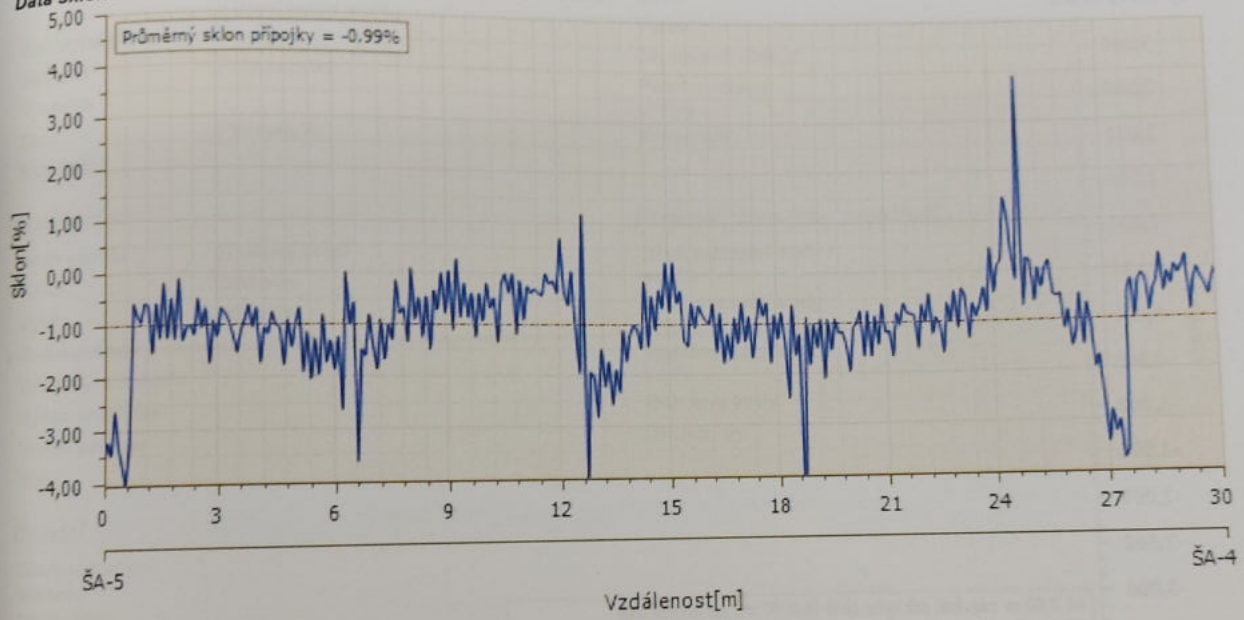

Monitoring kana
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	**STOKA A, ŠA-5_ŠA-4**	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA-5	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA-4	**Výška dna dole**	
	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 8
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	30,00 m

Výškový profil

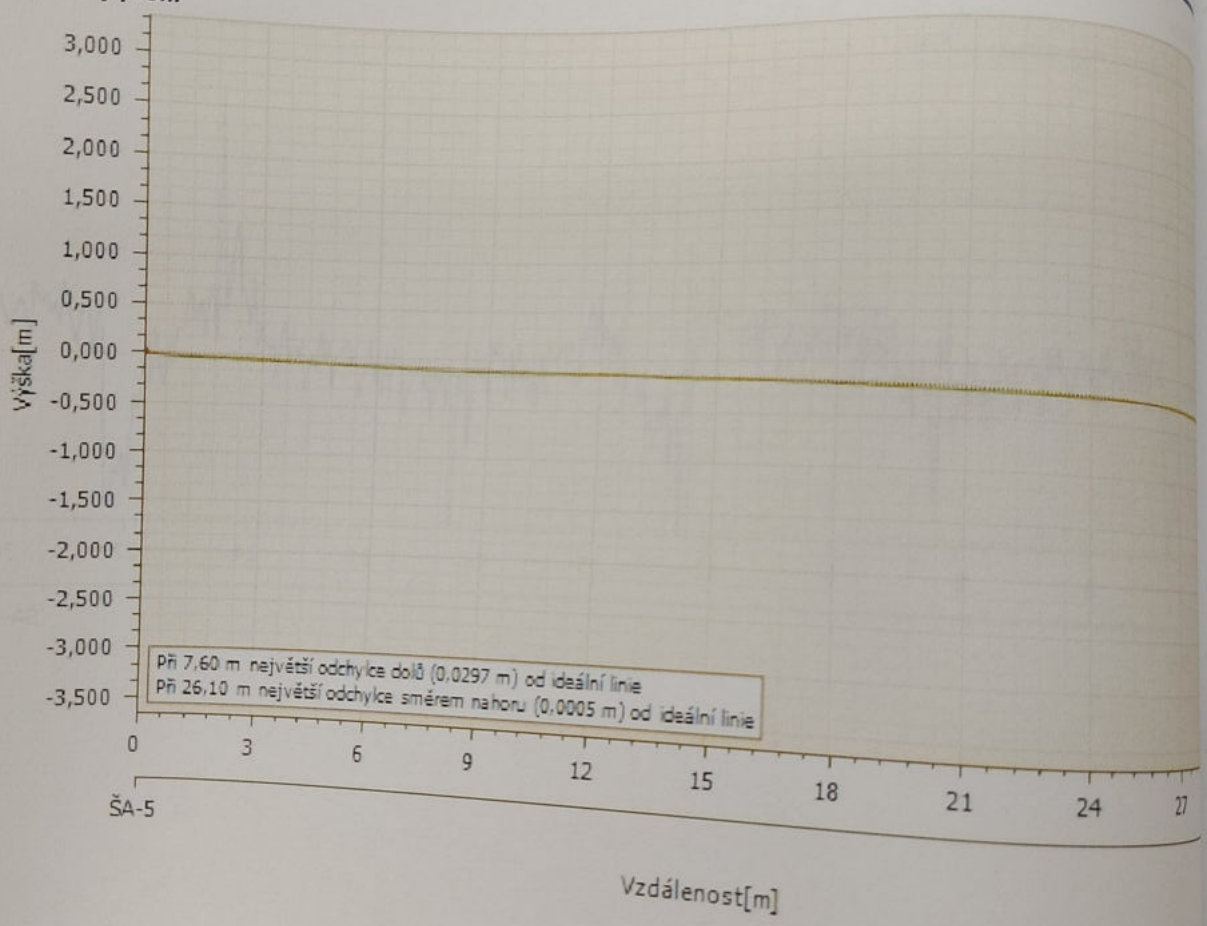

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**
horní šachta	ŠA-6
dolní šachta	ŠA-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	32,70 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	32,70 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-6
003	00:03:56	26,90	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:05:02	32,70	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-5

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**	**Datum insp**	
horní šachta	ŠA-6	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody s hladiny v uzavřen
dolní šachta	ŠA-5		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	32,70 m	**Insp. délka**	32,70 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	300 / 300		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

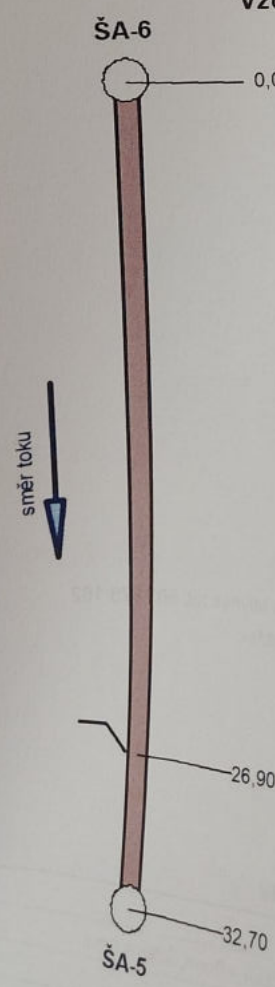

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ~~ŠA-6~~
26,90	BCA.A.A 003		00:03:56	Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = Šířka = 0mm
32,70	BCE.A		00:05:02	Koncový uzel, Šachta, ~~ŠA-5~~

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA-6	**Rozměr**	300 / 300
dolní šachta	ŠA-5	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**003**
Video	00:03:56
Vzdál. ve směru tok	26,90 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2
Datový nosič	

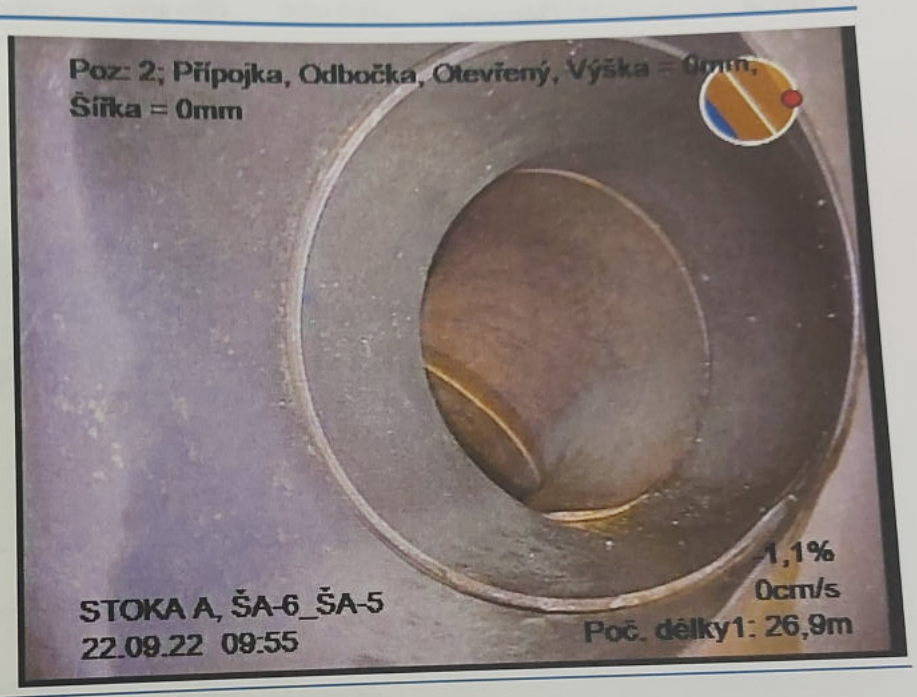

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřim
Monitoring kanalizac
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako

Měření sklonu

Úsek			22.09.2022
horní šachta	**STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**	**Datum insp**	
dolní šachta	ŠA-6	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA-5	**Výška dna dole**	
	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	32,70 m

Data sklonu

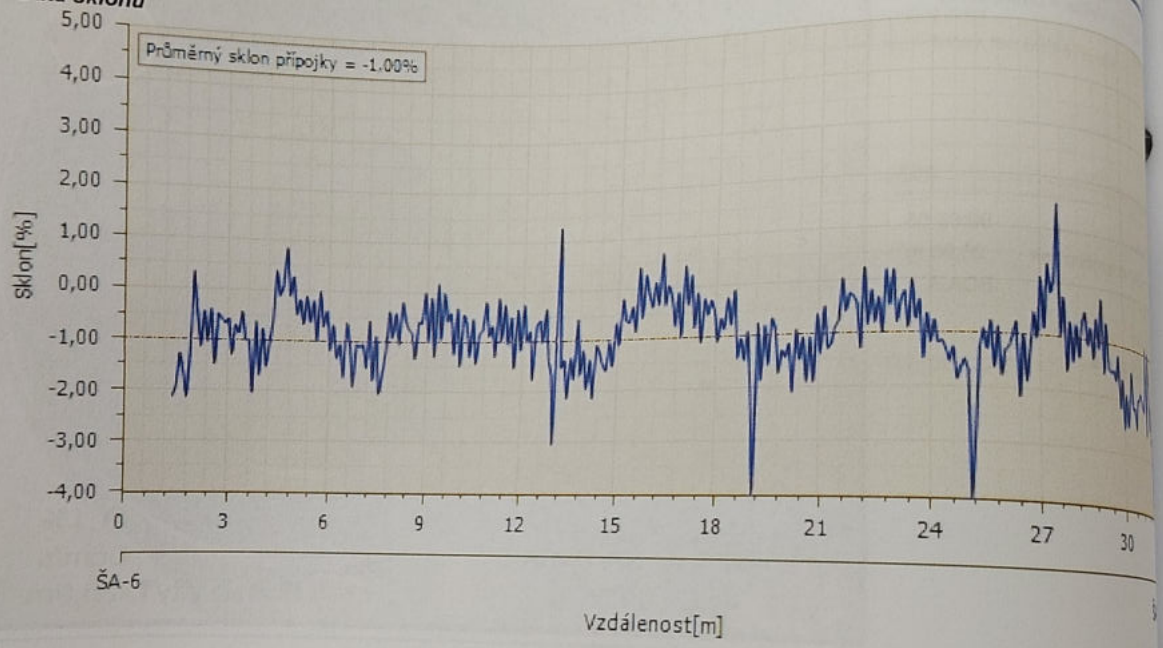

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,70 m

Výškový profil

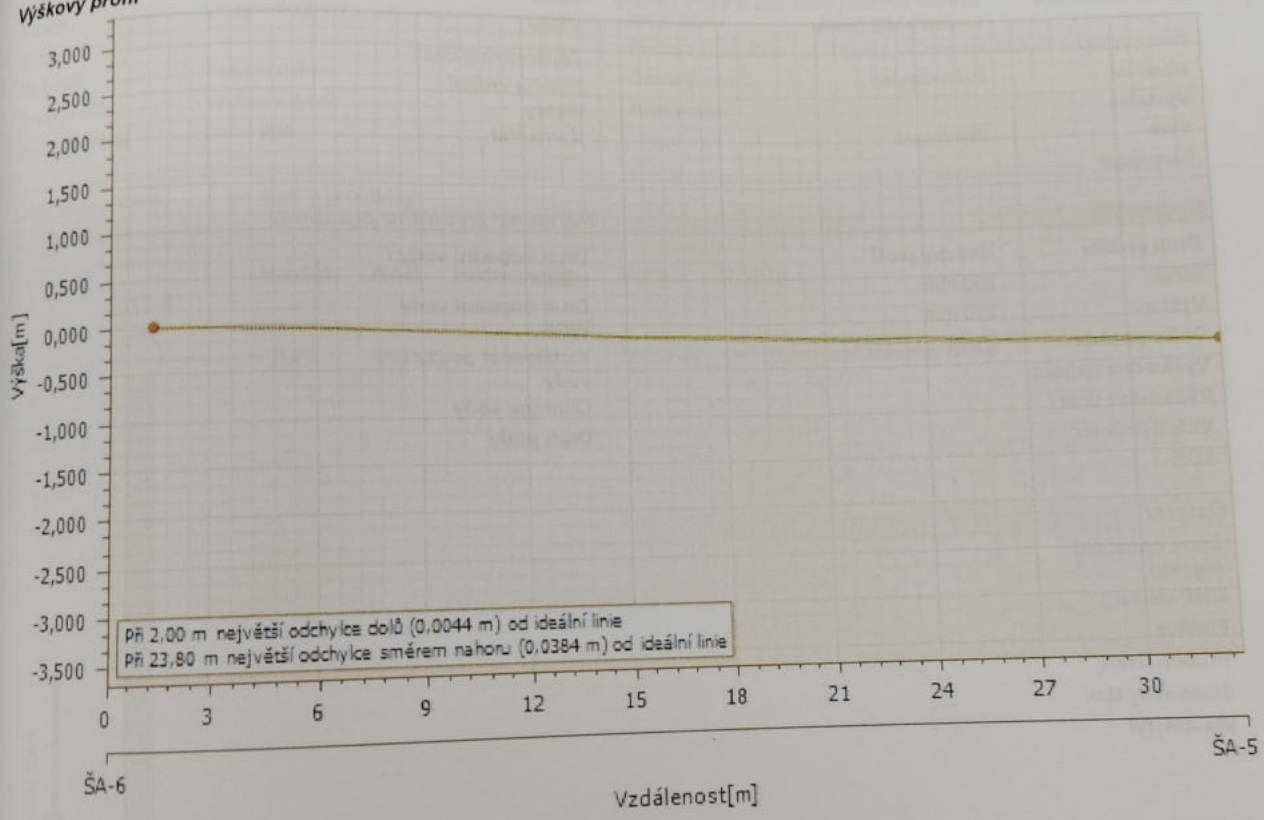

Úsekový protokol

Úsek

horní šachta	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3
dolní šachta	ŠA1-4
	ŠA1-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	25,30 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	25,30 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA1-4
	00:04:27	25,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA1-3

Grafika úseku

Úsek	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-4	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA1-3		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	25,30 m	Insp. délka	25,30 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

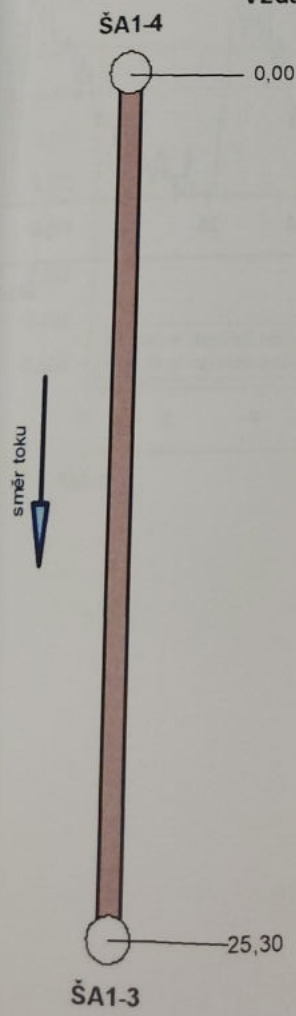

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA1-4
25,30	BCE.A		00:04:27	Koncový uzel, Šachta, ŠA1-3

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-4	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA1-3	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 1[illegible]
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	25,30 m

Data sklonu

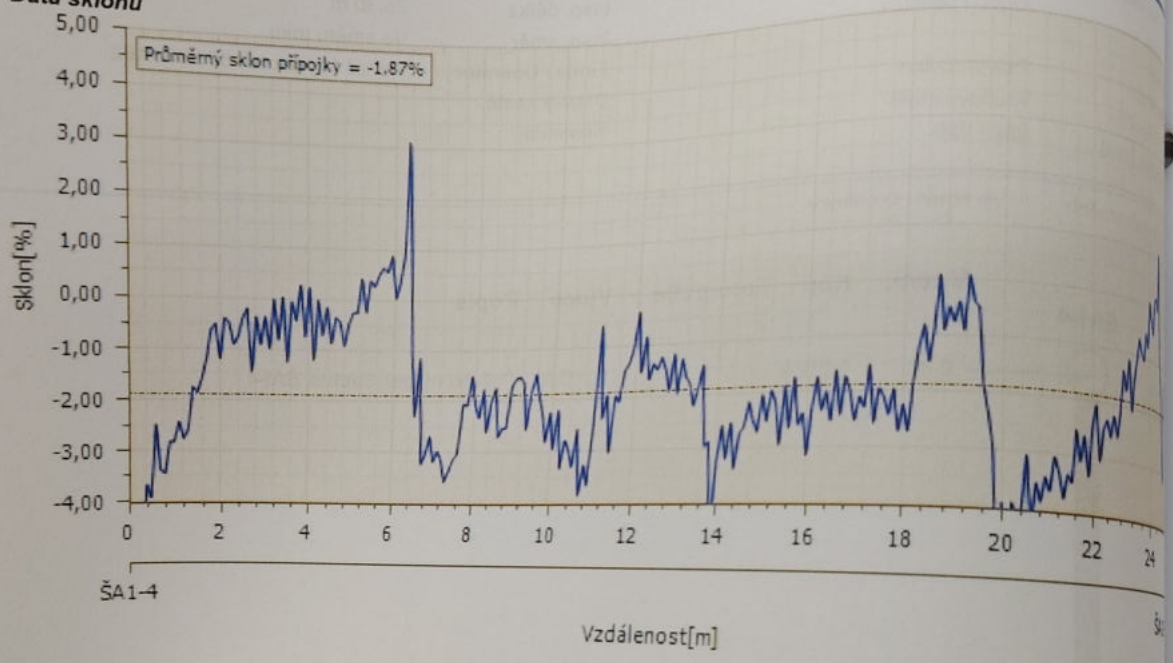

Měření sklonu

Úsek	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA1-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,30 m

Výškový profil

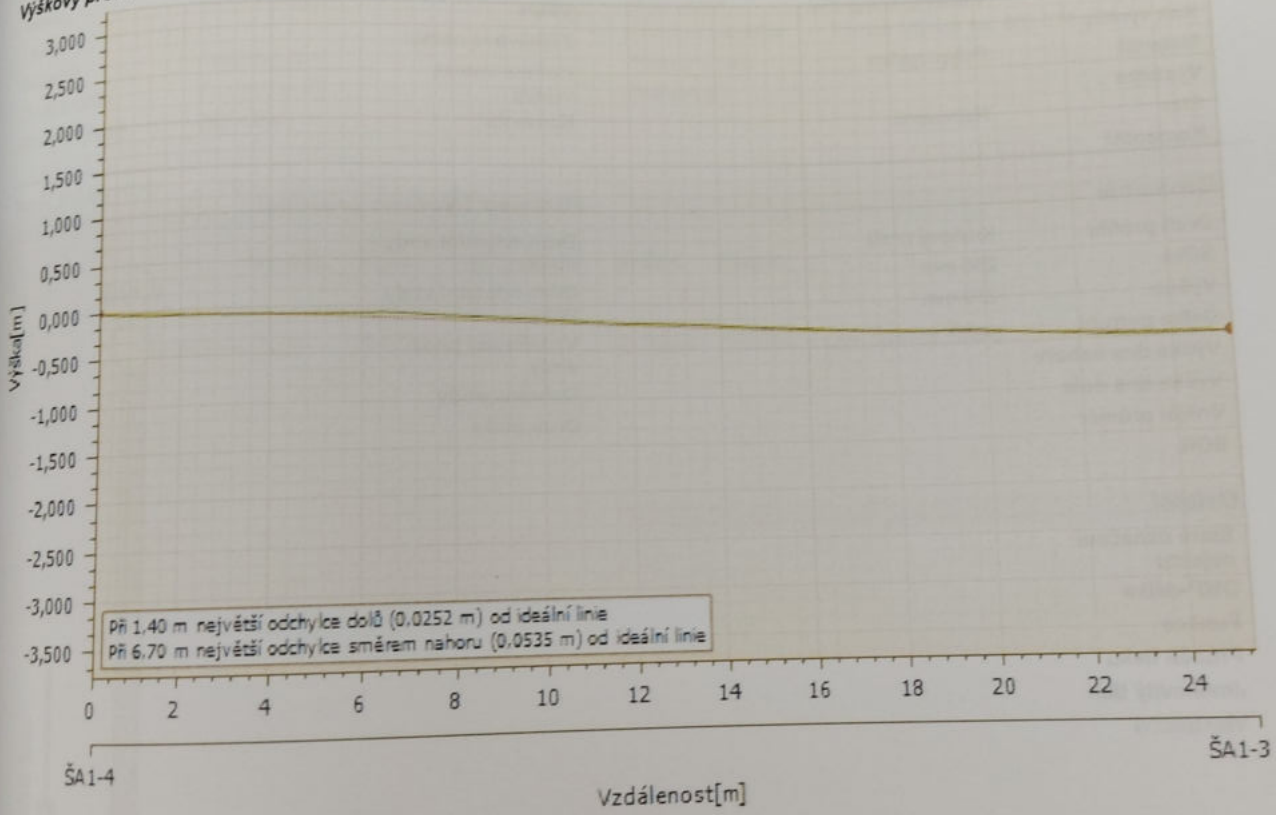

Úsekový protokol

Úsek	
horní šachta	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4
dolní šachta	ŠA1-5
	ŠA1-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	26,00 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody	
WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	26,00 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA1-5
002	00:04:07	25,60	BBF.D		Poz: 12; Infiltrace, Stříkající, z mezi skruží
	00:04:29	26,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA1-4

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha •

Úsek	
horní šachta	STOKA A
dolní šachta	ŠA1-5
	ŠA1-4

Kmenová data

Délka úseku	26,00 m
Město	Obec Předsl
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový pro
Rozměr [mm]	250 / 250

Směr znázornění: Ve směru

Vzdá

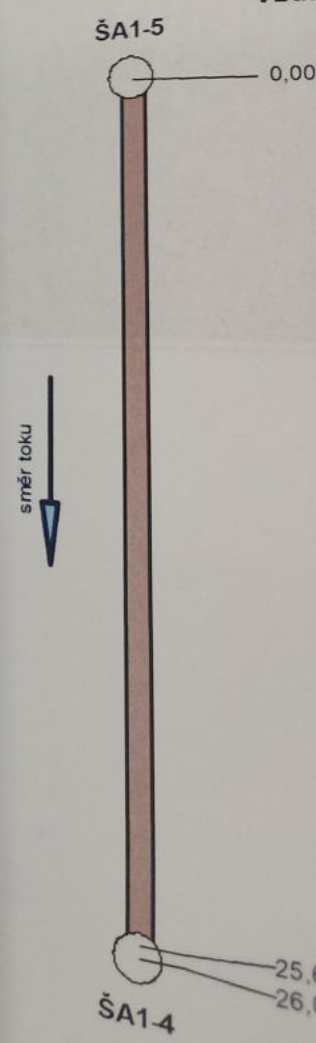

Vytištěno: 23.09.2022

Grafika úseku

Úsek	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4		
horní šachta	ŠA1-5	Datum insp	22.09.2022
dolní šachta	ŠA1-4	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	26,00 m	Insp. délka	26,00 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA1-5
25,60	BBF.D 002		00:04:07	Poz: 12; Infiltrace, Stříkající, z mezi skruží
26,00	BCE.A		00:04:29	Koncový uzel, Šachta, ŠA1-4

Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta	**STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4**	**Datum insp**	22.09.22
dolní šachta	ŠA1-5	**Rozměr**	250 /
Místní část/ulice	ŠA1-4	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok hladiny v uzavřeném
	Obec Předslav		

Poz: 12; Infiltrace, Stříkající, z mezi skruží

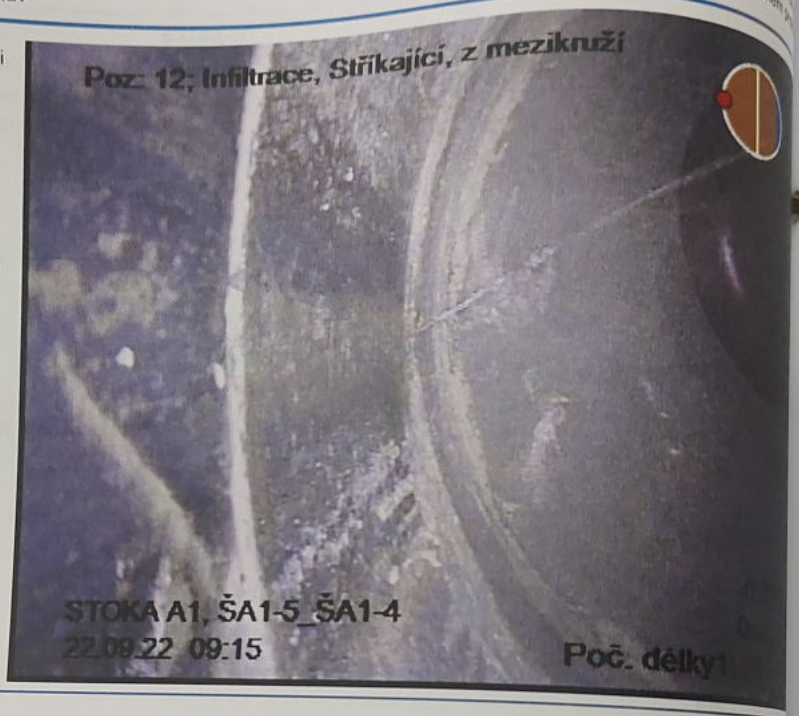

Fotografie 002

Video	00:04:07
Vzdál. ve směru tok	25,60 m
Stav	BBF.D
Pozice	12
Datový nosič	

Měření sklonu

Úsek	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA1-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	26,00 m

Data sklonu

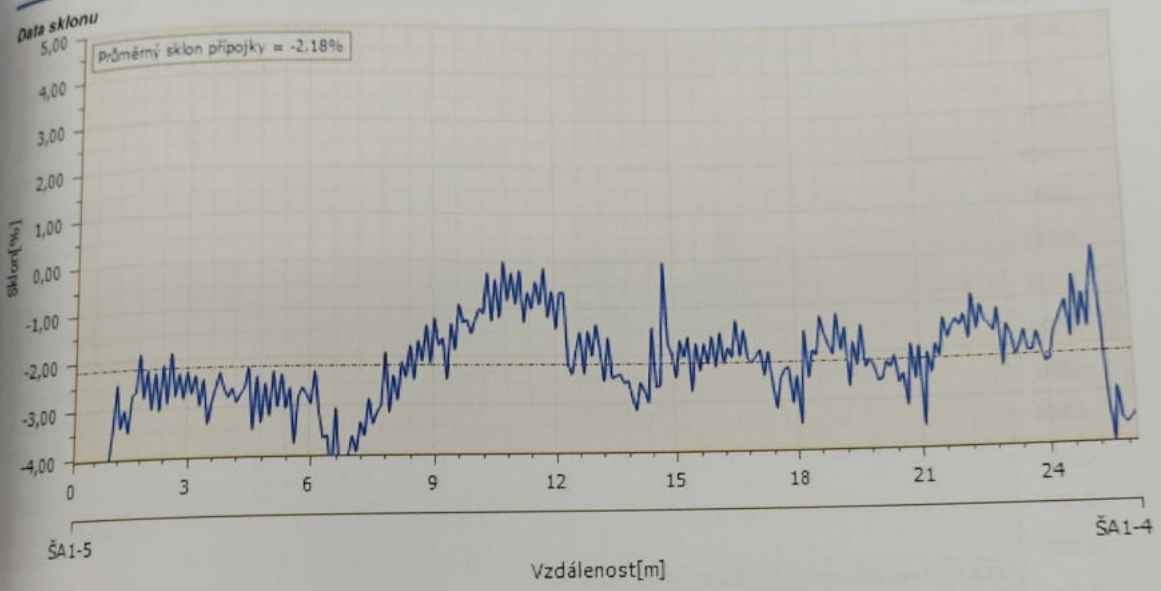

Monitoring kanalizací
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA1-5	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA1-4	**Výška dna dole**	
	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	26,00 m

Výškový profil

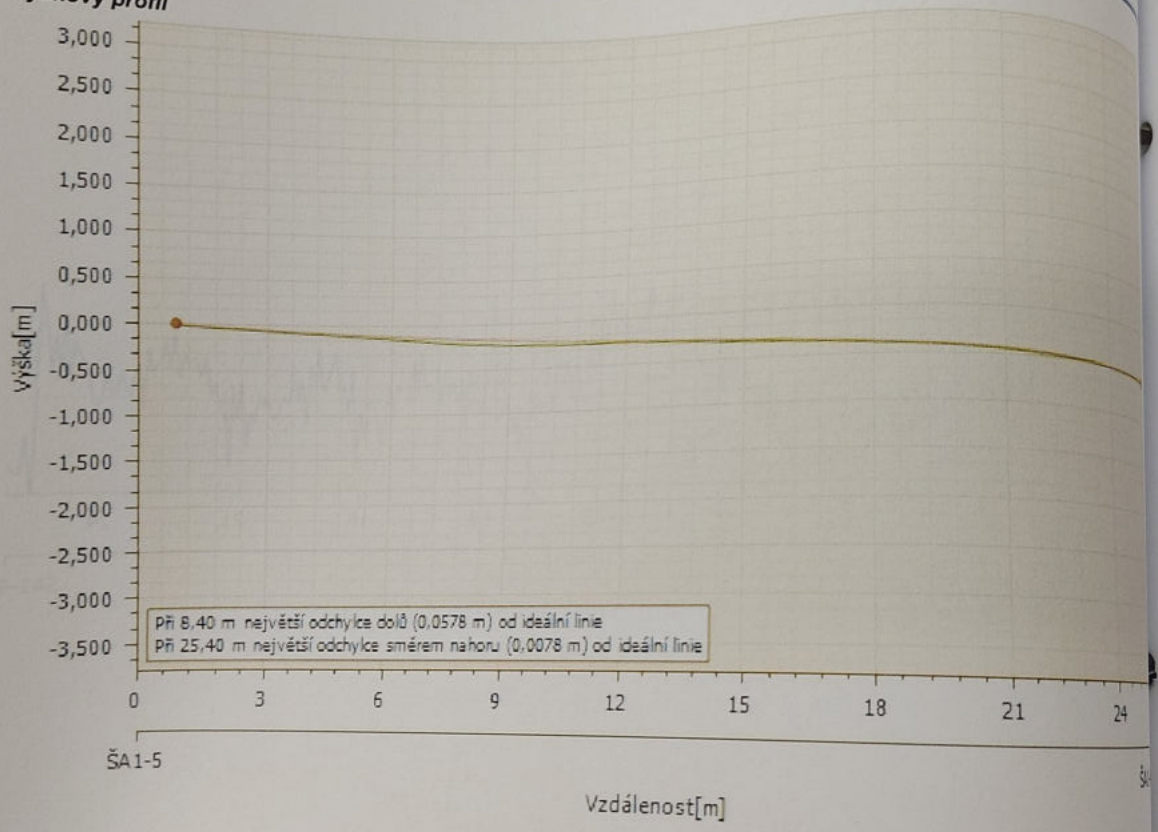

Úsekový protokol

Úsek	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15
horní šachta	ŠA3-1
dolní šachta	ŠA-15

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	22,30 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	22,30 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-15
	00:03:24	22,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-1

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Grafika úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15

horní šachta	ŠA3-1	Datum insp	22.09.2022
dolní šachta	ŠA-15	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Kmenová data

Délka úseku	22,30 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	22,30 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

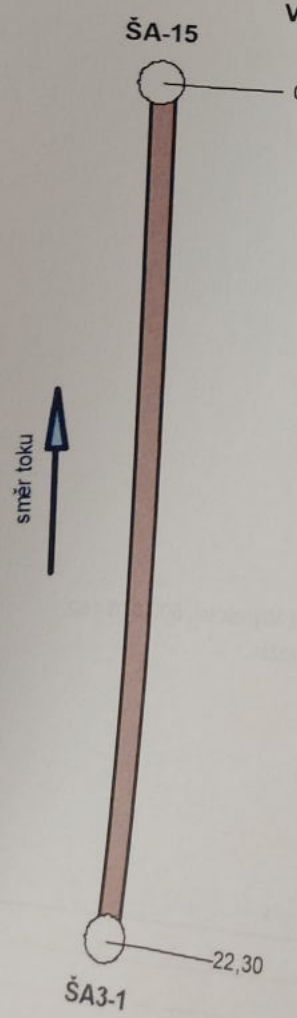

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-15
22,30	BCE.A		00:03:24	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-1

Vytištěno: 23.09.2022

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15		
horní šachta	ŠA3-1	Datum insp	22.09.2022
dolní šachta	ŠA-15	Výška dna nahoře	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Výška dna dole	
		Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	22,30 m

Data sklonu

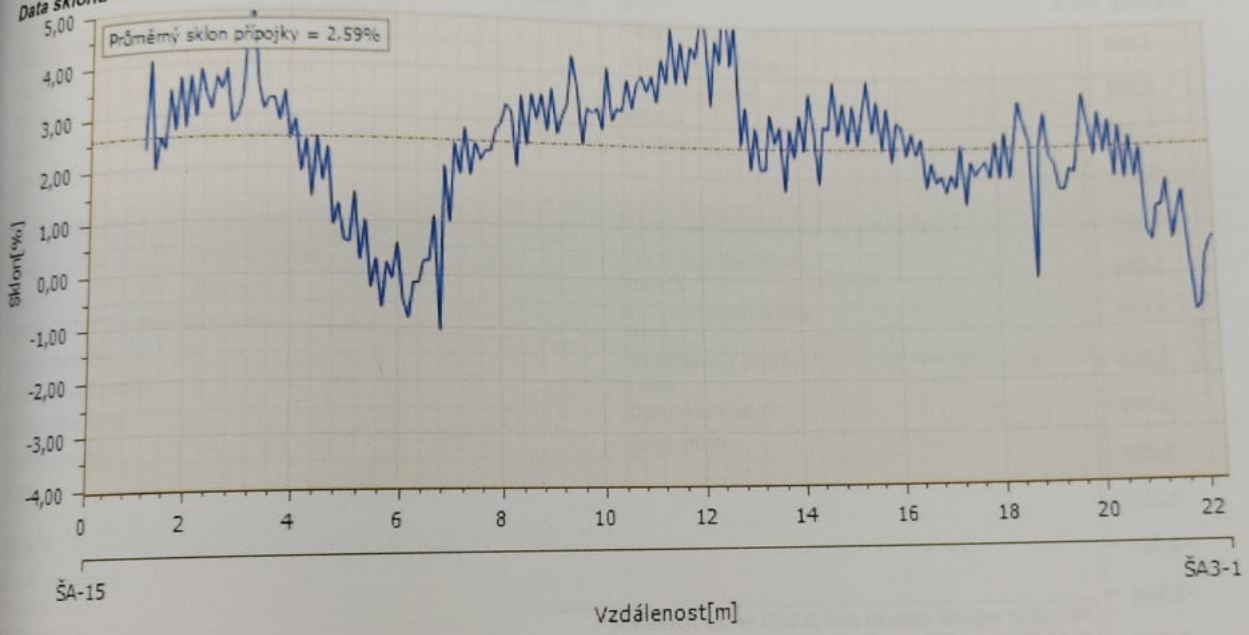

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizací
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	**STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15**	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-1	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA-15	**Výška dna dole**	
	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	22,30 m

Výškový profil

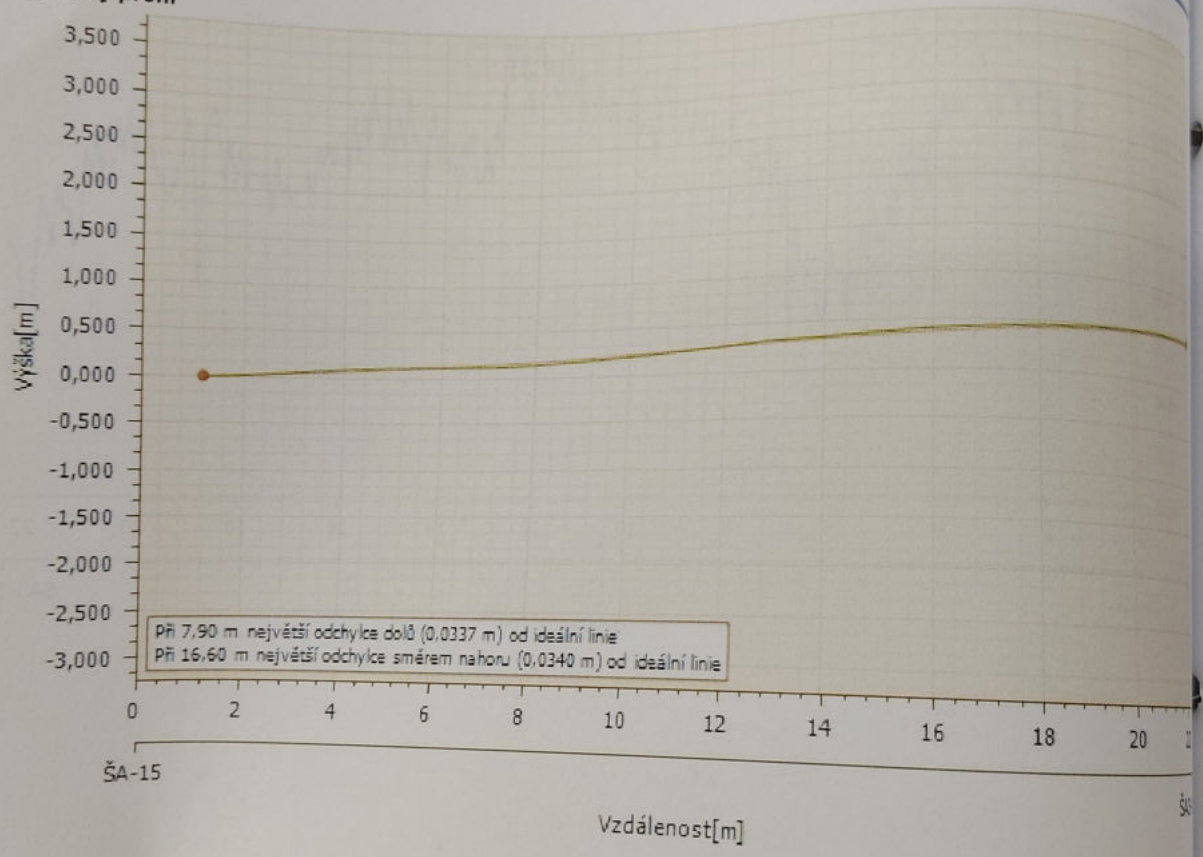

Vytištěno: 23.09.2022

Monitoring kanalizace
tel. +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10
horní šachta	ŠA3-11
dolní šachta	ŠA3-10

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	34,40 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	34,40 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:07	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-11
008	00:02:29	6,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
	00:05:42	34,40	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-10

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Grafika úseku

Úsek			
horní šachta	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10	Datum insp	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-11	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
	ŠA3-10		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	34,40 m	Insp. délka	34,40 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

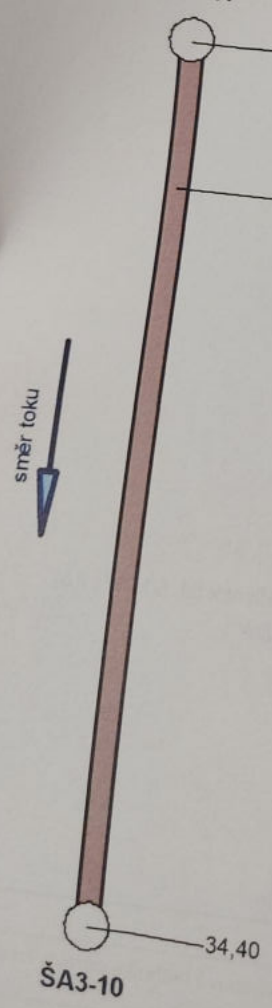

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:07	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-11
6,10	BCB.Z 008		00:02:29	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
34,40	BCE.A		00:05:42	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-10

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-11	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA3-10		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	34,40 m	**Insp. délka**	34,40 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

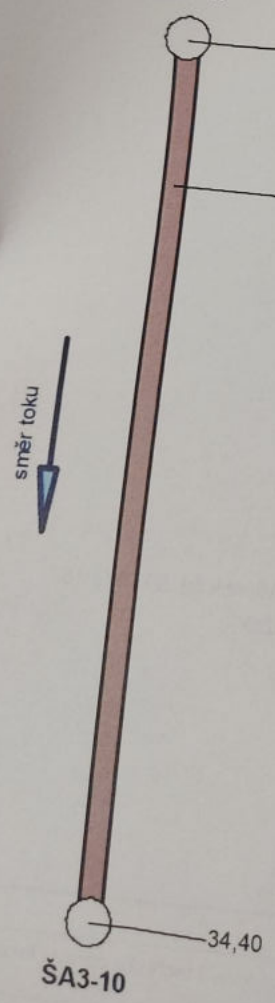

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:07	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-11
6,10	BCB.Z 008		00:02:29	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
34,40	BCE.A		00:05:42	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-10

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Obrazová zpráva úseku

STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10

Úsek	ŠA3-11	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-10	Rozměr	250 / 250
dolní šachta		Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	008
Video	00:02:29
Vzdál. ve směru tok	6,10 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

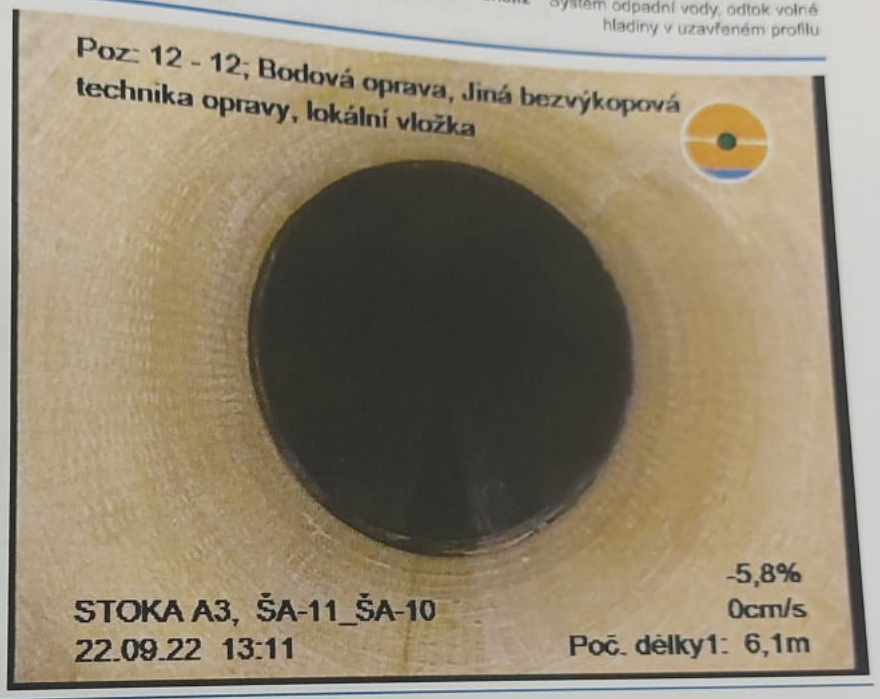

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	**STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10**	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-11	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA3-10	**Výška dna dole**	
	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	34,40 m

Data sklonu

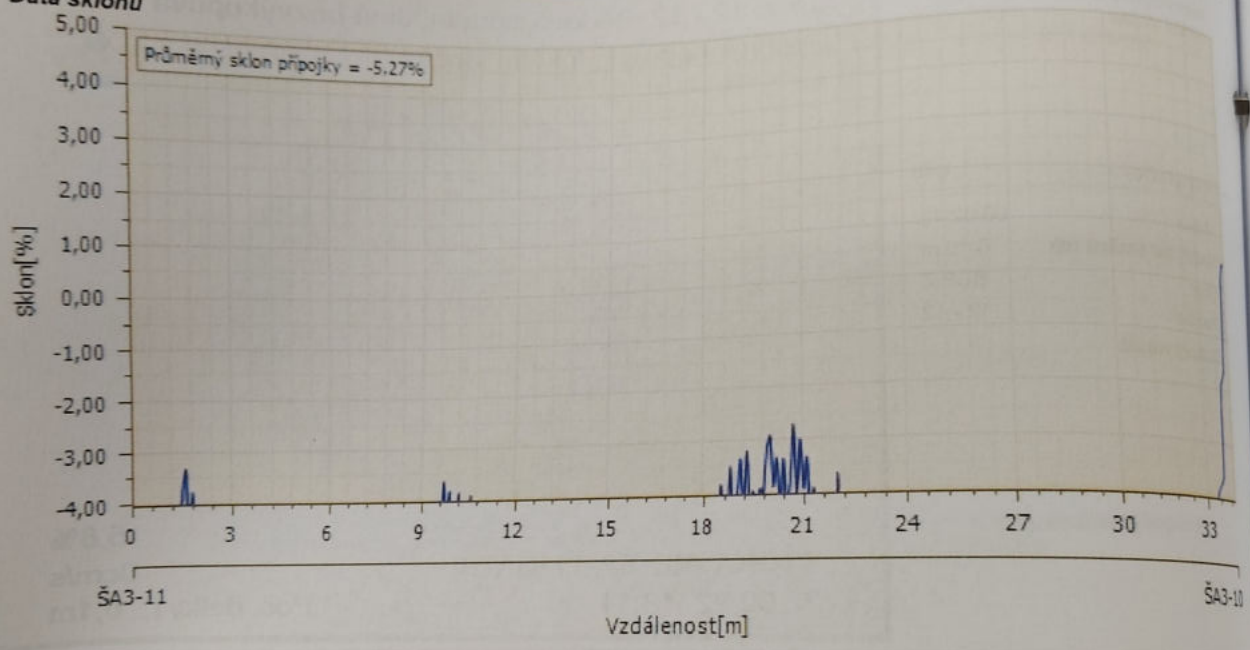

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10		
horní šachta	ŠA3-11	Datum insp	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-10	Výška dna nahoře	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Výška dna dole	
Materiál	Polypropylen	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
		Délka úseku	34,40 m

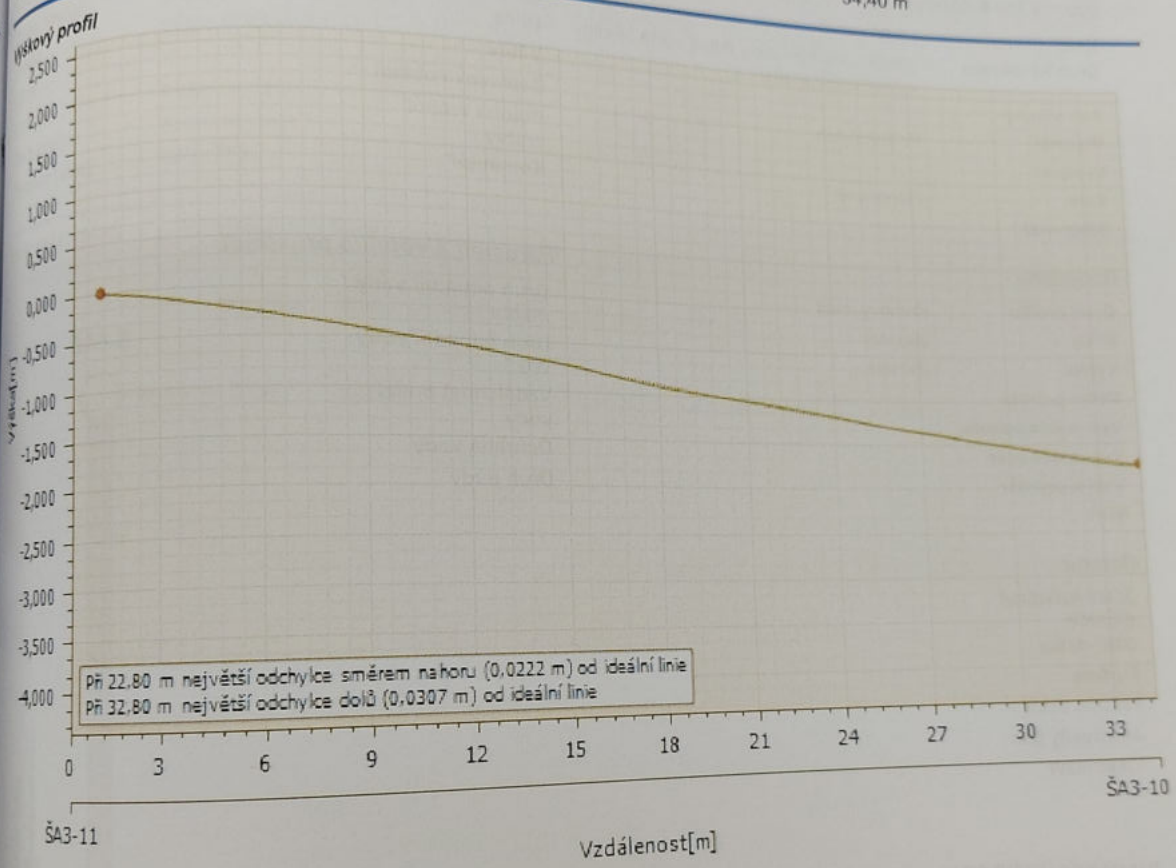

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1
horní šachta	ŠA3-2
dolní šachta	ŠA3-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	25,80 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	25,80 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-2
	00:03:20	25,80	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-1

Vytištěno: 23.09.2022

SEZAK
Ekologick
Prostějov • Pra

Úsek	ST
horní šachta	ŠA3
dolní šachta	ŠA3

Kmenová data

Délka úseku	25,8
Město	Obe
Ulice	
Materiál	Poly
Druh profilu	Kruh
Rozměr [mm]	250

Směr znázornění: Ve

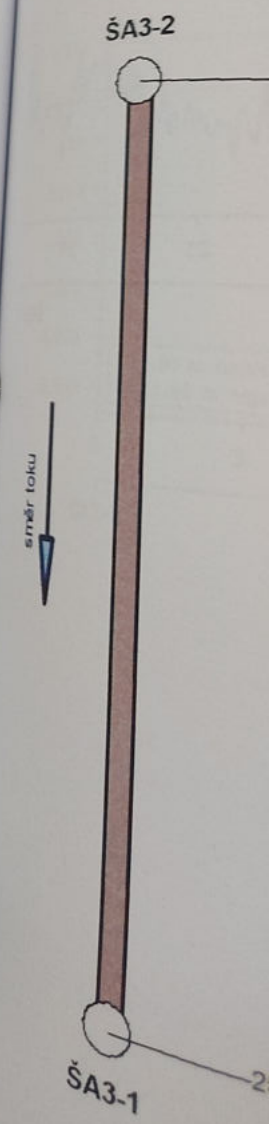

Vytištěno: 23.0

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Grafika úseku

STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1

...ek	ŠA3-2		
...ní šachta		Datum insp	22.09.2022
...ní šachta	ŠA3-1	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

...ová data

...ka úseku	25,80 m
...sto	Obec Předslav
...ce	
...eriál	Polypropylen
...h profilu	Kruhový profil
...měr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	25,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

...ní znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-2
25,80	BCE.A		00:03:20	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-1

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-2	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA3-1	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	25,80 m

Data sklonu

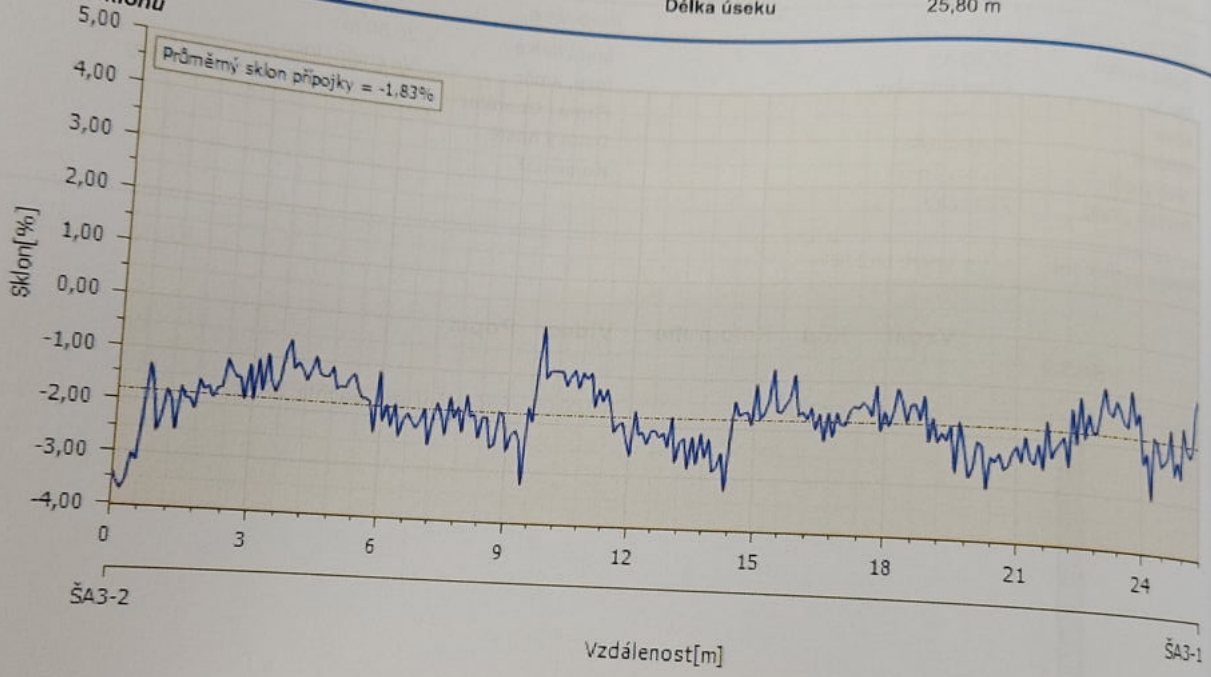

Měření sklonu

STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1

ŠA3-2	**Datum insp**	22.09.2022
ŠA3-1	**Výška dna nahoře**	
Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Výška dna dole**	
Polypropylen	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
	Délka úseku	25,80 m

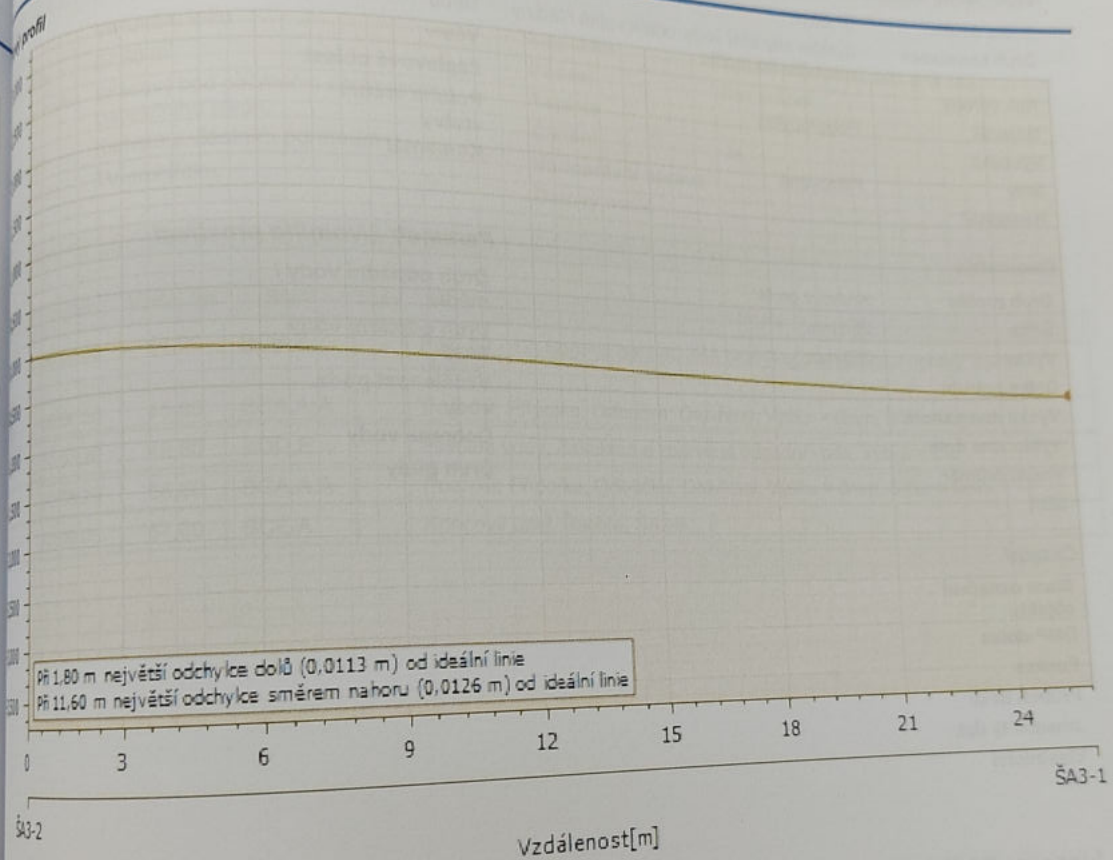

Úsekový protokol

Úsek

horní šachta	STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4
dolní šachta	ŠA3-6
	ŠA3-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	57,60 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	57,60 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-6
017	00:01:41	5,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy
018	00:02:15	8,00	BCA.A.B		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4

ŠA3-6

ŠA3-4

22.09.2022

Ve směru toku

57,60 m

Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Kamera s vlastním pohonem

TV-prohlídka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
00:03:33	14,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
00:06:56	45,80	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
00:07:20	49,80	BDD.E		Hladina vody, Zakalená a zbarvená odpadní voda, Výška = 5%
00:08:26	56,60	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
00:09:06	57,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-4

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Grafika úseku

STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4

Úsek	
horní šachta	ŠA3-6
dolní šachta	ŠA3-4
Kmenová data	
Délka úseku	57,60 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250
Směr znázornění:	Ve směru prohlídky

Datum insp	22.09.2022
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Inspekce	
Insp. délka	57,60 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-6
5,90	BCB.Z	017	00:01:41	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy
8,00	BCA.A.B	018	00:02:15	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
14,90	BCB.Z	019	00:03:33	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
45,80	BCA.A.A	020	00:06:56	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
49,80	BDD.E		00:07:20	Hladina vody, Zakalená a zbarvená odpadní voda, Výška = 5%
56,60	BCA.A.A	021	00:08:26	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
57,60	BCE.A		00:09:06	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-4

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-6	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠA3-4	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy

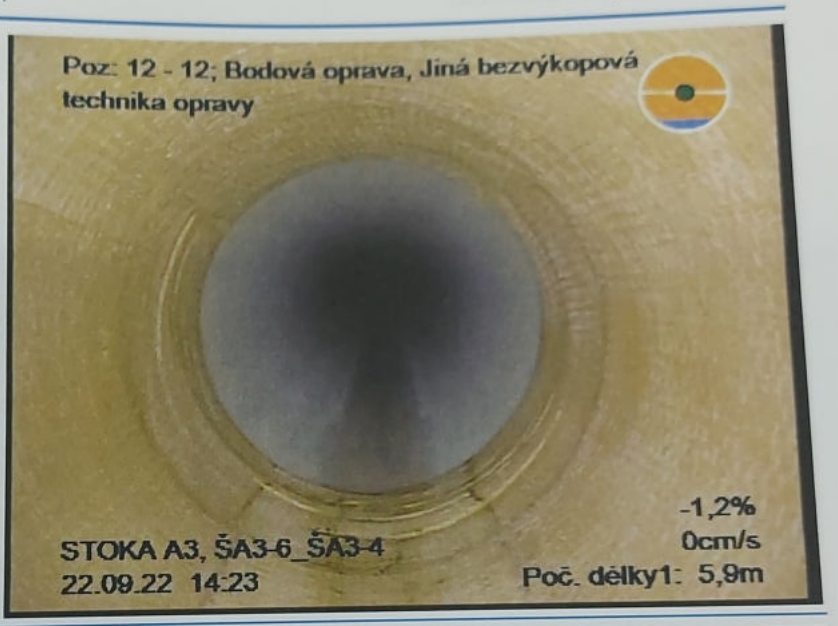

Fotografie	**017**
Video	00:01:41
Vzdál. ve směru tok	5,90 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**018**
Video	00:02:15
Vzdál. ve směru tok	8,00 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	10
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4		
horní šachta	ŠA3-6	Datum insp	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-4	Rozměr	250 / 250
Místní část/ulice	Obec Předslav	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	019
Video	00:03:33
Vzdál. ve směru tok	14,90 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	020
Video	00:06:56
Vzdál. ve směru tok	45,80 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	10
Datový nosič	

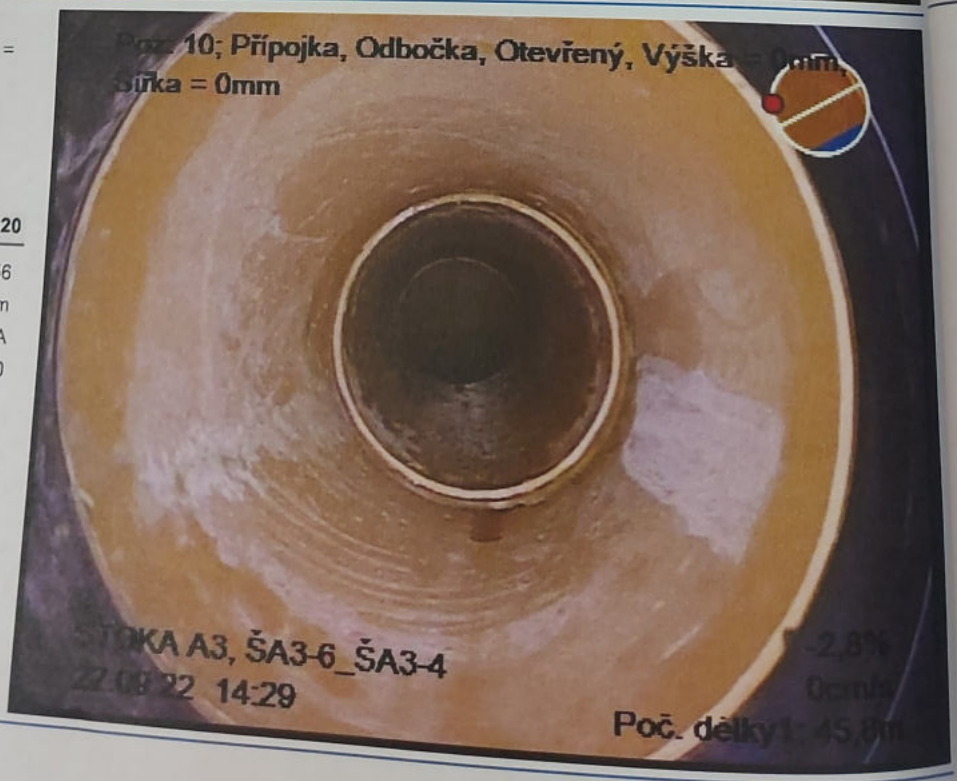

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-6	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠA3-4	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**021**
Video	00:08:26
Vzdál. ve směru tok	56,60 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	10
Datový nosič	

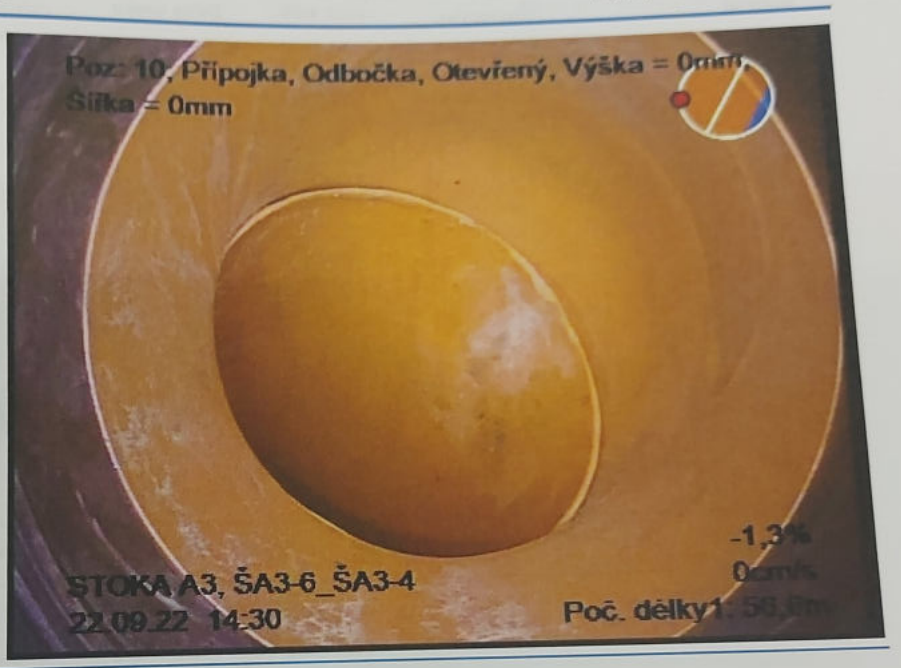

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-6	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA3-4	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	57,60 m

Data sklonu

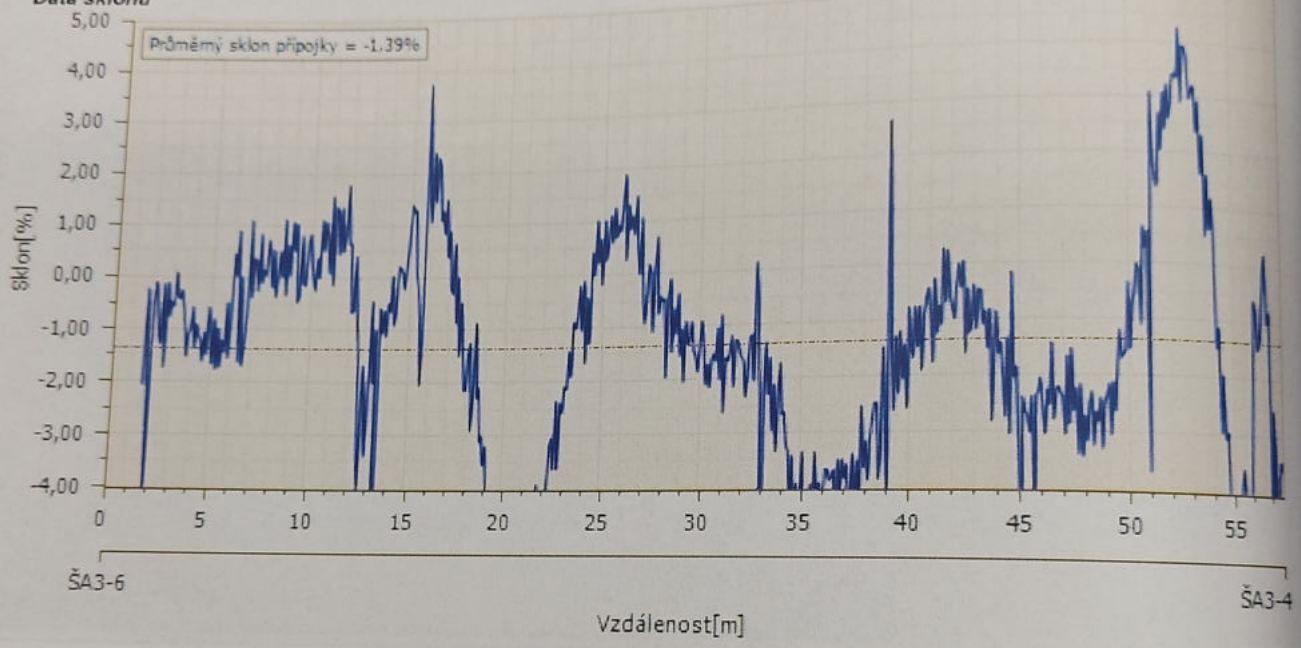

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-6	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠA3-4	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	57,60 m

Výškový profil

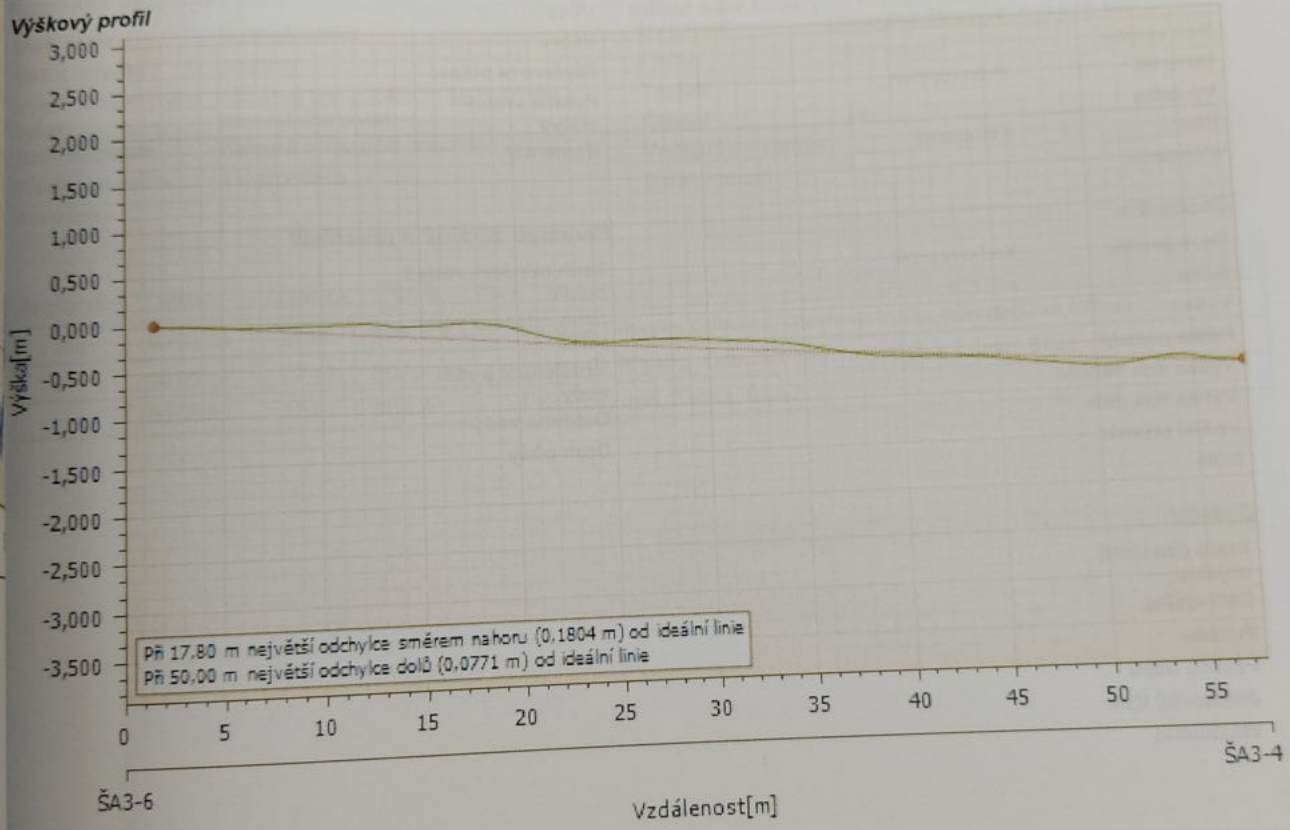

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7**
horní šachta	ŠA3-8
dolní šachta	ŠA3-7

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	32,80 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	32,80 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-8
013	00:00:31	0,00	BBF.C		Poz: 6 - 11; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží
014	00:01:42	4,30	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7**
horní šachta	ŠA3-8
dolní šachta	ŠA3-7

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku	**Inspektor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Délka inspekce	32,80 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
015	00:03:55	21,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
016	00:05:15	27,40	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:33	32,80	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-7

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-8	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA3-7		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	32,80 m	**Insp. délka**	32,80 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A BBF.C	 013	00:00:05 00:00:31	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-8 Poz: 6 - 11; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží
4,30	BCB.Z	014	00:01:42	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
21,00	BCA.A.A	015	00:03:55	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
27,40	BCA.A.A	016	00:05:15	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
32,80	BCE.A		00:06:33	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-7

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-8	Rozměr	250 / 250
dolní šachta	ŠA3-7	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 6 - 11; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

Fotografie	013
Video	00:00:31
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BBF.C
Pozice	6 - 11
Datový nosič	

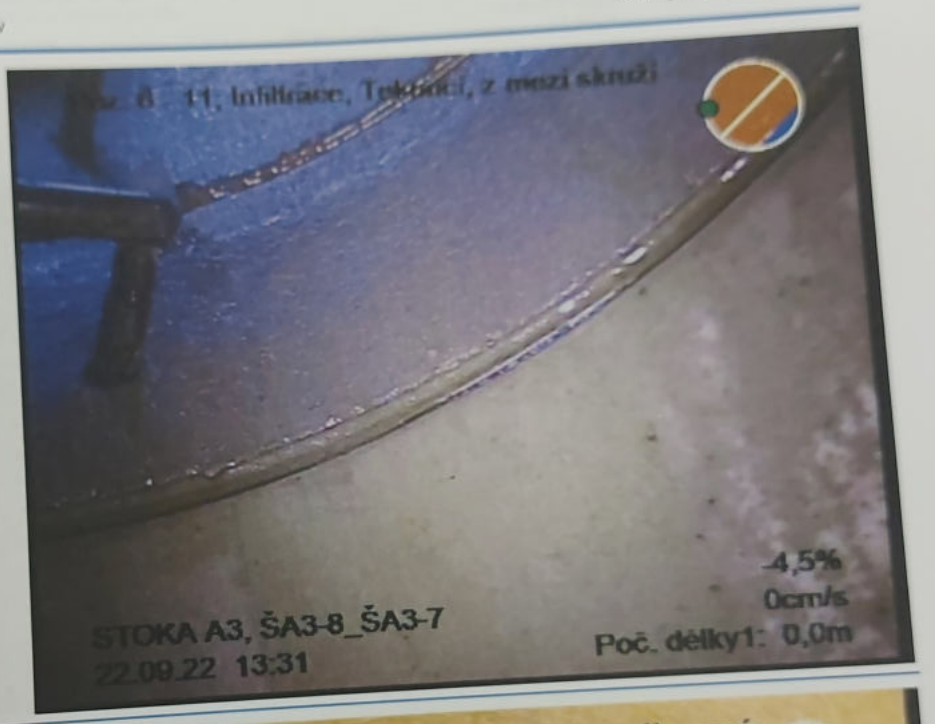

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	014
Video	00:01:42
Vzdál. ve směru tok	4,30 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

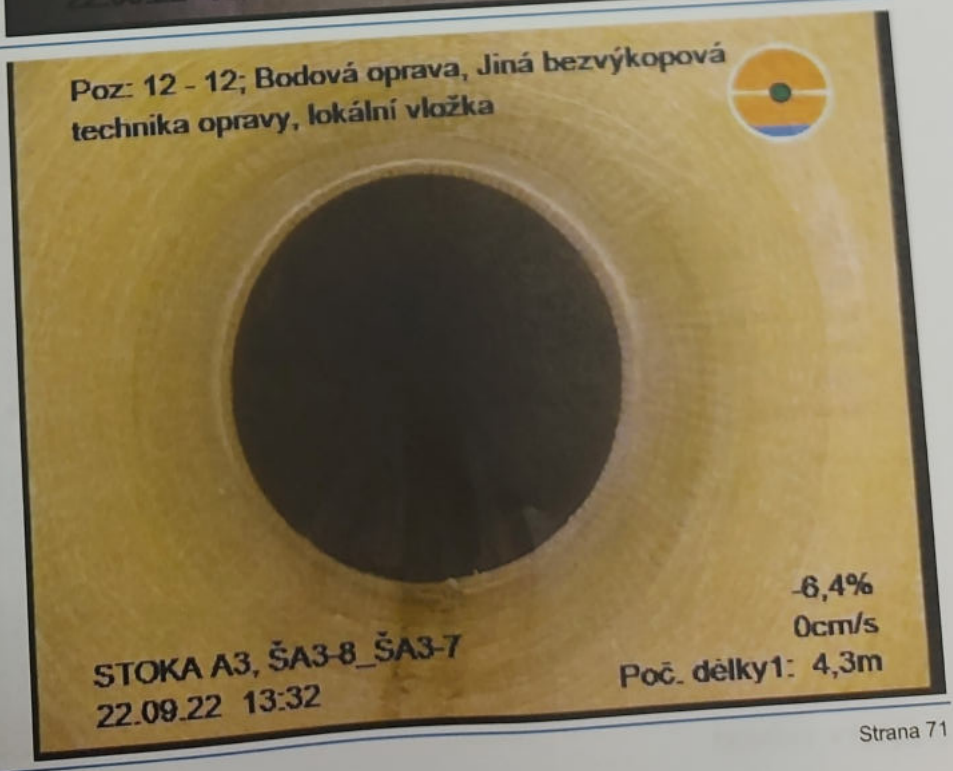

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7**	**Datum insp**	22.09.20
horní šachta	ŠA3-8	**Rozměr**	250 / 2
dolní šachta	ŠA3-7	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok vol hladiny v uzavřeném prof
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**015**
Video	00:03:55
Vzdál. ve směru tok	21,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Datový nosič	

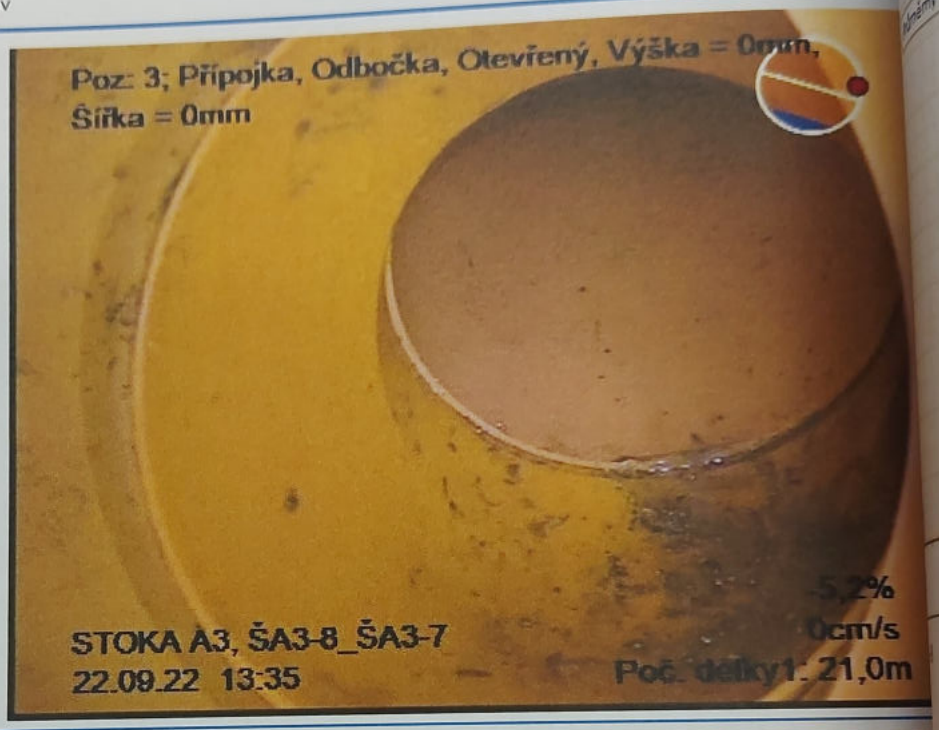

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**016**
Video	00:05:15
Vzdál. ve směru tok	27,40 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	10
Datový nosič	

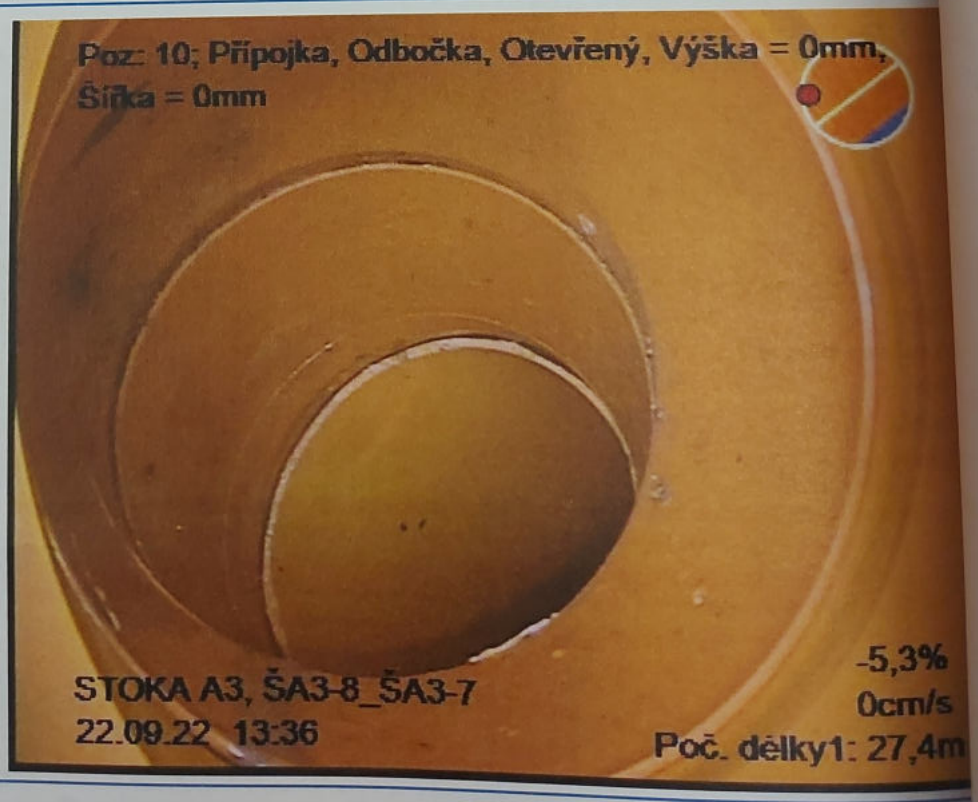

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-8	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-7	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,80 m

Data sklonu

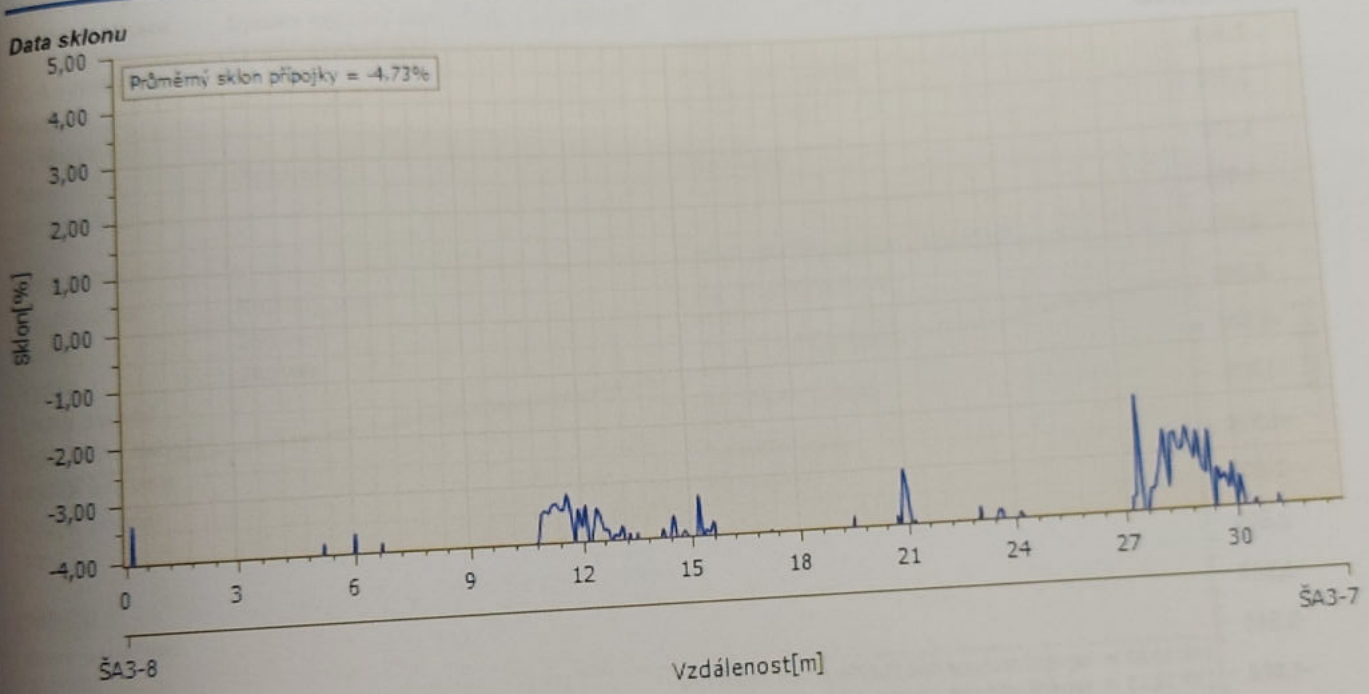

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-8	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA3-7	**Výška dna dole**	
	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	32,80 m

Výškový profil

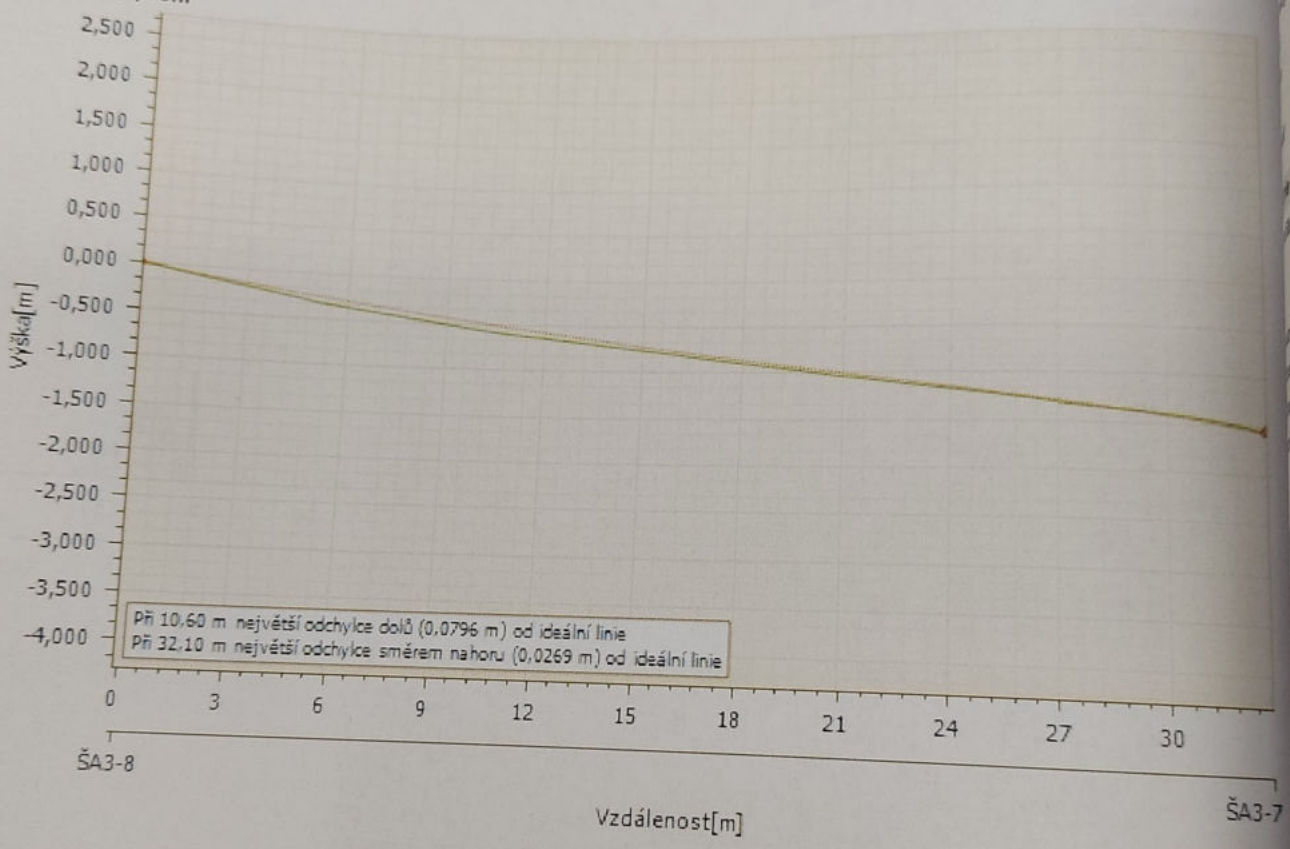

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**
horní šachta	ŠA3-9
dolní šachta	ŠA3-8

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	28,30 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	28,30 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-9
009	00:00:59	6,00	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
010	00:02:15	14,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**
horní šachta	ŠA3-9
dolní šachta	ŠA3-8

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku	**Inspektor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Délka inspekce	28,30 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
011	00:02:45	15,60	BCA.A.B		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:36	28,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-8
012	00:05:02	28,30	BBF.C		Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

Grafika úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA3-8		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	28,30 m	**Insp. délka**	28,30 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

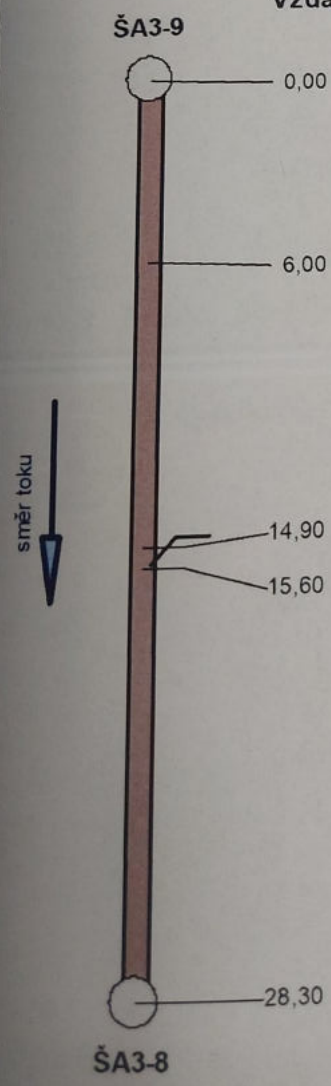

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-9
6,00	BCB.Z	009	00:00:59	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
14,90	BCB.Z	010	00:02:15	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
15,60	BCA.A.B	011	00:02:45	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
28,30	BCE.A		00:04:36	Koncový uzel, Šachta, ŠA3-8
	BBF.C	012	00:05:02	Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8	Datum insp	22.09.20
horní šachta	ŠA3-9	Rozměr	250 / 2
dolní šachta	ŠA3-8	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volí hladiny v uzavřeném prof
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	009
Video	00:00:59
Vzdál. ve směru tok	6,00 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

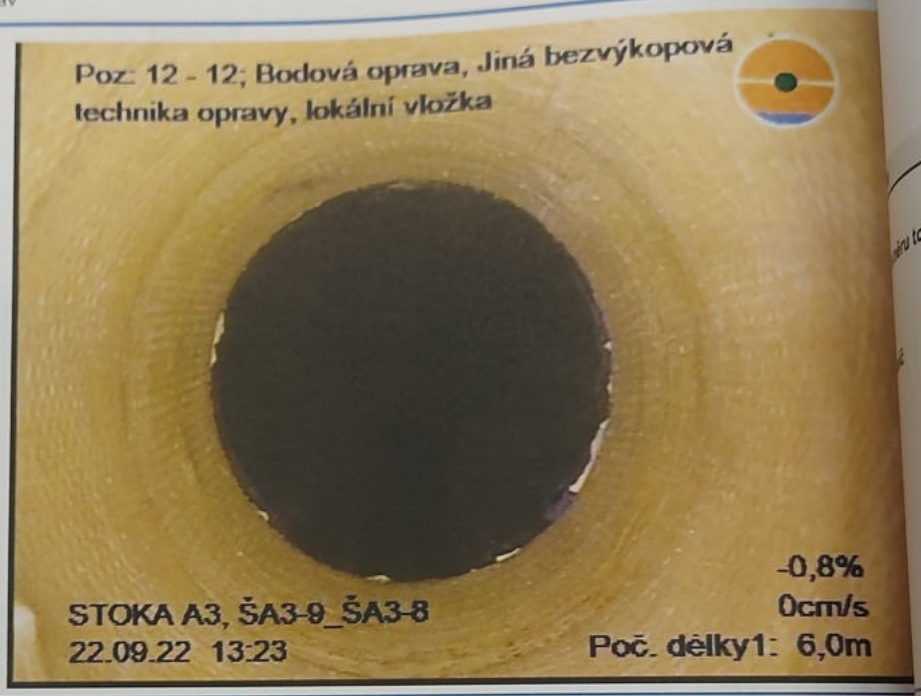

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	010
Video	00:02:15
Vzdál. ve směru tok	14,90 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

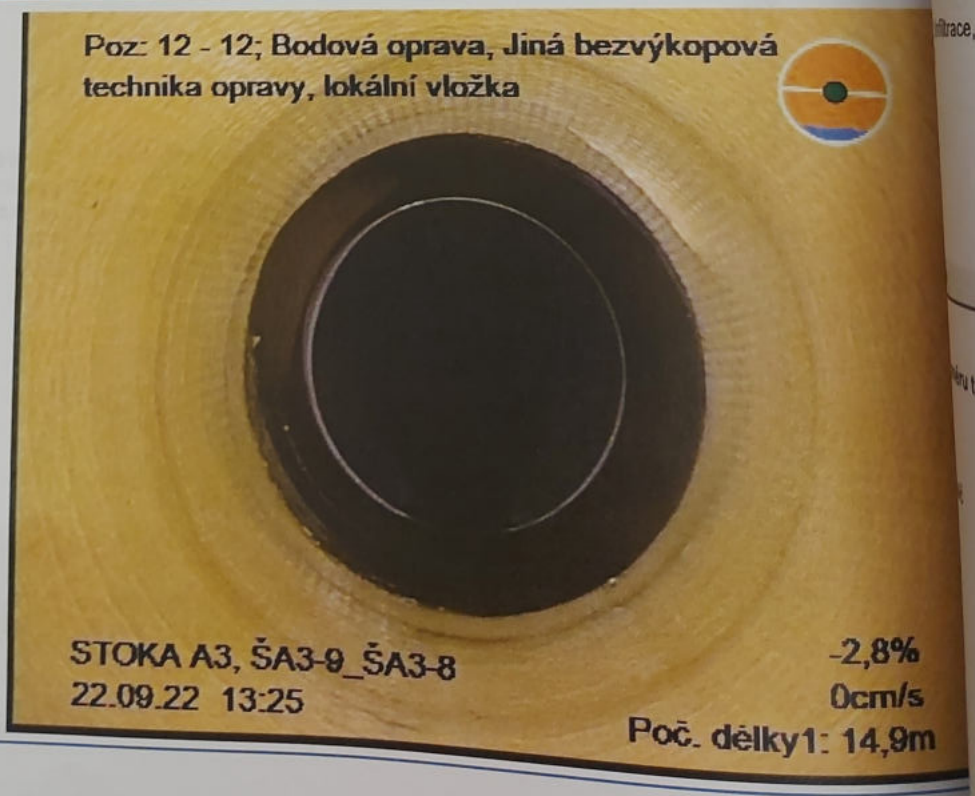

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠA3-8	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**011**
Video	00:02:45
Vzdál. ve směru tok	15,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Datový nosič	

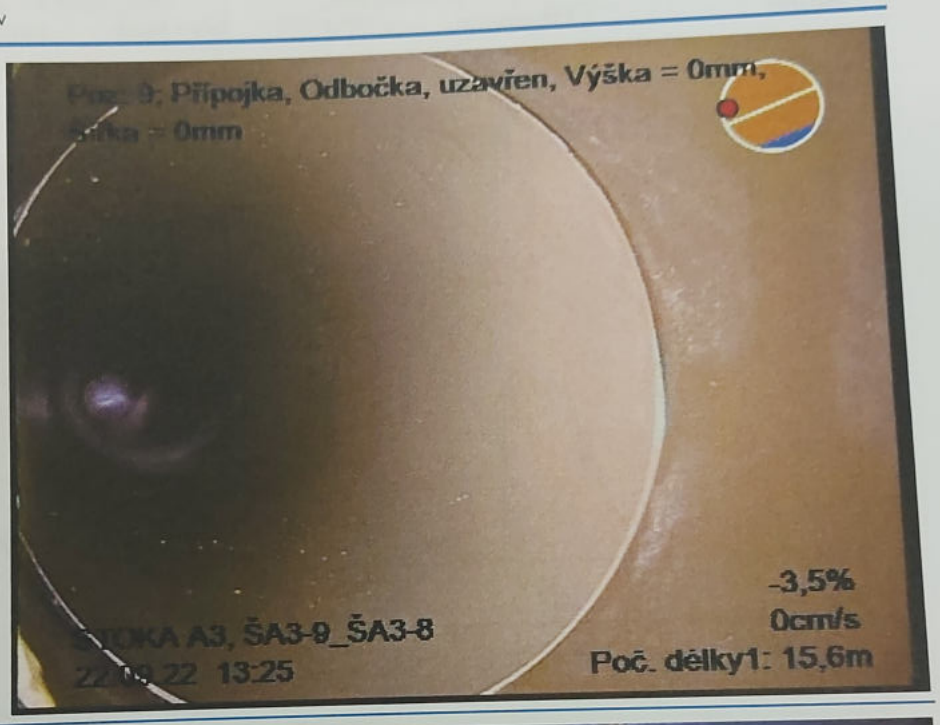

Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

otografie	**012**
'ideo	00:05:02
'zdál. ve směru tok	28,30 m
tav	BBF.C
ozice	7 - 12
atový nosič	

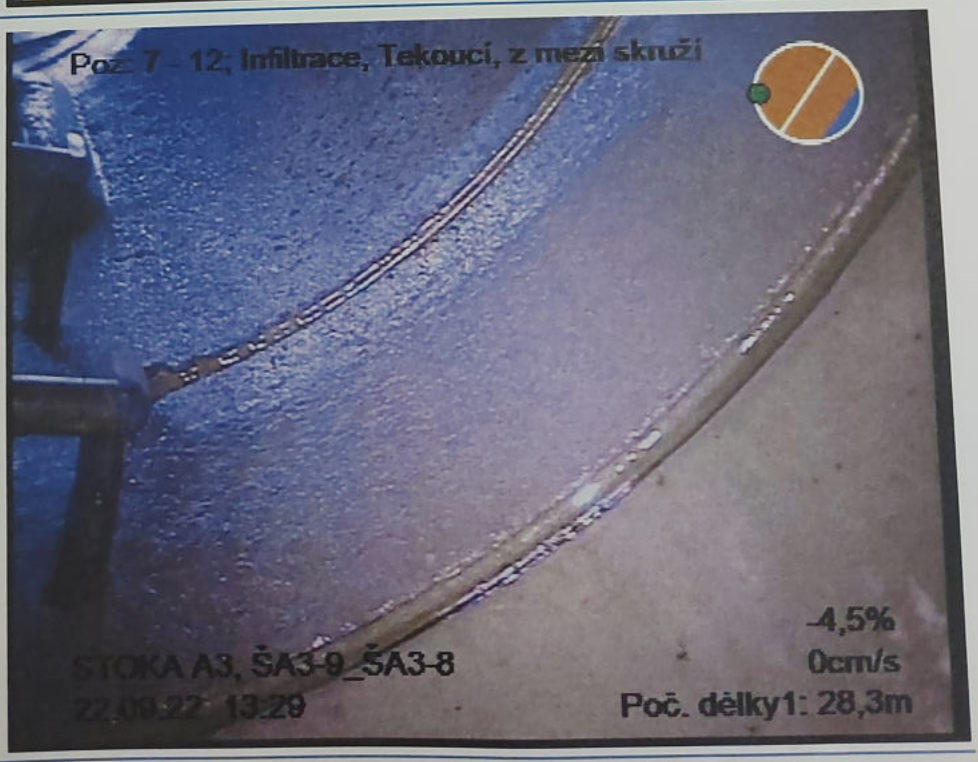

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek			
horní šachta	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠA3-9	**Výška dna nahoře**	
Druh kanalizace	ŠA3-8	**Výška dna dole**	
Materiál	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
	Polypropylen	**Délka úseku**	28,30 m

Data sklonu

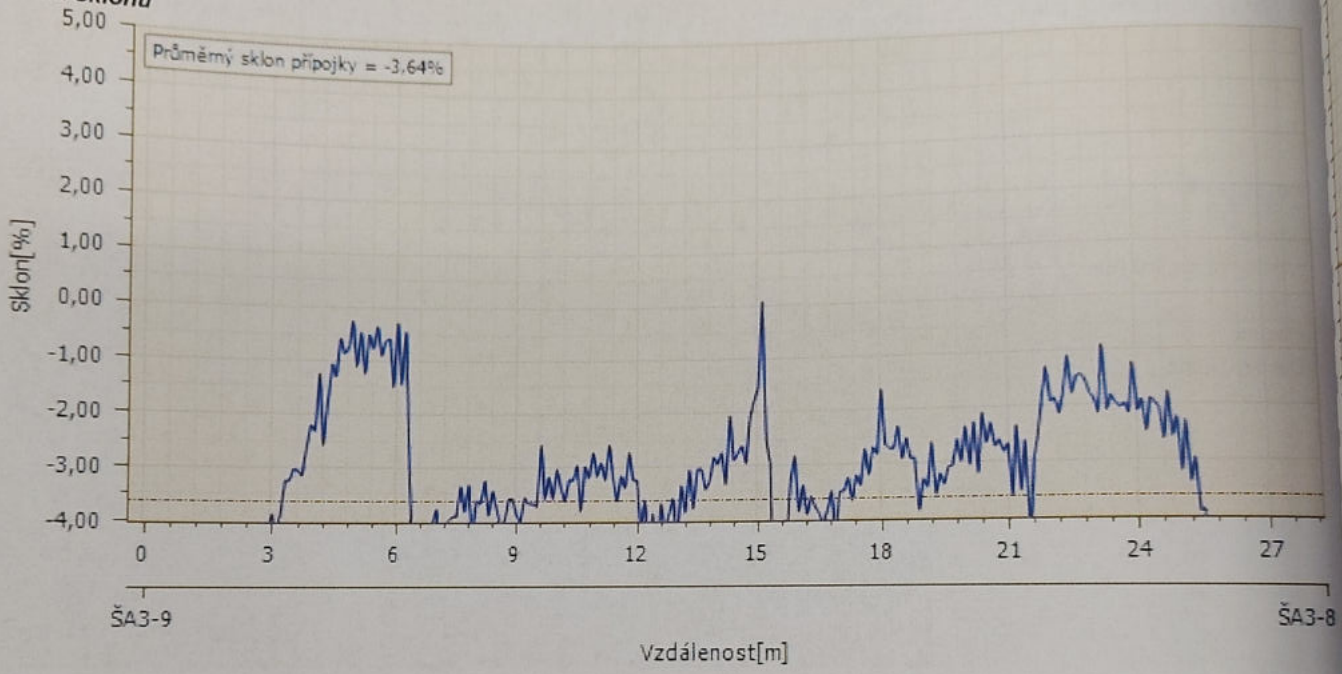

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	28,30 m

Výškový profil

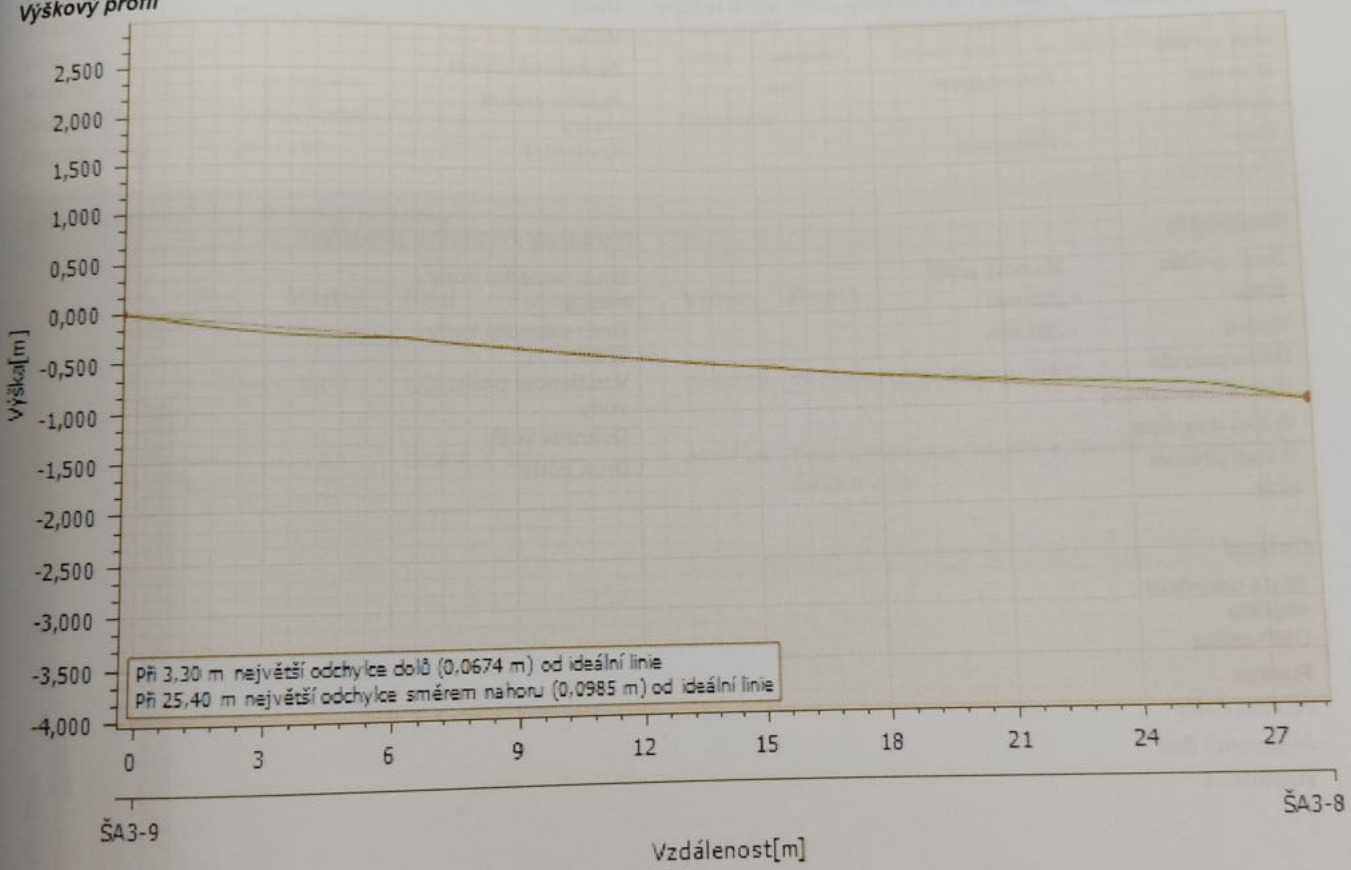

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA B, ŠB-2_ŠB-1**
horní šachta	ŠB-2
dolní šachta	ŠB-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	21,30 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	21,30 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB-1
004	00:01:04	1,80	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:03:59	21,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB-2

Vytištěno: 23.09.2022

Grafika úseku

Úsek	**STOKA B, ŠB-2_ŠB-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠB-1		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	21,30 m	**Insp. délka**	21,30 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Proti směru proudění
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

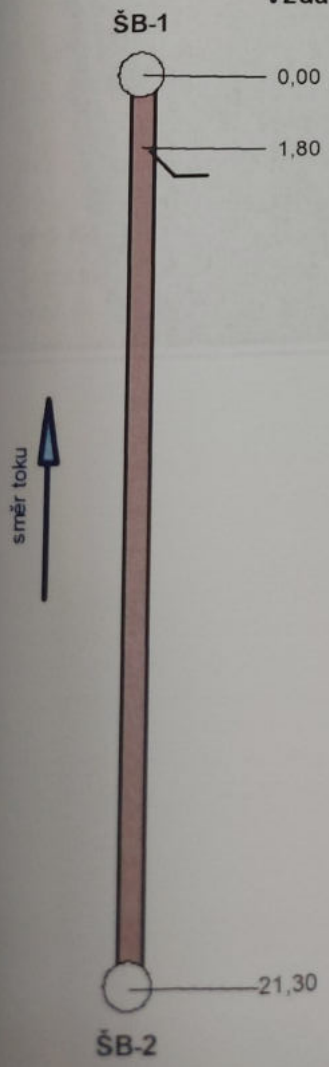

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠB-1
1,80	BCA.A.A	004	00:01:04	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
21,30	BCE.A		00:03:59	Koncový uzel, Šachta, ŠB-2

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA B, ŠB-2_ŠB-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠB-1	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**004**
Video	00:01:04
Vzdál. proti směru t	1,80 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	

Měření sklonu

Úsek	**STOKA B, ŠB-2_ŠB-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠB-1	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	21,30 m

Data sklonu

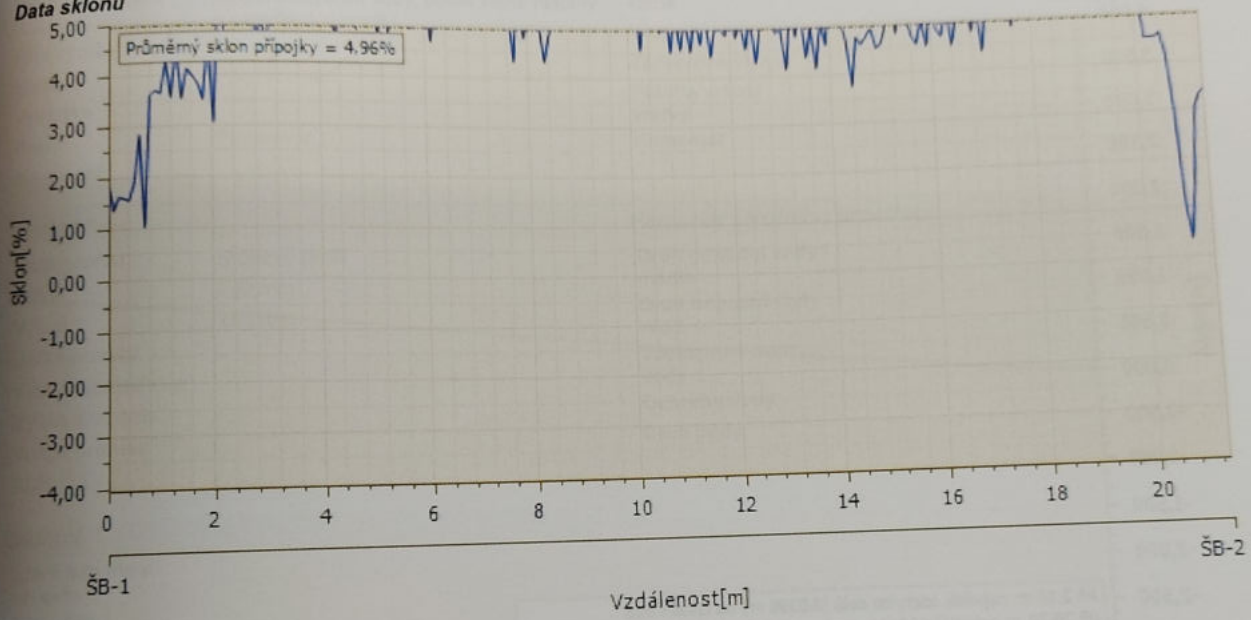

Měření sklonu

Úsek	**STOKA B, ŠB-2_ŠB-1**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠB-1	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	21,30 m

Výškový profil

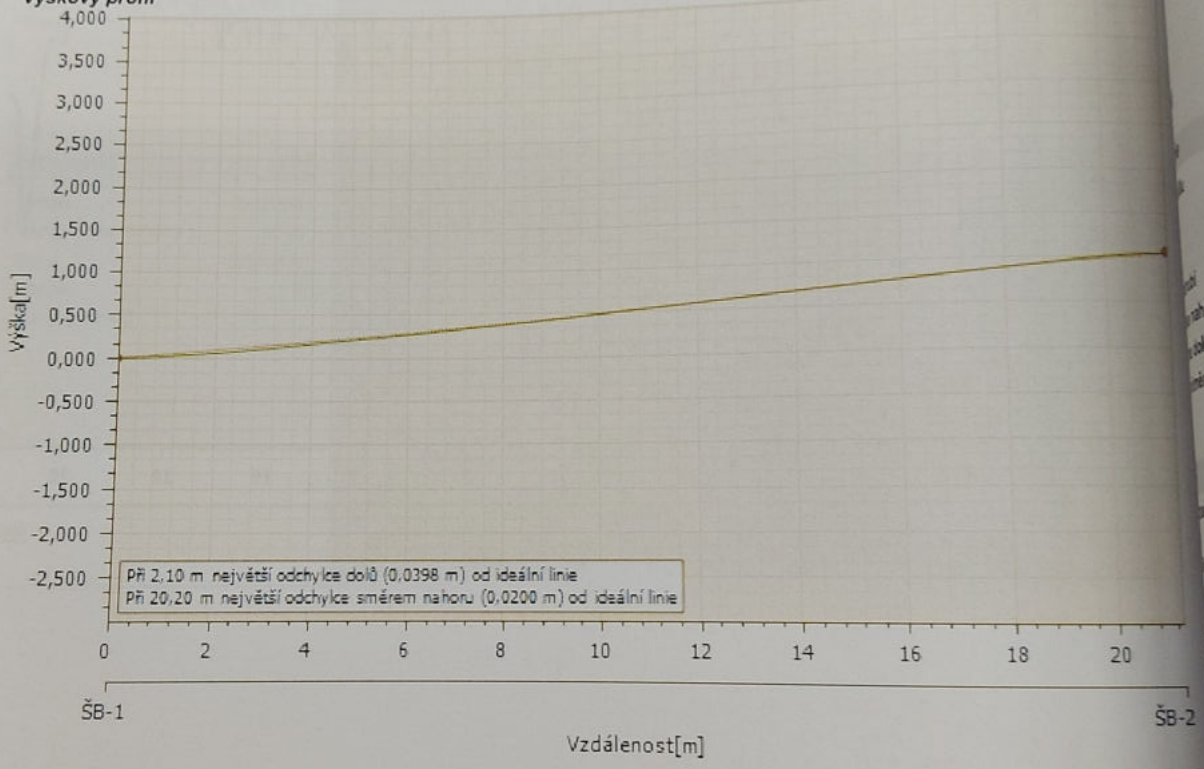

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**
horní šachta	ŠB2-4
dolní šachta	ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	27,60 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Proti směru proudění
Délka inspekce	27,60 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-3
031	00:00:23	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
032	00:01:14	3,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**
horní šachta	ŠB2-4
dolní šachta	ŠB2-3

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Proti směru proudění	**Inspektor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Délka inspekce	27,60 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
033	00:03:31	23,10	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:35	27,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-4

Grafika úseku

Úsek	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-4	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠB2-3		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	27,60 m	**Insp. délka**	27,60 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Proti směru proudění
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

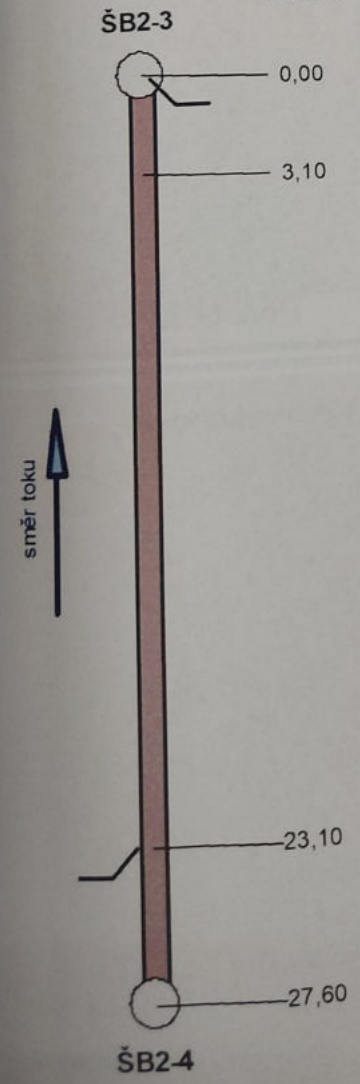

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-3
	BCA.A.A	031	00:00:23	Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
3,10	BCB.Z	032	00:01:14	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
23,10	BCA.A.A	033	00:03:31	Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
27,60	BCE.A		00:04:35	Koncový uzel, Šachta, ŠB2-4

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**	**Datum insp**	22.09.20
horní šachta	ŠB2-4	**Rozměr**	250 / 2
dolní šachta	ŠB2-3	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok vo hladiny v uzavřeném prot
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**031**
Video	00:00:23
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	

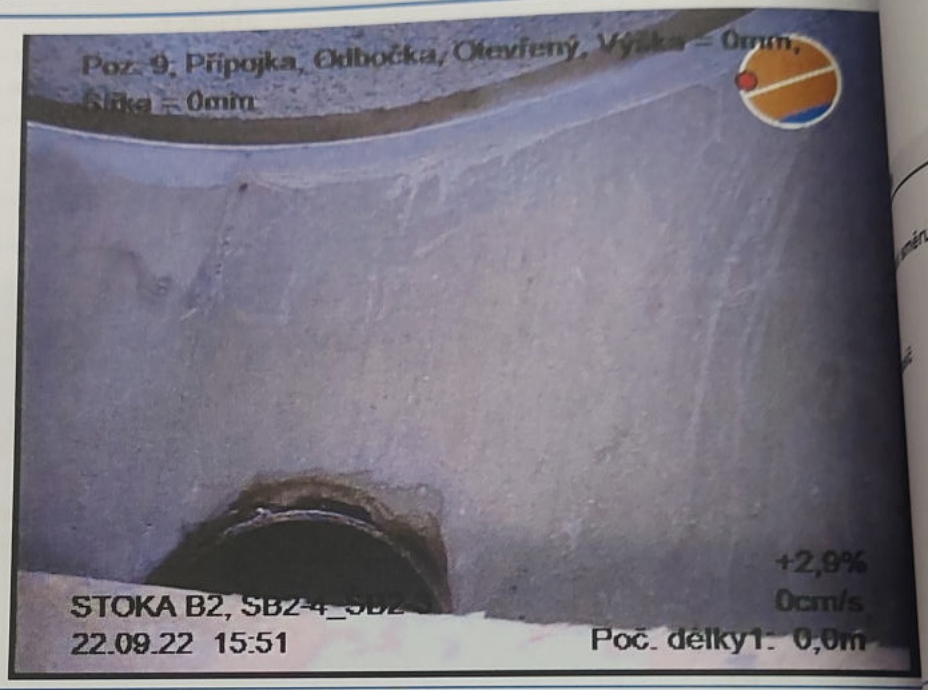

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	**032**
Video	00:01:14
Vzdál. proti směru t	3,10 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

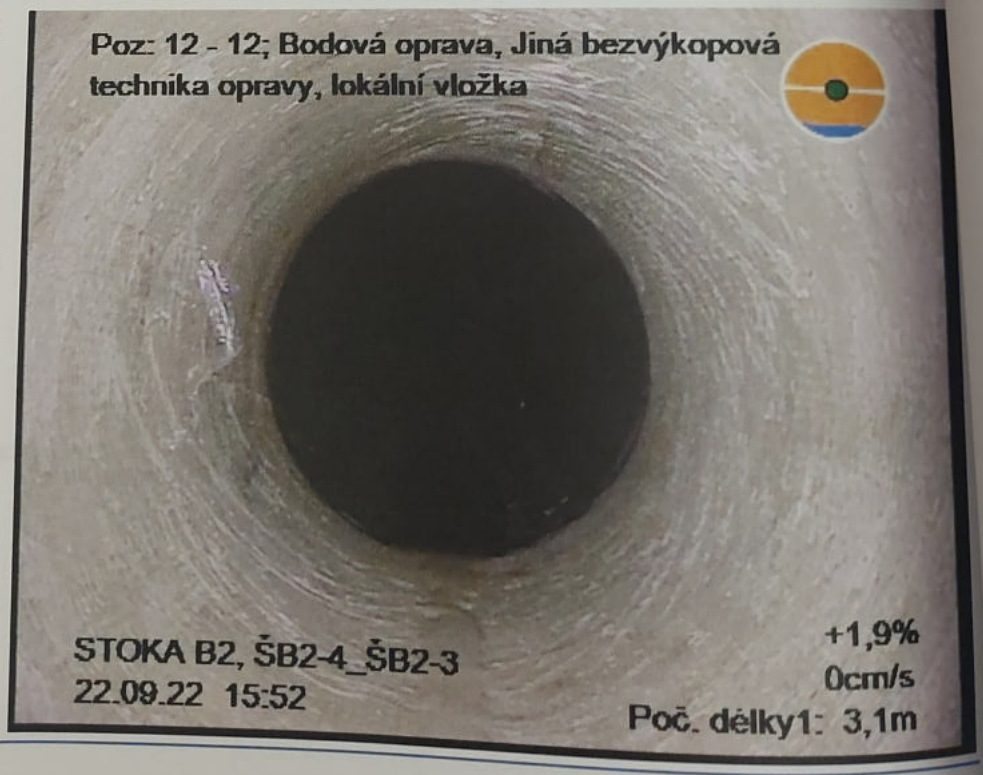

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**		
horní šachta	ŠB2-4	**Datum insp**	22.09.2022
dolní šachta	ŠB2-3	**Rozměr**	250 / 250
Místní část/ulice	Obec Předslav	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

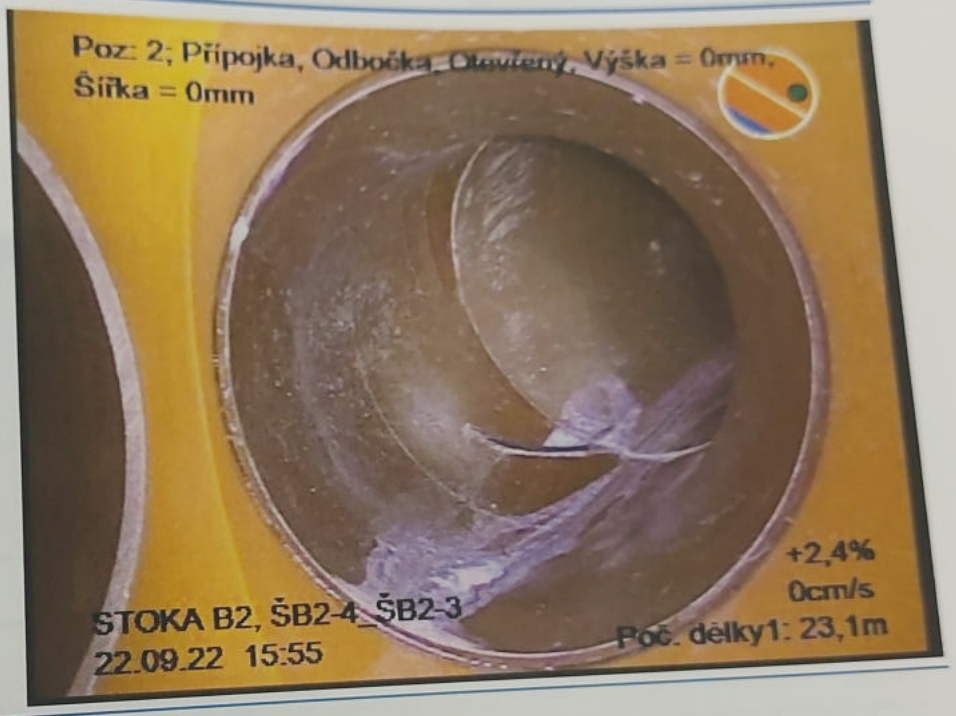

Fotografie	**033**
Video	00:03:31
Vzdál. proti směru t	23,10 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2
Datový nosič	

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.c

Měření sklonu

Úsek	**STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-4	**Výška dna nahoře**	
dolní šachta	ŠB2-3	**Výška dna dole**	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	**Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Délka úseku**	27,60 m

Data sklonu

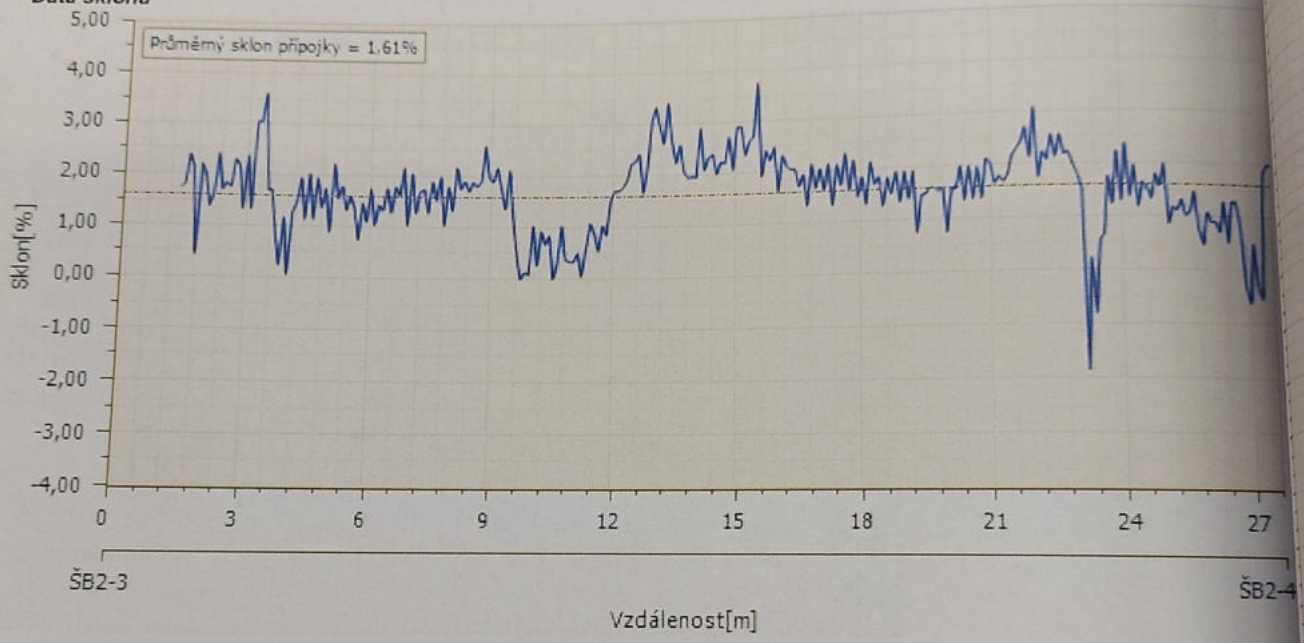

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	27,60 m

Výškový profil

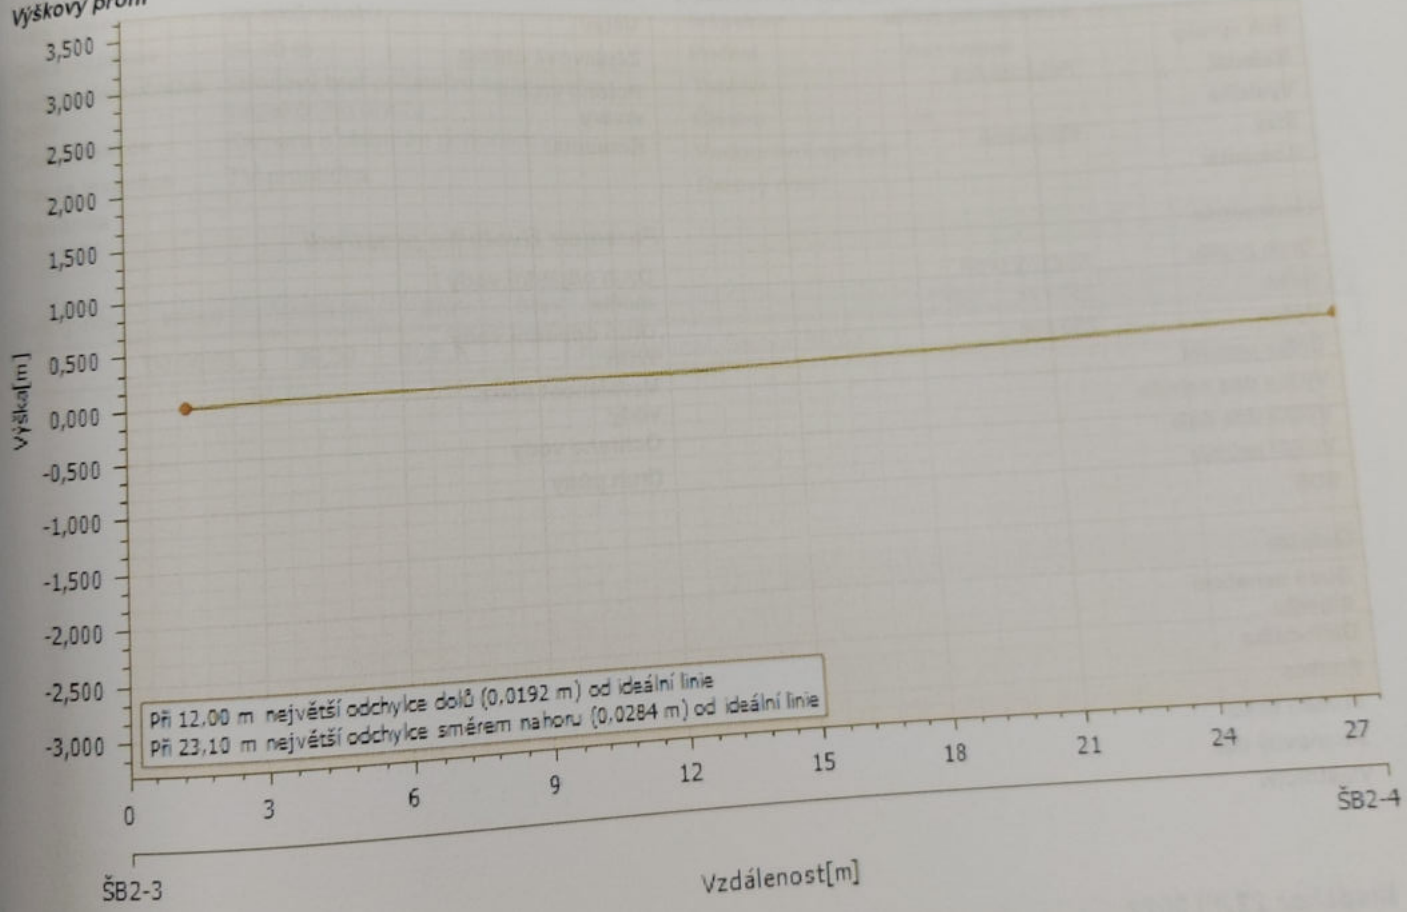

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3**
horní šachta	ŠB2-1-1
dolní šachta	ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	39,30 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	
Materiál	Polypropylen
Výstelka	
Stav	Plánované
Komentář	

Poloha

Město	Obec Předslav
Ulice	
Větev	
Záplavová oblast	
Poloha vrchní vrstvy	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	Kruhový profil
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	
Vnější průměr	
SDR	

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média	
Druh odpadní vody WGS	
Vzdálenost podz. vody	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku
Délka inspekce	39,30 m
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce	TV-prohlídka
Poznámka	

Inspektor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí	Bez srážek
Teplota	
Čištění	Ja
Vodoprávní správa	
Datový nosič	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-1-1
005	00:01:37	5,30	BCA.A.A		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
006	00:03:30	17,70	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
007	00:05:08	27,90	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Úsekový protokol

Úsek	**STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3**
horní šachta	ŠB2-1-1
dolní šachta	ŠB2-3

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr	Ve směru toku	**Inspektor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Délka inspekce	39,30 m	**Počasí**	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	**Teplota**	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	**Čištění**	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	**Vodoprávní správa**	
Poznámka		**Datový nosič**	

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:06:56	39,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-3

Grafika úseku

Úsek	**STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3**	**Datum insp**	22.09.2
horní šachta	ŠB2-1-1	**Druh kanalizace**	Systém odpadní vody, odtok ve hladiny v uzavřeném pr
dolní šachta	ŠB2-3		

Kmenová data		***Inspekce***	
Délka úseku	39,30 m	**Insp. délka**	39,30 m
Město	Obec Předslav	**Insp. směr**	Ve směru toku
Ulice		**Firma / Operátor**	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	**Datový nosič**	
Druh profilu	Kruhový profil	**Komentář**	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

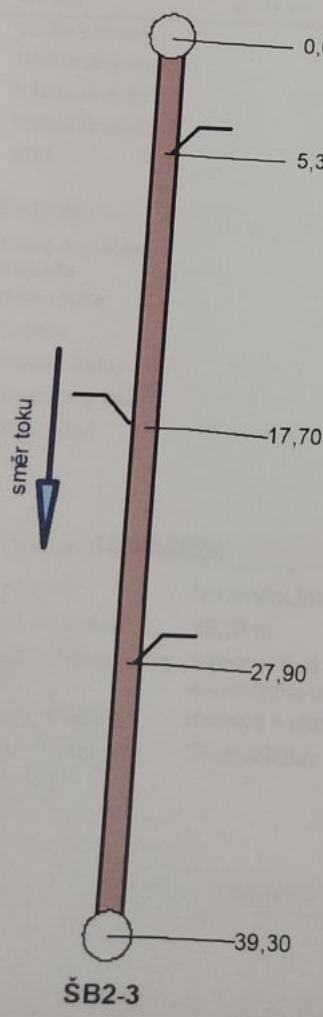

Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-1-1
5,30	BCA.A.A 005		00:01:37	Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
17,70	BCA.A.A 006		00:03:30	Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
27,90	BCA.A.A 007		00:05:08	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
39,30	BCE.A		00:06:56	Koncový uzel, Šachta, ŠB2-3

Monitoring kanalizace
tel. +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Obrazová zpráva úseku

Úsek	**STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3**	**Datum insp**	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-1-1	**Rozměr**	250 / 250
dolní šachta	ŠB2-3	**Druh kanaliz**	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**005**
Video	00:01:37
Vzdál. ve směru tok	5,30 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9 - 10
Datový nosič	

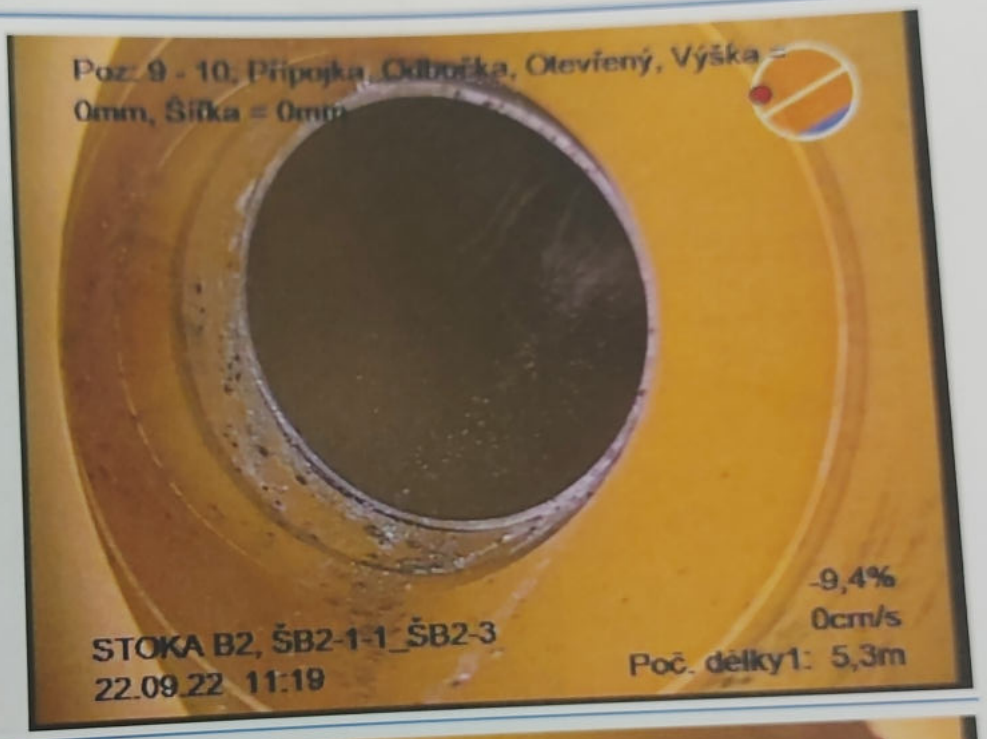

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	**006**
Video	00:03:30
Vzdál. ve směru tok	17,70 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2
Datový nosič	

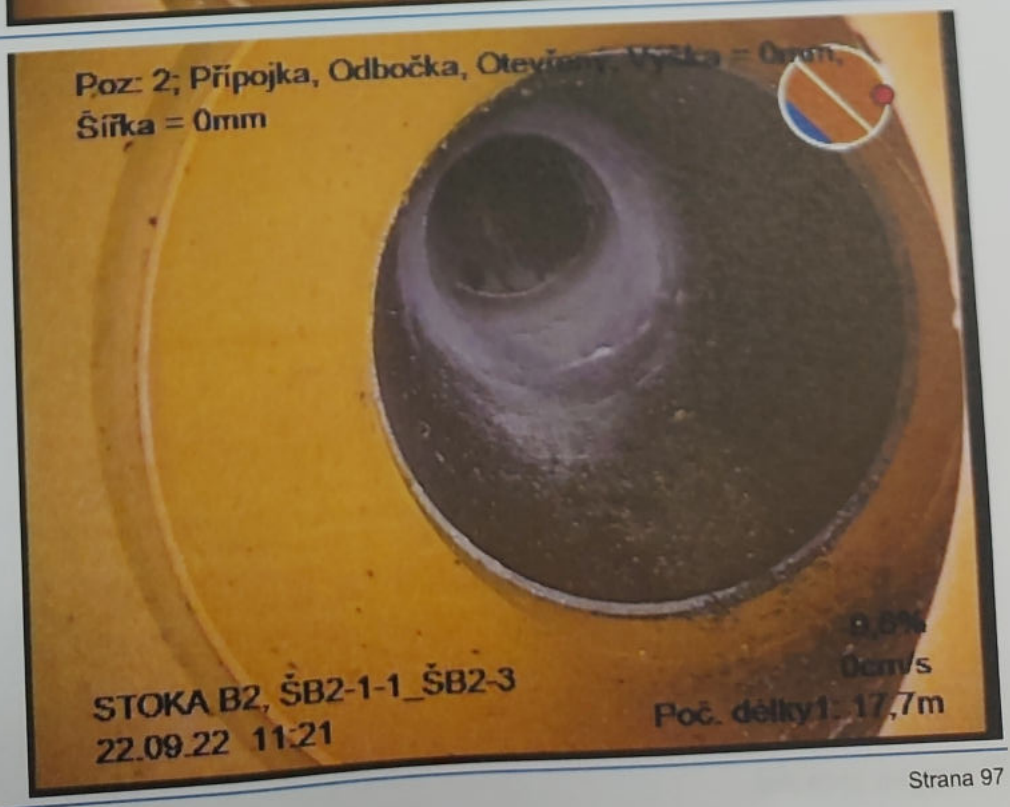

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2
horní šachta	ŠB2-1-1	Rozměr	250 /
dolní šachta	ŠB2-3	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok v hladiny v uzavřeném pr
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

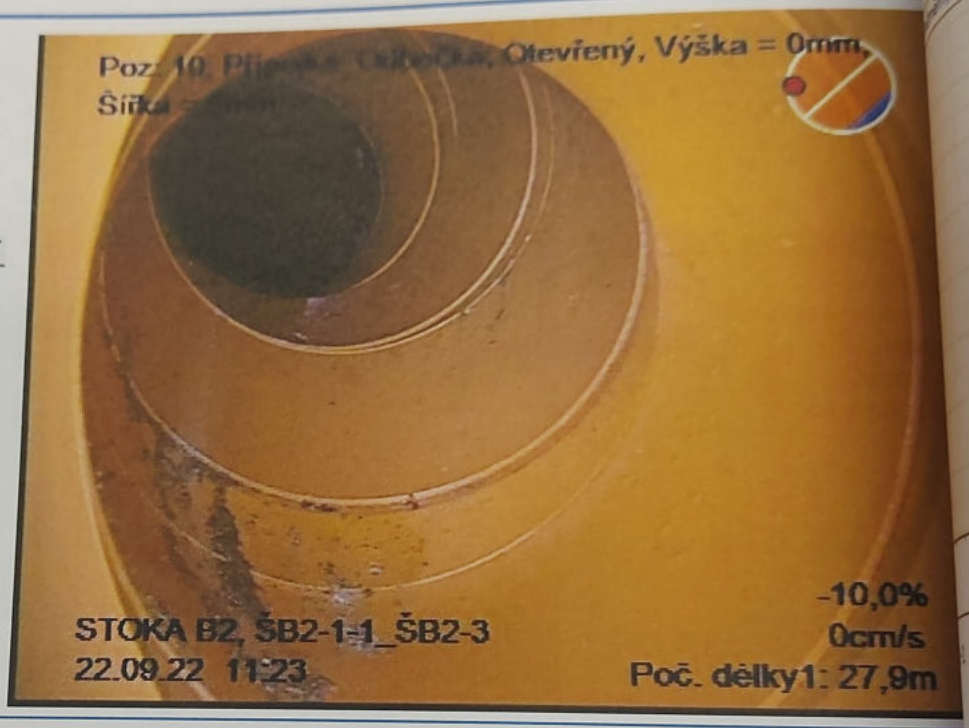

Fotografie	007
Video	00:05:08
Vzdál. ve směru tok	27,90 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	10
Datový nosič	

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace
tel.: +420 731 617 150
jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Měření sklonu

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-1-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	39,30 m

Data sklonu

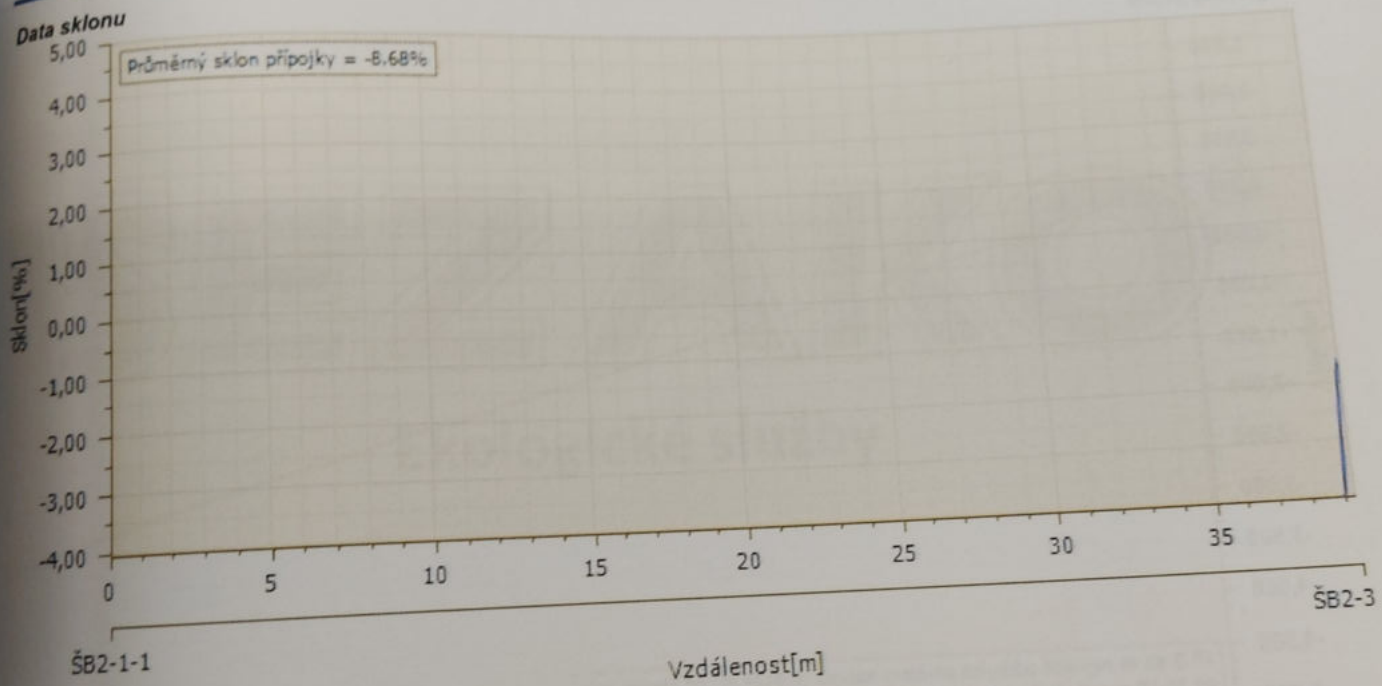

Měření sklonu

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-1-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	39,30 m

Výškový profil

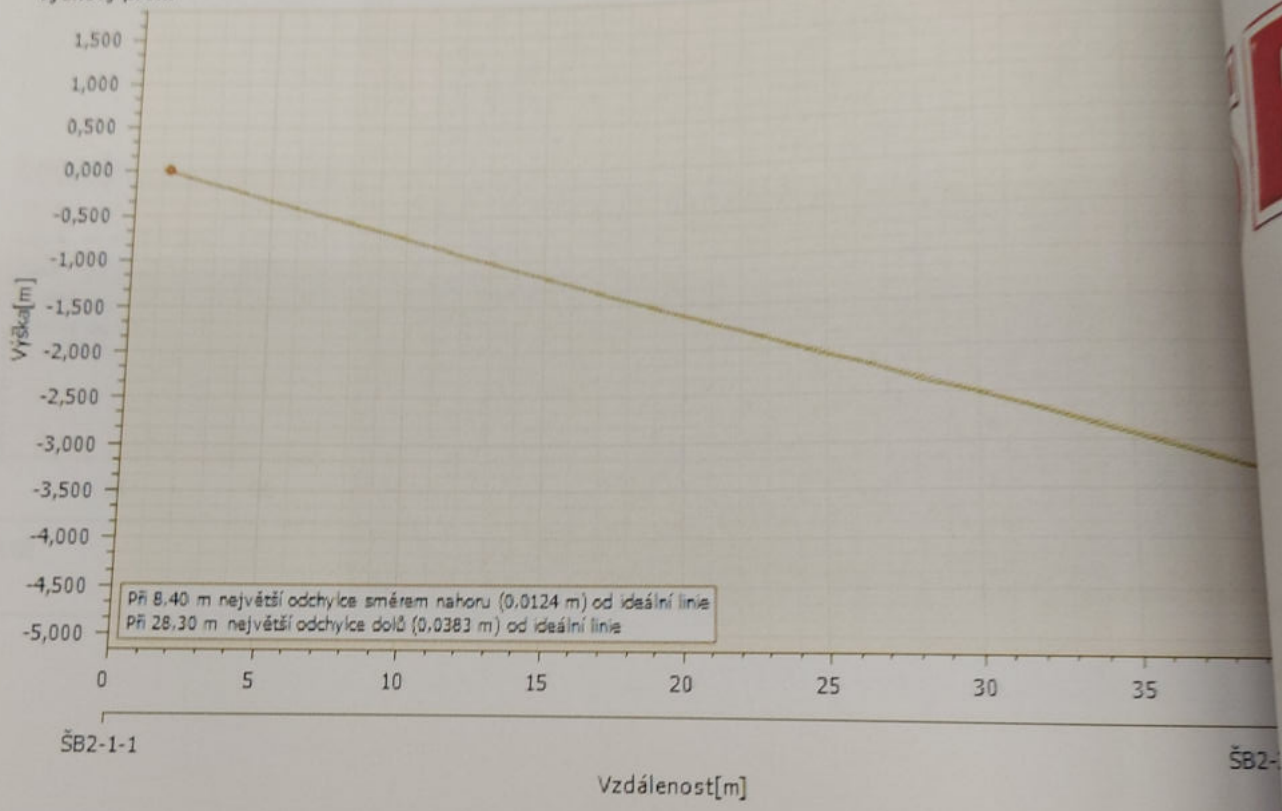

Protokol tlakové zkoušky

SEZAKO®

Ekologické služby

Obsah:

STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10
Test č. 1: 22.09.2022 - 10:30:19 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9
Test č. 2: 22.09.2022 - 10:54:14 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8
Test č. 3: 22.09.2022 - 11:16:18 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7
Test č. 4: 22.09.2022 - 11:56:35 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6
Test č. 5: 22.09.2022 - 12:27:07 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4
Test č. 6: 22.09.2022 - 12:33:23 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1
Test č. 7: 22.09.2022 - 12:52:15 - Obstál ve zkoušce
STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15
Test č. 8: 22.09.2022 - 13:21:52 - Obstál ve zkoušce

Projekt: IMOS Brno a.s. - kana

EZAKO

Název úseku:
Oblast:
Od šachty:
K šachtě:
Stanoviště:
Město:
Ulice:

Marek Matys
CSN EN1610
ZTLK0061

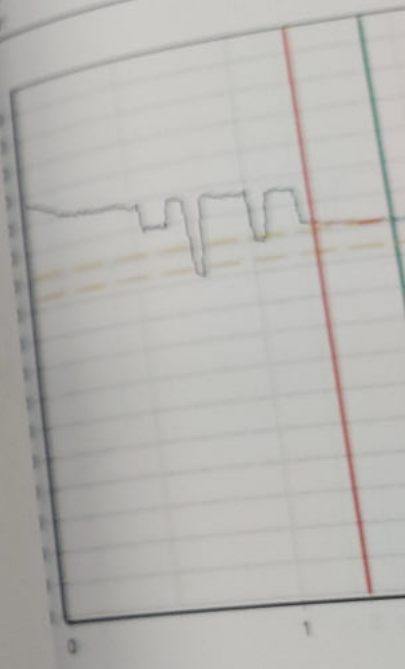

Ustalování taku 01:15 Data

Polypropylén
ochrana: Žádná

otrubí: Kruhový
r: 250 mm
zkušební trati: 34,4 m
a byla provedena 22.09.
mka:

edek: Obstál v
ník:
Imos Br

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

EZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-11**
K šachtě:	**ŠA3-10**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

ušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
šební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
zor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

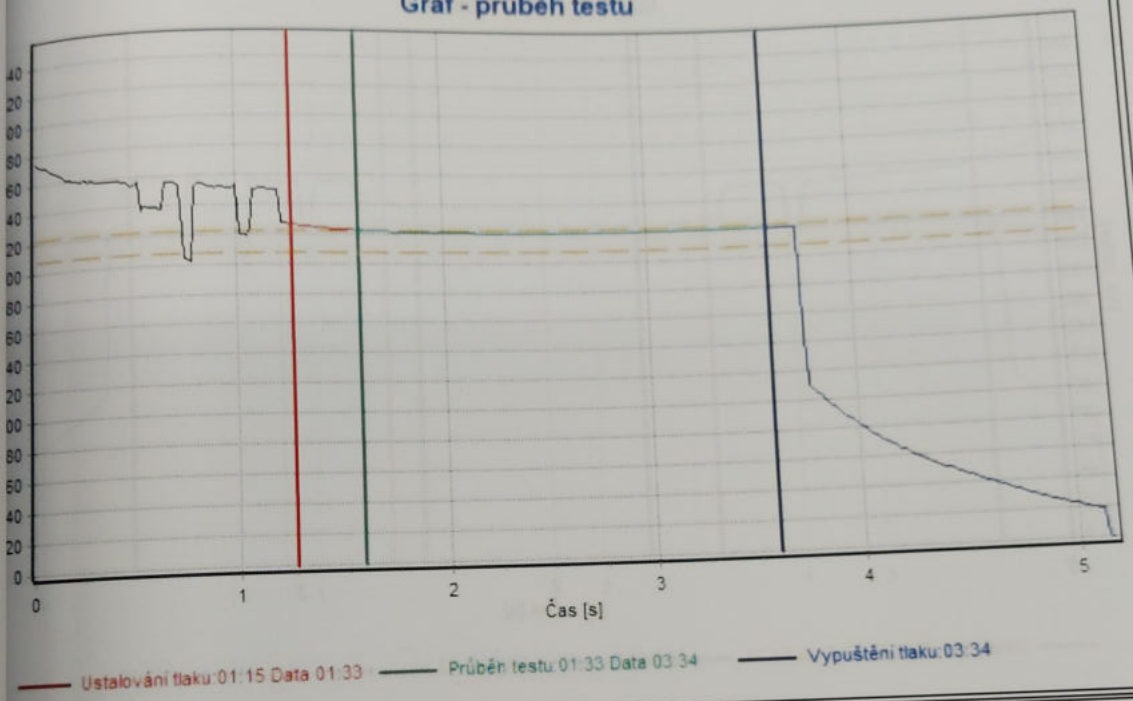

riál:	**Polypropylén**
ní ochrana:	**Žádná**
potrubí:	**Kruhový**
ěr:	**250 mm**
zkušební trati:	**34,4 m**

ška byla provedena **22.09.2022** ve **10:30:20** hodin.

ámka:

Test č.:	**1**
Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Počáteční přetlak:	**222,653 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**2,77 mBar**
Doba ustálení:	**0:20 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

ledek: **Obstál ve zkoušce**

zník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-10_ŠA3-9**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-10**
K šachtě:	**ŠA3-9**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

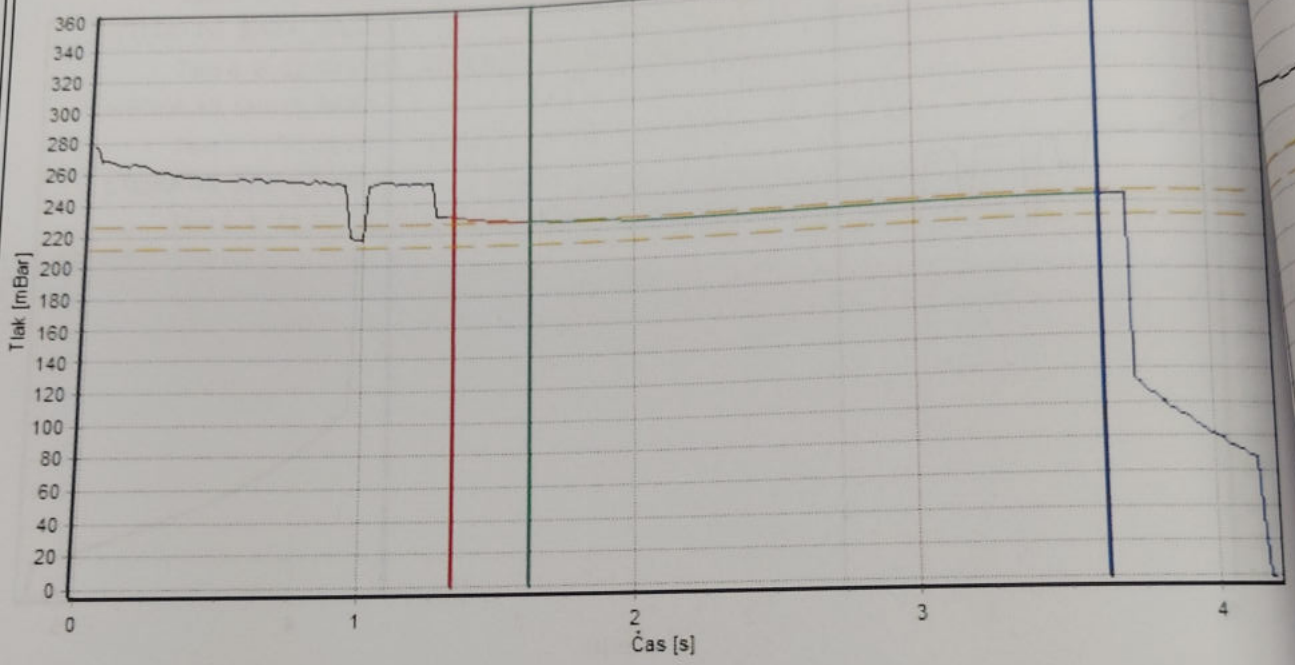

Plán:		Test č.:	**2**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**226,065 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**2,62 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:18 min**
Délka zkušební trati:	**41,7 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **10:54:15** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

SEZAKO ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-9**
K šachtě:	**ŠA3-8**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

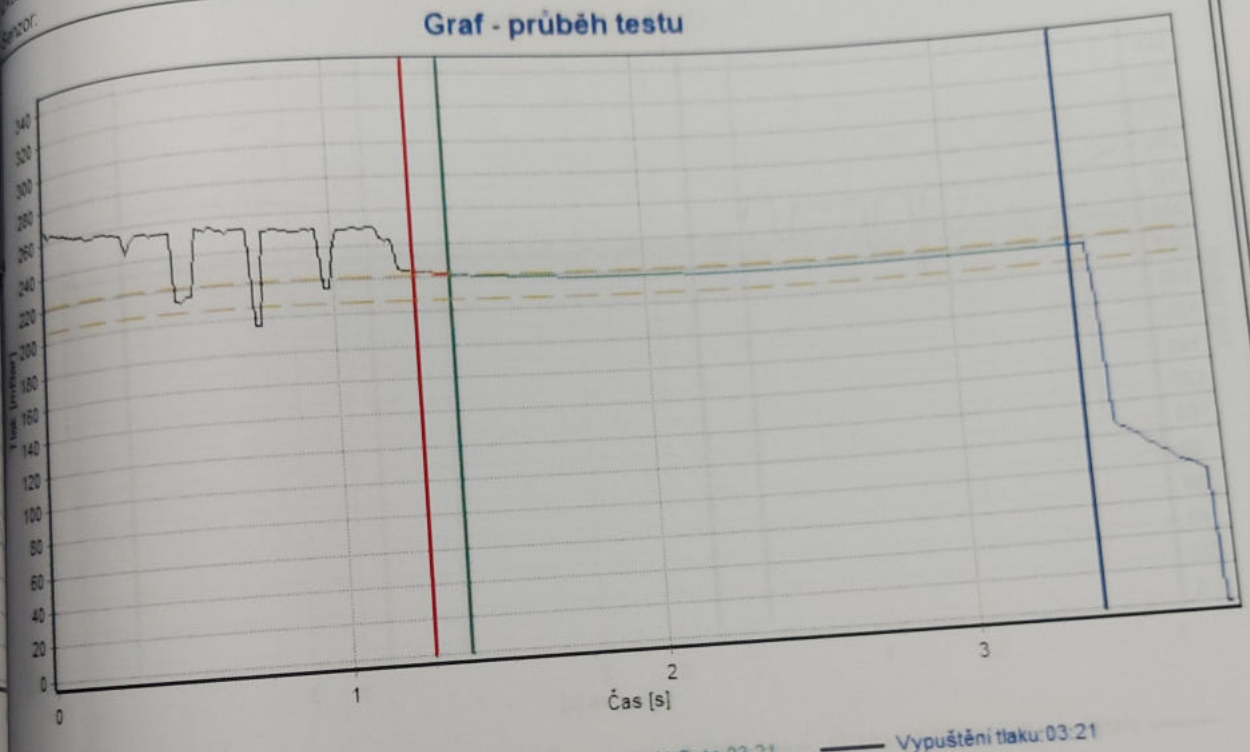

Plán:		Test č.:	**3**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**221,617 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**4,96 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:8 min**
Délka zkušební trati:	**28,3 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **11:16:19** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA3-8
K šachtě:	ŠA3-7
Stanoviště:	
Město:	Obec Předslav
Ulice:	STOKA A3

Zkoušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
Zkušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LD
Senzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

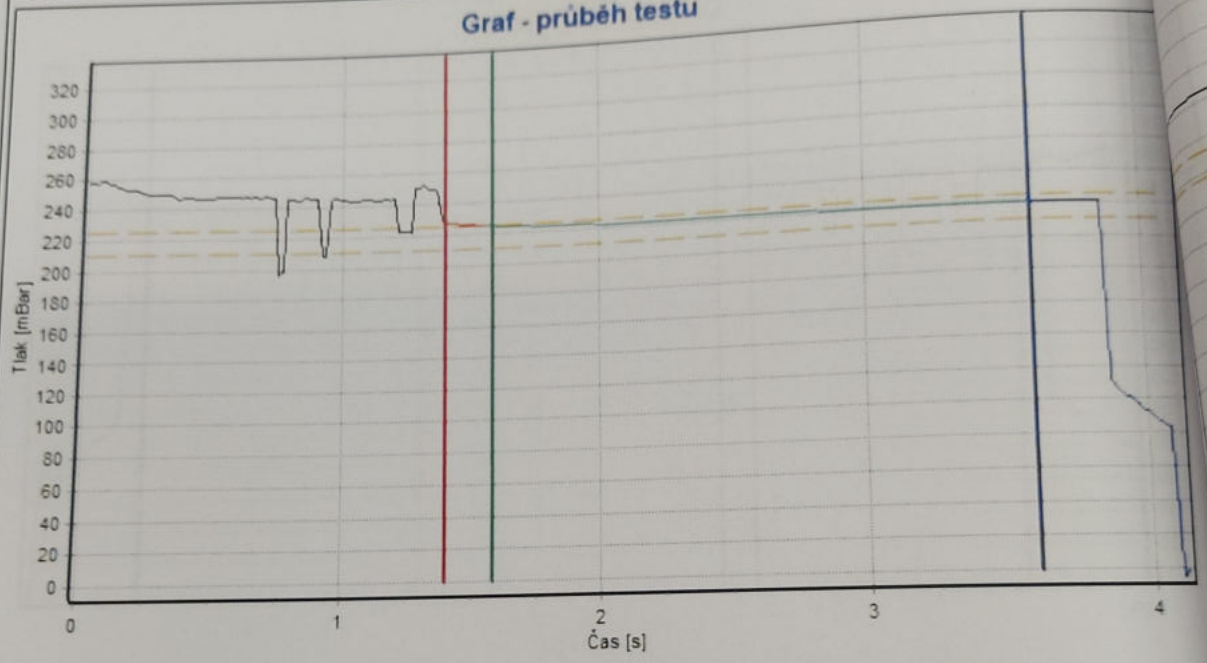

Plán:		Test č.:	4
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**224,871 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**3,53 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:12 min**
Délka zkušební trati:	**32,8 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **11:56:36** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	STOKA A3, ŠA3-7_ŠA3-6
Oblast:	Potrubí
Od šachty:	ŠA3-7
K šachtě:	ŠA3-6
Stanoviště:	
Město:	Obec Předslav
Ulice:	STOKA A3

oušející:	Marek Matys	Výstroj:	OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST
ušební metoda:	CSN EN1610	Třída zkoušky:	LD
nzor:	2TLK0061	Zkouška senzoru:	30.07.2020

Graf - průběh testu

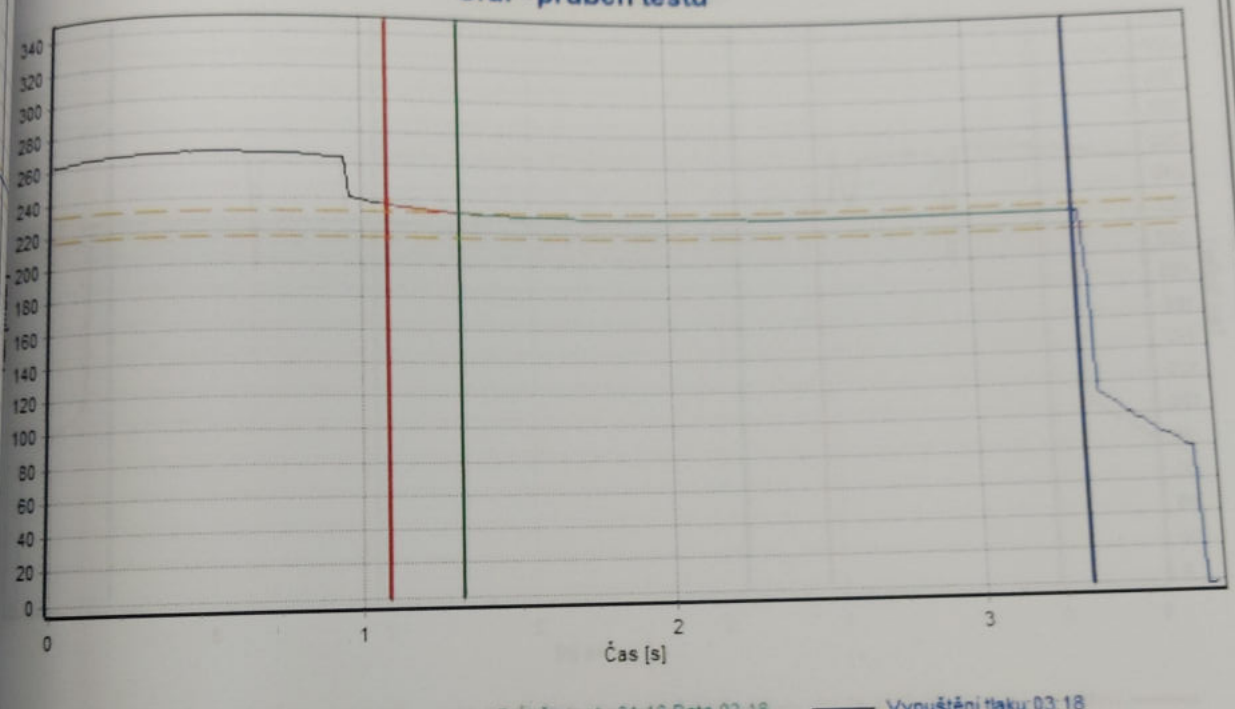

án:		Test č.:	5
ateriál:	Polypropylén	Požadovaný minimální přetlak:	200 mBar
itřní ochrana:	Žádná	Počáteční přetlak:	231,914 mBar
		Přípustná ztráta:	15 mBar
ofil potrubí:	Kruhový	Skutečná ztráta:	4,39 mBar
ůměr:	250 mm	Doba ustálení:	0:15 min
élka zkušební trati:	35,2 m	Požadovaná doba zkoušky:	2:1 min
ouška byla provedena **22.09.2022** ve **12:27:08** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	2:2 min

oznámka:

ýsledek: **Obstál ve zkoušce**

ákazník: Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-6**
K šachtě:	**ŠA3-4**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

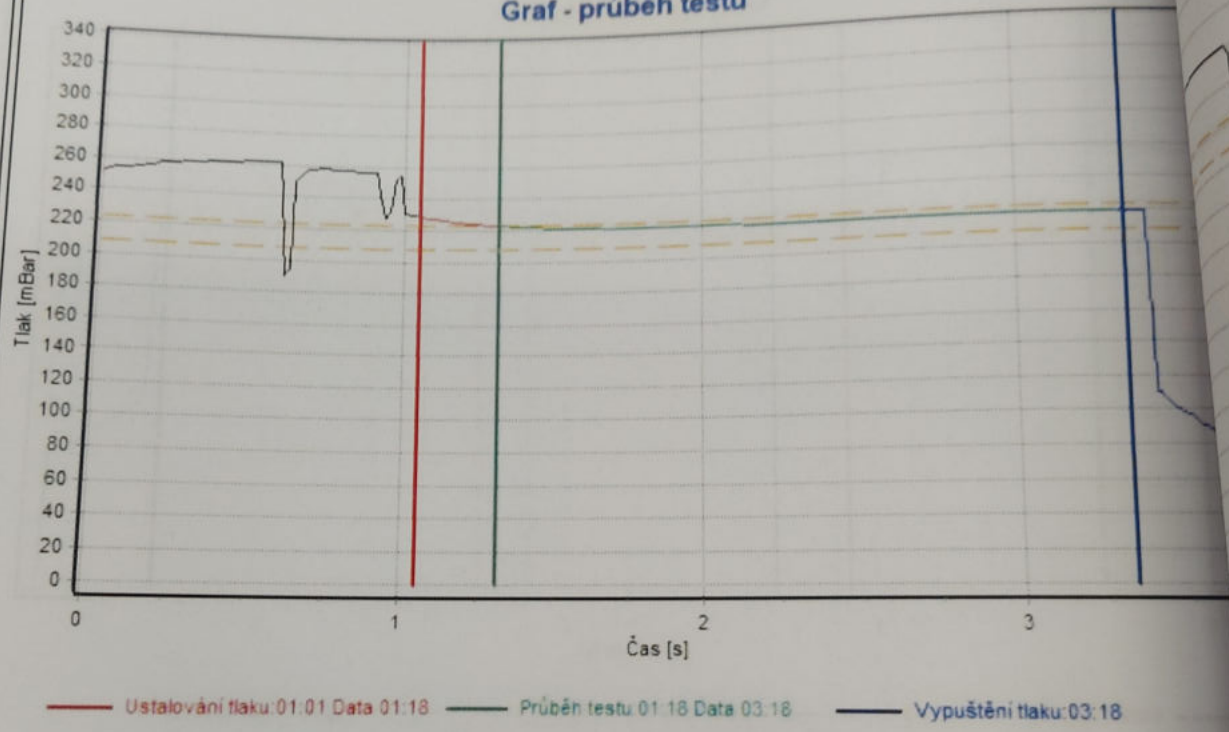

Plán:		Test č.:	**6**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**222,903 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**4,06 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:17 min**
Délka zkušební trati:	**57,6 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **12:33:24** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

SEZAKO Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-2**
K šachtě:	**ŠA3-1**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

šející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
ební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
zor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

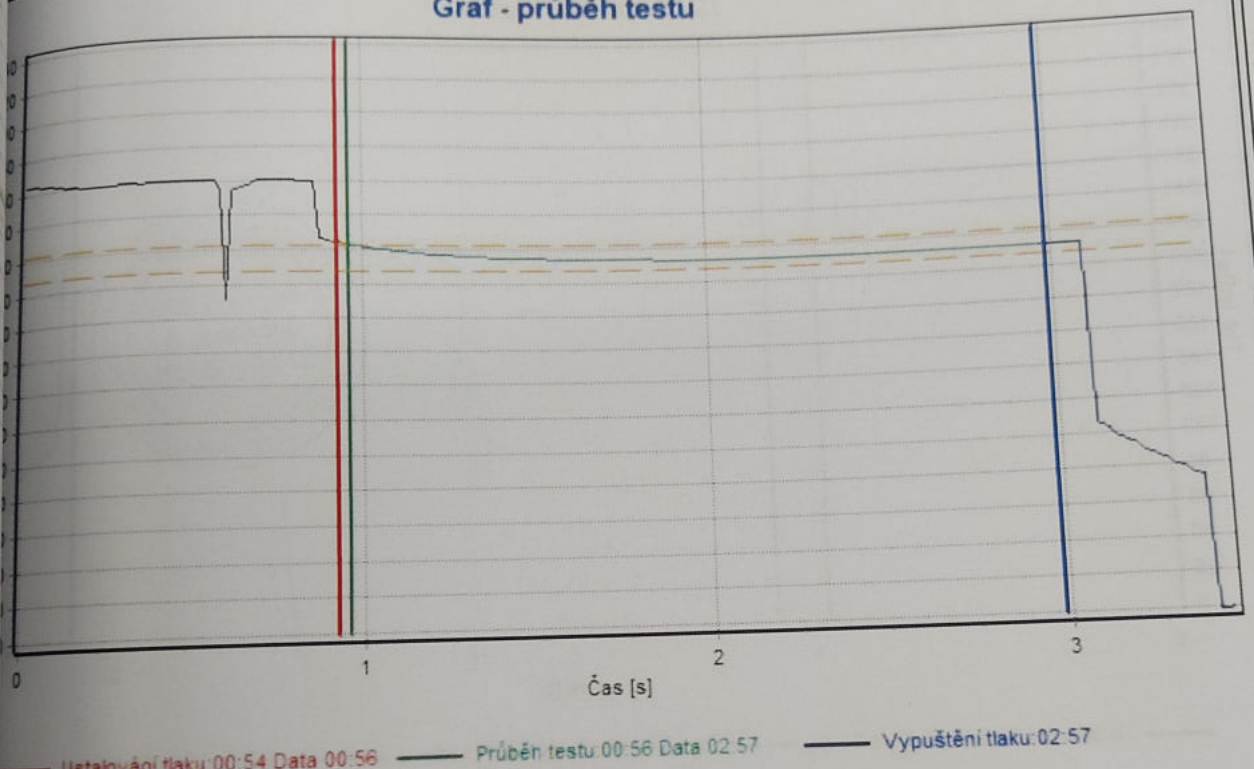

ál:	**Polypropylén**
ochrana:	**Žádná**
otrubí:	**Kruhový**
:	**250 mm**
kušební trati:	**25,8 m**

a byla provedena **22.09.2022** ve **12:52:16** hodin.

nka:

Test č.:	**7**
Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Počáteční přetlak:	**222,352 mBar**
Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Skutečná ztráta:	**10,28 mBar**
Doba ustálení:	**0:3 min**
Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

edek: **Obstál ve zkoušce**

ík:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Projekt: **IMOS Brno a.s. - kanalizace Obec Předslav** Zakázka: **STOKA A3**

SEZAKO
Ekologické služby

Název úseku:	**STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15**
Oblast:	**Potrubí**
Od šachty:	**ŠA3-1**
K šachtě:	**ŠA15**
Stanoviště:	
Město:	**Obec Předslav**
Ulice:	**STOKA A3**

Zkoušející:	**Marek Matys**	Výstroj:	**OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST**
Zkušební metoda:	**CSN EN1610**	Třída zkoušky:	**LD**
Senzor:	**2TLK0061**	Zkouška senzoru:	**30.07.2020**

Graf - průběh testu

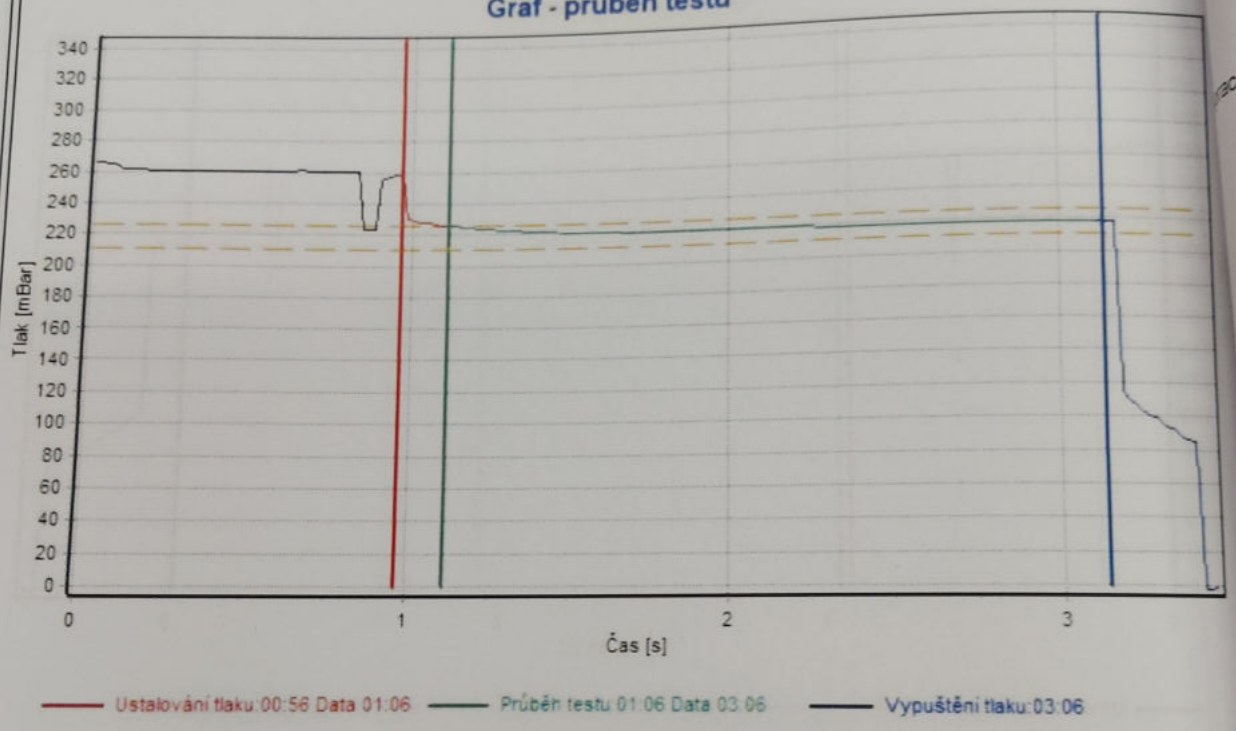

Plán:		Test č.:	**8**
Materiál:	**Polypropylén**	Požadovaný minimální přetlak:	**200 mBar**
Vnitřní ochrana:	**Žádná**	Počáteční přetlak:	**225,724 mBar**
		Přípustná ztráta:	**15 mBar**
Profil potrubí:	**Kruhový**	Skutečná ztráta:	**7,23 mBar**
Průměr:	**250 mm**	Doba ustálení:	**0:10 min**
Délka zkušební trati:	**22,3 m**	Požadovaná doba zkoušky:	**2:1 min**
Zkouška byla provedena **22.09.2022** ve **13:21:53** hodin.		Skutečná doba zkoušky:	**2:2 min**

Poznámka:

Výsledek: **Obstál ve zkoušce**

Zákazník:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Souhrn

Testované úseky celkem: **8** o celkové délce: **278,1 m.**

Otestováno **8** potrubí, z toho **0** nevyhovujících.

Délka testovaného potrubí celkem: **278,1 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Otestováno **0** šachet, z toho **0** nevyhovujících.

Hloubka testovaných šachet celkem: **0 m** z toho **0 m** nevyhovující.

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, p. Karel Crha

Vypracoval:

SAMOSTATNÝ DEFEKTOSKOPICKÝ PRACOVNÍK
LT/B 2. stupeň
č. certifikátu
0167/30/20/LTB
MAREK MATYS

Zákazník:

Dodavatel:

SEZAKO Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14 34
796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 336 366
IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

.....

.....
